

Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Malé Leváre

Sídlo: Malé Leváre 177

Štatutárny orgán: Pernecký Adrian

Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: Pernecký Adrian

DIČ: 2021049536

Banka: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: SK12 5600 0000 0032 8922 3021

Telefón: +421 918 784 812

e - mail: starosta@malelevare.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: m-plan s.r.o.

Sídlo: Dúhová 27, 900 29 Nová Dedinka

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Mazúr

IČO: 46807586

DIČ: 2023604935

IČ DPH: SK2023604935

Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: SK86 1100 0000 0029 4407 0400

Telefón: 0948 023 961

e - mail: mazur@mplan.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo — stavbu s názvom: VÝSTAVBA ALTÁNKU
- 2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej projektovej dokumentácie a položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
Pre odstránenie pochybností zhotoviteľ je povinný dielo vykonať technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a čo do rozsahu podľa rozpočtu — oceneného výkazu výmer.
- 2.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a

- nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. IV bod 4.1 tejto ZOD.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku II. bode 2.1. najneskôr do **31.8.2023** **odo dňa odovzdania staveniska.**
- 3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska, ak sa uplatňujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

IV. CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:
- cena bez DPH: 21 314,13 €
- cena s DPH: 25 576,96 €
- 4.2 Cena diela podľa bodu 4.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 4.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 4.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady na riadne zhotovenie predmetu zákazky.
- 4.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.
- 4.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii a zoznamu ekvivalentných položiek, ktoré zhotoviteľ predložil v ponuke a ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 4.8 Ak počas realizácie diela nastanú okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy, postupuje sa v zmysle § 18 ZVO.

- 4.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 4.9.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
 - 4.9.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
 - 4.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z Integrovaného regionálneho operačného programu.
- 5.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.
- 5.3 Objednávateľ poskytne najviac jedenkrát za mesiac zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce.
- 5.4 Zhotoviteľ môže zahrnúť do fakturovanej sumy len úplne dokončené ucelené položky rozpočtu — výkazu výmer podľa prílohy tejto zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu — oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov.
- 5.7 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotoviteľovi vypláti najneskôr do 90 (deväťdesiat) dní odo dňa odovzdania diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 90 (deväťdesiat) dní od odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykoná dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto ZOD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských a európskych technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vykonávania diela a riadne dokončené dielo je spôsobilé užívať objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 513 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má vykonané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZOD.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na vykonané dielo po dobu 24 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.

a dielo —
rílohu tejto
gicky podľa
c a výkonov,
o zmluve na
dpovednosť a

- 6.4 U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na svoje náklady odstrániť vady diela bezodkladne.
- 6.6 Objednávatel je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie vady diela, predložiť objednávatelovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že objednávatel s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávatelom. Ak objednávatel s návrhom nesúhlasí, predloží zhotoviteľovi svoj návrh, ktorý musí byť odsúhlasený zmluvnými stranami.
- 6.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej je potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávatelom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bod 7.3. tejto ZOD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady na vlastné náklady.
- 6.10 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávatel má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 6.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatela a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávatela upozornil a on na ich použitie trval.
- 6.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávatel uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávatela.
- 6.14 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.15 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 6.16 Havarijné stavy t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase vykonávania diela a podmienky tejto ZOD.
- 7.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 7.3. Objednávatel odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávatel zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 7.4. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávatel určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 7.6. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.7. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.

- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 7.9. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.11. Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 7.12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri (3) pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 7.14. Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 7.15. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.
- 7.16. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 7.17. Zhotoviteľ vykoná dielo bez využitia subdodávateľov. Ale nevylučuje to, že Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela subdodávateľovi. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 7.18. V prípade, že sa obe zmluvné strany dohodnú na subdodávateľovi alebo zmene subdodávateľov, každý subdodávateľ, ktorého Zhotoviteľ uvedie v zozname alebo ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienku oprávnenosti vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ musí oznámiť objednávateľovi aj akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľa.
- 7.19. Počas vykonávania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody objednávateľ vychádza z ceny majetku v čase poškodenia.
- 7.20. V prípade preukázateľného nedodržavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 7.21. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam v stavebnom denníku.
- 7.22. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na vykonanie diela, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 8.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 8.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať a objednávateľ je povinný prevziať riadne dokončené dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať ako celok.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 8.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto skúšky opakovať v plnom rozsahu do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 8.7. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi, ak sa uplatňuje: správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 8.8. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 8.9. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.10. Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 8.11. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré bránia jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 8.12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v termíne podľa bodu 9.7 tohto článku.
- 8.13. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne podľa bod 9.7 tohto článku. V zápise o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 8.14. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZOD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bod 9.15 tejto ZOD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZOD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po opakovanej výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na

odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených technickým dozom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZOD.

8.15 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatíu diela podľa bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:

- 8.15.1 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozom objednávateľa v stavebnom denníku.
- 8.15.2 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
- 8.15.3 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií.
- 8.15.4 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).
- 8.15.5 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 9.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II bod 2.1 po lehote uvedenej v čl. III bod 3.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. IV bod 4.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 9.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v Čase podľa čl. VI bod 6.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VI bod 6.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 9.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 10.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 10.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 10.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 10.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 10.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

dielo —

ihu tejto

cky podľa

a výkonov,

zmluve na
zodpovednosť a

- 10.7 Zhotoviteľ je povinný že počas celej doby realizácie stavebného diela mať uzavretú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby a živelným pohromám. Náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene.

XI. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

- 11.1. Táto ZOD sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia jej účinnosti do riadneho odovzdania diela bez vád objednávateľovi v súlade s článkom X. tejto zmluvy.
- 11.2. ZOD je možné predčasne ukončiť na základe:
- 11.2.1 Vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán
 - 11.2.2 Výpoveďou zo strany objednávateľa
 - 11.2.3 Odstúpením.
- 11.3. Objednávateľ môže vypovedať túto ZOD v prípade, ak nedošlo k začatiu plnenia predmetu zmluvy Zhotoviteľom. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 11.4. Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto ZOD ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 11.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 11.6. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZOD spolu s riadnym odôvodnením a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 11.7. Objednávateľ môže od tejto ZOD odstúpiť v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje:
- 11.7.1. neodovzdanie zhotoveného diela v požadovanej kvalite a rozsahu v zmysle čl. III. bod 3.1.;
 - 11.7.2. omeškanie s dokončením a odovzdaním diela viac ako 30 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;
 - 11.7.3. opakované porušenie zmluvných podmienok v zmysle čl. VIII. bod 7.24 a bod 7.25, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - 11.7.4. začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi,
 - 11.7.5. vstup zhotoviteľa do likvidácie.

XII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.


XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 ZVO len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.3 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými i právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZOD.
- 13.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 13.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

- 13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 13.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov EÚ, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v zmysle tohto bodu zmluvy sú najmä:
- a) Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.8 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
- a) zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv a
 - b) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
- O splnení podmienok podľa písm. a) a b) sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informovať.
- 13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela, vrátane zoznamu ekvivalentných položiek (ak sa uplatnilo) a projektová dokumentácia v elektronickej podobe
 - Príloha č. 2- Subdodávateľia
 - Príloha č. 3- Harmonogram prác
- 13.10. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.


Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 28 APR. 2023



Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 17.04.2023



ACIA STAVBY

Jakab

MATERSKÁ ŠKOLA PRÍSTAVBA A NADSTAVBA - 2. ETAPA

Malé Leváre

KS:

Dátum: 17.4.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: m-plan s.r.o.

IČO: 4680751

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	21 314,13
---------------------	------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
	20,00%	21 314,13	4 262,83

Cena s DPH	v	EUR	25 576,96
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



vzduch

m-plan s.r.o.
27
Nová Dedinka
807 586
23604935
SK2023604935
m-plan.sk

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Jakab

Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA PRÍSTAVBA A NADSTAVBA - 2. ETAPA

Miesto: Malé Leváre

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		21 314,13	25 576,96
cast2	Časť 2 - altánok	21 314,13	25 576,96

MATERSKÁ ŠKOLA PRÍSTAVBA A NADSTAVBA - 2. ETAPA

cast2 - Časť 2 - altánok

Objednávateľ: Obec Malé Leváre
Zhotoviteľ: m-plan s.r.o.



s.r.o.
27
lová Dedinka
807 586
3604935
SK2023604935
plan.sk

Dátum: 17.04.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 314,13

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 5 847,42

D 1 ZEMNE PRÁCE 1 511,69

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	8,560	78,60	672,82
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	8,560	4,60	39,38
3	K	167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m3	8,560	10,07	86,20
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	8,560	0,80	6,85
5	K	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	19,176	14,55	279,01
6	M	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	19,176	22,29	427,43

D 2 ZÁKLADY 1 096,34

7	K	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	7,216	96,47	696,13
8	K	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,211	1 896,71	400,21

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1 000,56

9	K	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic napríklad PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	5,265	190,04	1 000,56
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 568,37

10	K	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	m3	0,330	132,53	43,73
11	K	430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	t	0,050	1 904,90	95,25
12	K	431351121	Debnenie podest priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	7,200	30,94	222,77
13	K	431351122	Debnenie podest priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	7,200	5,68	40,90
14	K	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	8,000	10,36	82,88
15	K	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	3,600	18,75	67,50
16	K	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	3,600	4,26	15,34

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 1 499,00

17	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	8,080	122,10	986,57
18	K	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	8,080	13,55	109,48
19	K	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	8,080	3,75	30,30
20	K	631351101	Debnenie mazanín, zriadenie	m2	8,400	14,02	117,77
21	K	631351102	Debnenie mazanín, odstránenie	m2	8,400	4,39	36,88
22	K	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	40,000	5,45	218,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 171,46

23	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	8,560	20,03	171,46
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 15 466,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena
D 762			Konštrukcie tesárske				
24	K	762081060	Hobľovanie reziva na stavbe	m2	81,833	6,68	
25	K	762311104	Montáž kotevných želez zložitých	kus	7,000	2,48	
26	M	553000001	Kotevná papuča	kus	7,000	9,35	
27	K	762313112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	kus	27,000	1,68	45,24
28	K	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	50,760	6,33	321,31
29	K	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	73,960	8,44	624,22
30	K	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	45,100	11,50	518,65
31	K	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	14,320	12,46	178,43
32	M	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	3,795	356,00	1 351,02
33	K	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	58,276	2,79	162,59
34	M	605171123	Strešná lať 3x5cm SM 1 400-600cm	m	185,003	0,53	98,05
35	K	762342204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	m2	58,276	1,65	96,16
36	M	605171125	Kontra lať 4x5cm SM 1 0-600cm	m	72,845	0,69	50,26
37	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,450	34,47	118,92
38	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	41,940	4,01	167,97

D 764			Konštrukcie klampiarske	1 762,97			
39	K	764324220	Klamp. PZ pl. odkvapov zo segment. do 500 tvr. kryt. rš 330	m	30,400	14,04	426,82
40	K	764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	31,600	31,61	998,88
41	K	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	kus	2,000	26,76	53,52
42	K	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	8,000	31,90	255,20
43	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	17,340	1,65	28,55

D 765			Krytiny tvrdé	4 280,62			
44	K	765011244	Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla drážková	m2	58,276	42,11	2 454,00
45	K	765011412	Krytina keramická hrebeň a nárožie z hrebenáčov drážk. na sucho vetrací pás so štetinami 60 mm	m	20,900	59,97	1 253,37
46	K	765901050	Pokrytie striech fóliou napríklad Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	m2	58,276	6,35	370,05
47	K	998765201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%	40,770	4,98	203,20

D 771			Podlahy z dlaždíc keramických	2 066,00			
48	K	771271109	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300	m2	3,600	24,86	89,50
49	M	597637252	Dlaždice schod. 300x300x9 I	m2	3,780	23,99	90,68
50	K	771272811	Montáž schodiskovej profilovej hrany	m	14,800	1,40	20,72
51	M	2831C5381	Profil ochranný rohový 8 mm	kus	6,000	3,44	20,64
52	K	771575202.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. mrazuvzdorných	m2	40,000	19,34	773,60
53	M	5976373402	Dlaž. mrazuvzdorná 300x300x9 I	m2	42,000	23,99	1 007,58
54	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	20,030	3,16	63,28

D 782			Obklady z kameňa	2 111,75			
55	K	782111140	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	22,400	56,85	1 273,44
56	M	583102208	Vonkajší obklad umelý kameň	m2	24,640	32,56	802,28
57	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	20,760	1,74	36,03

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Nátery					882,98
83726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	81,833	3,53	288,87
783782203	Nátery tesárskych konštr. napríklad Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	81,833	3,56	291,33
K 783784103	Nátery tesárskych konštr. napríklad Pyrotonom 50	m2	81,833	3,70	302,78

ÚDAJE O PODIELE ZÁKAZKY, KTORÝ MÁ UCHÁDZAČ V ÚMYSLE ZADAŤ SUBDODÁVATEĽOM

2 časť: Výstavba altánku

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- x sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

Por. č.	Subdodávateľ (Názov subdodávateľa, adresa sídla, IČO, DIČ)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	% podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi	Predmet subdodávky - stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky
1	GENESIS Pozemné stavby, s.r.o., Pešia cesta 250/76 Šamorín-Mliečno 931 01, IČO: 46059105, DIČ: 2023215040	Robert Goncz	3,75	Dohľad a kontrola procesov a kvalita stavby.
2	MLOCK, s.r.o., Budovateľská 18 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36736171, DIČ: 2022319398	Ing. Štefan Jakab	2,81	stavbyvedúci
3				

V Bratislave, dňa 17.04.2023



...n, s.r.o.
...á 27
9 Nová Dedinka
6 807 586
023604935
t: SK2023604935
mplan.sk

Ing. Jozef Mazúr
konateľ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

ZEMNE PRÁCE

ZÁKLADY

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Konstrukcie tesárske


Konstrukcie klampiarske

Krytiny tvrdé

Podlahy z dlaždic keramických

Obklady z kameňa

Nátery

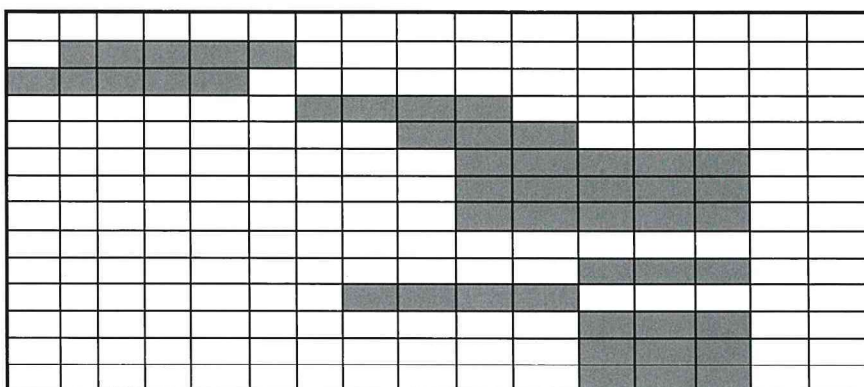

m-plan, s.r.o.
Dúhová 27



medinka

36

35

~~3604935~~

k

Ing. Jozef Mazúr, konateľ
