




ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

č. zhotoviteľa: OS23030419/SK




Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Mesto Čadca
Sídlo : Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
IČO : 00 313 971
DIČ : 2020552974
Zastúpený : JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor
Bankové spojenie : 
Číslo účtu IBAN : 
SWIFT : 
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor
- realizačných veciach :
Telefón : +421 414302201, 2,9
E-mail. adresa : sekretariat@mestocadca.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : Metrostav DS a.s.
Sídlo : Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO : 46 120 602
IČ DPH : SK2023231892
DIČ : 2023231892
Zastúpený : Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie : 
Číslo účtu IBAN : 
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Mário Mesiarik, vedúci strediska
č. oprávnenia : 13354
Telefonický kontakt : 
Email : mario.mesiarik@metrostavds.sk
Zapísaný v registri : SKSI

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Cyklotrasa Megoňky – Šance“

v rámci projektu: **„Megoňky – Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého pohraničia“**, ktorý mesto Čadca realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1935/2022, ktorá bola uzavretá dňa 05.09.2022 medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej aj len ako „MIRRI SR“) ako poskytovateľom a mestom Čadca ako hlavným prijímateľom v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13.
(ďalej aj len ako „**projekt**“)

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom, konkrétne podľa Projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom:
Názov: Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance
Projektant: Ing. E. Grambličková
Zodpovedný projektant: Ing. E. Grambličková
Vypracovaná: 09/2019

(ďalej len ako „**Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom**“)

- Stavebného povolenia na stavbu (Ohlásenia stavby) zo dňa 04.06.2019
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela
- podľa a v súlade s dokladmi, ktoré predložil v procese verejného obstarávania a/alebo pri podpise tejto zmluvy a v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami,
- ako aj podľa a v súlade s nasledujúcimi prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy:

Príloha č.1 Ponukový list (Cenová ponuka)

Príloha č.2 Vysvetlenie súťažných podkladov

Príloha č.3 Požiadavky k predmetu zákazky a náležitosti ponuky

Príloha č.4 Harmonogram služieb a prác

Príloha č.5 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom

Príloha č.6 Očenený výkazy výmer

Príloha č.7 Zoznam subdodávateľov

Príloha č.8 Zoznam kľúčových odborníkov

- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Zmluva a vyššie uvedené prílohy zmluvy musia byť chápané ako vzájomne sa dopĺňajúce a vysvetľujúce. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- 1 Zmluva o dielo
- 2 Príloha č.1 Ponukový list (Cenová ponuka)
- 3 Príloha č.2 Vysvetlenie súťažných podkladov
- 4 Príloha č.3 Požiadavky k predmetu zákazky a náležitosti ponuky
- 5 Príloha č. 4 Harmonogram služieb a prác
- 6 Príloha č.5 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
- 7 Príloha č.6 Očenený výkazy výmer
- 8 Príloha č.7 Zoznam subdodávateľov
- 9 Príloha č.8 Zoznam kľúčových odborníkov

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **Príloha č. 1.**

Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00 313 971, postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „Cyklotrasa Megoňky – Šance“.

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, k. ú. Čadca, v zmysle katastrálnej mapy v projektovej dokumentácii.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:
 - **prevzatie staveniska:** do 5 pracovných dní od písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
 - **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
 - **vykonanie Diela:** do 30 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, najneskôr do 30.08.2023
 - **odovzdanie Diela:** najneskôr do 5 dní pred uplynutím lehoty na vykonanie diela

3.3 Stavebný dozor: Objednávateľ vymenuje Stavebný dozor, ktorý bude vykonávať povinnosti a právomoci stanovené v zmluve medzi Objednávateľom a Stavebným dozorom a písomne listom alebo e-mailom oznámi jeho meno a priezvisko, ako aj jeho právomoci Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný komunikovať s Objednávateľom vždy prostredníctvom Stavebného dozoru, pokiaľ táto Zmluva alebo jej prílohy neustanovujú povinnosť Zhotoviteľa komunikovať alebo doložiť dokumenty aj Stavebnému dozoru aj Objednávateľovi.

Stavebný dozor môže (kedykoľvek) vydať Zhotoviteľovi pokyny, ktoré môžu byť potrebné k vykonaniu Diela a odstránenie akýchkoľvek väd a nedorobkov v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny bude Stavebný dozor vydávať v písomnej forme, a po začatí stavebných prác na Diele sa považujú za vydané okrem písomnej alebo e-mailovej formy korešpondencie aj vykonaním ich zápisu do stavebného denníka vedeného Zhotoviteľom.

3.4 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Harmonogram prác tvoria tieto časti:

- Vecný harmonogram s časovými míľnikmi
- Fakturačný harmonogram
- Harmonogram prípravy projektovej dokumentácie a inžinieringu (schvaľovacích procesov)

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

Ak je to potrebné na dodržanie termínov zhotovenia Diela podľa Prílohy č. 4 - Harmonogramu služieb a prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť výkon prác na zhotovovaní Diela v trojzmennej prevádzke (24 hodín denne) a 7 kalendárnych dní v týždni vrátane práce počas dní pracovného pokoja.

Príloha č. 4 - Harmonogram služieb a prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.8 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.

3.9 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou

konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

- 3.10 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdaní a prevzatí. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia** stavby a toto odovzdá Objednávateľovi.
- 3.11 Zhotoviteľ najmenej **7 dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **3 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.12 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.13 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.14 Vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.15 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	170 013,94 EUR
DPH 20 %	34 002,79 EUR
spolu s DPH	204 016,73 EUR
slovom:	dvestoštyritisíc šesťnásť eur, sedemdesiattri centov.

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodov 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.
- 4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe **čiastkových faktúr** vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe **konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude: **mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.**
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť **prvú čiastkovú faktúru** a každú ďalšiu čiastkovú faktúru, ktorú odovzdá Stavebnému dozoru po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca realizácie prác. Faktúra bude doručená spolu so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok v štyroch rovnopisoch v zmysle oceneného výkazu výmer, tvoriaceho **Prílohu č. 6** tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác bude odsúhlasený stavebným dozorom a následne osobou Objednávateľa oprávnenou jednať vo veciach realizačných. **Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z ceny Diela s DPH.**

Zhotoviteľ je povinný dodržať **Fakturačný harmonogram, ktorý je súčasťou Prílohy č. 4 – Harmonogram služieb a prác** tejto Zmluvy, pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti plánovanému kumulatívne fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme nesmie byť nižšie o viac ako 15%.

Ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa oproti plánovanému kumulatívne fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme klesne o viac ako 15%, Objednávateľ má právo uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 8.4.

Na účely tohto článku sa skutočným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu prevzatia staveniska do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka.

- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie

peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej jednať za Zhotoviteľa vo veciach realizačných a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa;
- b) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;
- c) položkový rozpočet Diela;
- d) krycí list rozpočtu;
- e) **doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.
- f) Porovnanie skutočného kumulatívneho fakturačného plnenia k poslednému dňa mesiaca, ktorého sa platba týka s Fakturačným harmonogramom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.

- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. **Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.**
- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.** Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 30-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k riadiacim, sprostredkovateľským a národným orgánom v rámci OP INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.

- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorcom a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia vád a nedorobkov.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietiť, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI. Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 7 - Zoznam subdodávateľov**.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo

vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 6.8 tohto článku Zmluvy.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.7 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 6.8 **Zoznam kľúčových odborníkov** tvorí **Prílohu č. 8** tejto Zmluvy. V prípade, ak ide o kľúčového odborníka alebo o inú osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zoznam Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby kľúčového odborníka alebo inej osoby, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť alebo menovania ich zástupcov, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že tento nový kľúčový odborník alebo iná osoba, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť alebo jeho zástupca spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu kľúčového odborníka.
- 6.9 Ustanoveniami bodov uvedených v tomto článku nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsimi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania Zmluvy dodržať Návrhy na plnenie kritérií, ktoré boli stanovené v jeho Ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti a ktorý sú uvedené prílohe č.8. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe len písomným dodatkom k Zmluve.
- 7.4 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.7 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.8 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.9 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.

7.10 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo podľa pokynov stavebného dozoru. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. **Zhotoviteľ je povinný** stavebný denník uschovávať vo svojej kancelárii na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od odsúhlaseného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. Všetky strany musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže stavebný dozor vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčasnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

Stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole stavebným dozorom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

7.11 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.

7.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.

7.13 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.

- 7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.15 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.16 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe: -
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.17 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 7.22 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.23 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.24 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.25 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.26 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.27 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétne stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 7.30 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri prácach nad vodným tokom. Zhotoviteľ je povinný v zmysle

vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania **na vlastné náklady spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a zabezpečiť jeho prerokovanie a schválenie pred začatím stavebných prác.**

7.31 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Hlavného kontrolóra obce, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným, národným a iným orgánom v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-202, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.

- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.

- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. X. Zmena zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
 - 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
 - 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
 - 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 **Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku** musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh **vo dvoch originálnych vyhotoveniach**:

-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,

-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),

-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,

- fotodokumentácia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi **najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť**, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,

- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.
- Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenie aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.
- Elektronická zásielka sa považuje za doručenie v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.
- Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.
- 13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná **v štyroch vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží po dve vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy.

- 13.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda po splnení odkladacej podmienky, a to keď nastane právna skutočnosť uvedená v Čl. XIII. bod 13.8 tejto zmluvy. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 13.8 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. V prípade, ak predmetný NFP Objednávateľovi nebude pridelený aj z akýchkoľvek iných dôvodov, táto zmluva stráca platnosť a nenadobúda účinnosť a zmluvné strany nie sú jej obsahom viazané a nemajú právo voči sebe uplatňovať žiadne majetkové ani iné sankcie.

Zoznam príloh:

- Príloha č.1 Ponukový list (Cenová ponuka)
- Príloha č.2 Vysvetlenie súťažných podkladov
- Príloha č.3 Požiadavky k predmetu zákazky a náležitosti ponuky
- Príloha č.4 Harmonogram služieb a prác
- Príloha č.5 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
- Príloha č.6 Ocenený výkazy výmer
- Príloha č.7 Zoznam subdodávateľov
- Príloha č.8 Zoznam kľúčových odborníkov

V Čadci dňa 10.7. 2023

Za Objednávateľa:

Mesto Čadca
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
primátor

29-06-2023

V Bratislave dňa 2023

Za Zhotoviteľa:

Metrostav DS a.s.
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky: „Cyklotrasa Megoňky – Šance“

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.
IČO: 46 120 602
Zastúpená: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Uchádzač: je/nie je platcom DPH*

Celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom):	204 016,73
Z toho cena bez DPH	170 013,94
Z toho DPH	34 002,79
Z toho sadzba DPH v %	20

V Bratislave, dňa 28.06.2023

Podpis :



Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva



Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva



* Nehodiace sa prečiarknite

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cyklotrasa Megoňky – Šance

Obstarávateľ: Mesto Čadca

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 09.06.2023 13:11:29

Zverejnené: 14.06.2023 07:28:47

Otázka č. 1

Výkaz výmer uvažuje s odkopom a premiestnením výkopku v množstve 589 m³, avšak neuvažuje s poplatkom za skládku pre uloženie zeminy. Doplní verejný obstarávateľ položku poplatok za skládku zeminy? Alebo vysvetlí verejný obstarávateľ kde a akým spôsobom bude výkopová zemina uložená (bez poplatku)?

Otázka č. 2

V trase cyklotrasy sa nachádzajú poklopy kanalizačných šácht a vodovodných uzáverov, ktoré bude potrebné výškovo upraviť do novej nivelety vozovky. Doplní verejný obstarávateľ do výkazu položku na výškovú úpravu poklopov?

Otázka č. 3

V mieste priekopy a krajnic sa nachádza trvalý trávnatý porast. Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer položku na odstránenie trvalého trávnatého porastu?

Odpoveď:

Obstarávateľ nedoplní dané položky do výkazu výmer – uvedené bude v prípade potreby riešené následne dodatkom k zmluve za podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uvedené položky neboli predmetom rozpočtu žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku preto v tomto štádiu nebudú doplnené.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 07.06.2023 10:36:54

Zverejnené: 12.06.2023 07:34:00

Nakoľko norma OHSAS 18001 je nahradená certifikátom ISO 45001, opraviť verejný obstarávateľ podmienku účasti vo výzve?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že v rámci predmetnej zákazky sa vyžaduje certifikát **ISO 45001** ako nástupca zrušeného certifikátu OHSAS 18001.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 08.06.2023 07:40:00

Zverejnené: 12.06.2023 07:25:36

Vážený verejný obstarávateľ,

v mene uchádzača o Vami vyhlásené verejné obstarávanie s predmetom stavebných prác: "Cyklotrasa Megoňky - Šance", Vám zasielame nasledovnú otázku na vysvetľovanie:

V Súťažných podkladoch bod 11. Podmienky účasti, časť Technická a odborná spôsobilosť - verejný obstarávateľ požaduje: 5. podľa § 35 v súbehu s § 34 ods. 1 písm c) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní platným certifikátom pre Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 180001.

Otázka:

V zmysle platnej legislatívy bol Cerifikát OHSAS 180001 nahradený certifikátom ISO 45001. Dobře chápeme, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu ISO 45001?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že v rámci predmetnej zákazky sa vyžaduje certifikát **ISO 45001** ako nástupca zrušeného certifikátu OHSAS 18001.



SÚŤAŽNÉ PODKLADY

NÁZOV ZÁKAZKY:

„Cyklotrasa Megoňky – Šance“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	Mesto Čadca
Sídlo:	Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Krajina:	Slovenská republika
Zastúpený:	JUDr. PhDr. Matej Šimásek, PhD., primátor
IČO:	00 313 971
DIČ:	2020552974
Zatriedenie podľa ZVO:	§ 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Telefón:	+421 414302201, 2,9
E-mail:	vo@mestocadca.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „Cyklotrasa Megoňky – Šance“

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): **stavebné práce**

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: k. ú. Čadca

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):

- **typ zmluvy:** zmluva o dielo
- **lehota na realizáciu zákazky:** do 30 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, najneskôr do 30.08.2023
- **platobné podmienky:** v lehotách podľa Zmluvy

7. Opis predmetu zákazky:

Predmetom projektu je revitalizácia, rekonštrukcia a dobudovanie časti úseku existujúcej Náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance dlhej 7 800 m, ktorá vznikla v rámci spoločného cezhraničného projektu GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE (INTERREG V-A SK-ČR, 2018) medzi mestom Čadca a obcou Mosty u Jablunkova (ČR).

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia (na vlastnú zodpovednosť, náklady a riziko) z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie

zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.

Uchádzač je povinný pri oceňovaní položiek Výkazu - výmer (Rozpočtu) zohľadniť podmienky tejto Výzvy, vrátane navrhovaných zmluvných a obchodných podmienok. Uchádzač je povinný si podrobne preštudovať projektovú dokumentáciu a Výkaz – výmer.

Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky stanovujeme na deň 08.06.2023 o 09.00 hod. so zrazom v kancelárii prednostu mesta. Iný termín obhliadky si môžu uchádzači dojednať na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou projektovej dokumentácie a Výkazu – výmer a ostatných príloh tejto výzvy.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite

8. Spoločný slovník obstarávania: 45000000-7 Stavebné práce

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 218 766,57 EUR bez DPH

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Dielo bude financované v zmysle programových dokumentov Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a toz predmetného operačného programu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Názov projektu: Megoňky – Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého pohraničia.

11. Podmienky účasti:

Osobné postavenie:

a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúceho sa osobného postavenia: a) musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - doklad uchádzač nepredkladá, podľa § 32 ods. 3 ZVO - overuje verejný obstarávateľ z dostupných zdrojov v zmysle ZVO.

b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO – uchádzač predkladá čestné vyhlásenie.

Ekonomické a finančné postavenie:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa

Technická a odborná spôsobilosť:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

1. podľa §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa §34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3. podľa §34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

4. podľa §35 uvedením opatrení manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

5. podľa § 35 v súbehu s § 34 ods. 1 písm. c) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní platným certifikátom pre Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Mínimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 1: uchádzač predloží min. 2 referencie v hodnote min. 200.000 EUR bez DPH o realizácii zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. asfaltácia miestnych komunikácií.

k bodu 2: uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie inžinierske stavby - splnomocňujúce na vykonanie vybraných činností vo výstavbe alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácii. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač ďalej predloží za stavbyvedúceho odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby, pričom sa požaduje originál s podpisom stavbyvedúceho.

k bodu 3: uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie a používanie schémy environmentálneho manažérstva a auditu EMAS v oblasti vykonávania stavieb.

k bodu 4: uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania stavieb.

k bodu 5: uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 alebo iného ekvivalentného dokladu.

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia:

Najnižšia celková cena (cena s DPH).

Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov; od najnižšej ceny celkom v Eur s DPH (ponuka saumiestni na prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú cenu celkom v Eur s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk).

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 19.06.2023 o 10.00 hod. SEČ

Ponuka musí byť doručená do tohto termínu!

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:

Ponuky musia byť predložené cez systém IS EVO.

15. Požadovaný obsah ponuky:

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať minimálne:

- identifikačné údaje osoby (min. názov alebo obchodné meno osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo),
- navrhovanú cenu za predmet plnenie vyjadrenú ako cenu bez DPH, resp. cenu celkom (Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 1 tejto Výzvy)
- podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami – Príloha č. 2.
- podpísaný ocenený výkaz výmer – Príloha č. 3 tejto Výzvy
- výkaz výmer vo formáte excel
- dátum vypracovania cenovej ponuky
- podpis (prípadne pečiatku) osoby

Zmluvu predloží len víťazný uchádzač po obdržaní informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude ponuka zaradená do hodnotenia.

Potvrdenia, doklady a iné dokumenty v ponuke, požadované vo výzve na predloženie ponúk, kde originály nie sú vyhotovené elektronicky, môžu byť predložené naskenované originály alebo naskenované úradne osvedčené kópie originálov v needitovateľnej forme najlepšie vo formáte .pdf, prípadne ako link na príslušnú stránku, kde si verejný obstarávateľ môže overiť existenciu a platnosť požadovaného dokumentu.

Prípadné doklady/dokumenty/podklady/vzorky, ktoré v nadväznosti na požiadavku verejného obstarávateľa predkladá uchádzač ako súčasť svojej ponuky a ktorých predloženie neumožňuje elektronická komunikácia

prostredníctvom funkcionality informačného systému EVO resp. ktorých predloženie v listinnej podobe umožňuje zákon o verejnom obstarávaní, budú doručené na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote určenej verejným obstarávateľom podľa týchto súťažných podkladov, v uzatvorenom obale (obálke) s označením verejného obstarávania (názov zákazky), uchádzača a kontaktnej adresy verejného obstarávateľa. Uchádzačom sa takto predložené súčasti jeho ponuky nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

16. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo, ktorej návrh tvorí prílohu Výzvy.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Slovenský jazyk (alebo český jazyk):

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

Áno: Operačný program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2021/13
Názov projektu: Megoňky – Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého pohraničia
Kód žiadosti v ITMS2014+: NFP304020BM18

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú a poskytnúť oprávneným osobám potrebnú súčinnosť.

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Lehota viazanosti ponúk je požadovaná do 31.12.2023.
Pre všetky prípadné požiadavky uvedené vo výzve a prílohách výzvy, ktoré sa viažu na konkrétneho

výrobca, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, platí, že boli uvedené za

účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto, alebo ekvivalentné, ktoré však musia dosahovať minimálne rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, statické, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované vo výkaze. Posúdenie ekvivalencie bude v kompetencii verejného obstarávateľa.

- Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom v zmysle zákon o verejnom obstarávaní, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona; ak má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora) a ak má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaný v registri partnerov verejného sektora je verejný funkcionár podľa § 11 ods. 1, písm. c).

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 05.06.2023

Prílohy:

- 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 1.
- 2 Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami – Príloha č. 2.
- 3 Výkaz – výmer - Príloha č. 3
- 4 Projektová dokumentácia v elektronickej podobe - Príloha č. 4
- 5 Zmluva o dielo – Návrh – Príloha č. 5
- 6 Ohlásenie stavby – Príloha č. 6

V Čadci 05.06.2023

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
primátor

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky: „Cyklotrasa Megoňky – Šance“

Obchodné meno:

IČO:

Zastúpená:

Uchádzač: je/nie je platcom DPH*¹

Celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom):	
Z toho cena bez DPH	
Z toho DPH	
Z toho sadzba DPH v %	

V dňa

.....
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača

¹ Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami

Názov zákazky: „Cyklotrasa Megoňky – Šance“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno IČO:

zastúpená týmto


čestne vyhlasuje

- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky,
- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;
- že nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f),
- nie je mu známy dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)

V dňa

.....
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača

Identifikačný názov účelovej úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1. Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance	22 dni	Ut 1.8.23	Str 30.8.23
2. Odovzdanie staveniska	1 deň	Ut 1.8.23	Ut 1.8.23
3. Dočasné dopravné značenie	1 deň	Str 2.8.23	Str 2.8.23
4. Úsek č.1 - dl.2 338,0 bm	16 dní	Št 3.8.23	Št 24.8.23
5. Zemné práce, realizácia príekopového žlabu	13 dní	Št 3.8.23	Po 21.8.23
6. Vyspravenie výtlikov	5 dní	Str 16.8.23	Ut 22.8.23
7. Realizácia konš. Vrstiev cyklotrasy	5 dní	Str 16.8.23	Ut 22.8.23
8. Realizácia krajnic so zhuňtmením	4 dni	Po 21.8.23	Št 24.8.23
9. Dokončovacie práce, vyčistenie staveniska	3 dni	Pi 25.8.23	Ut 29.8.23
10. ODOVZDANIE STAVBY	1 deň	Str 30.8.23	Str 30.8.23

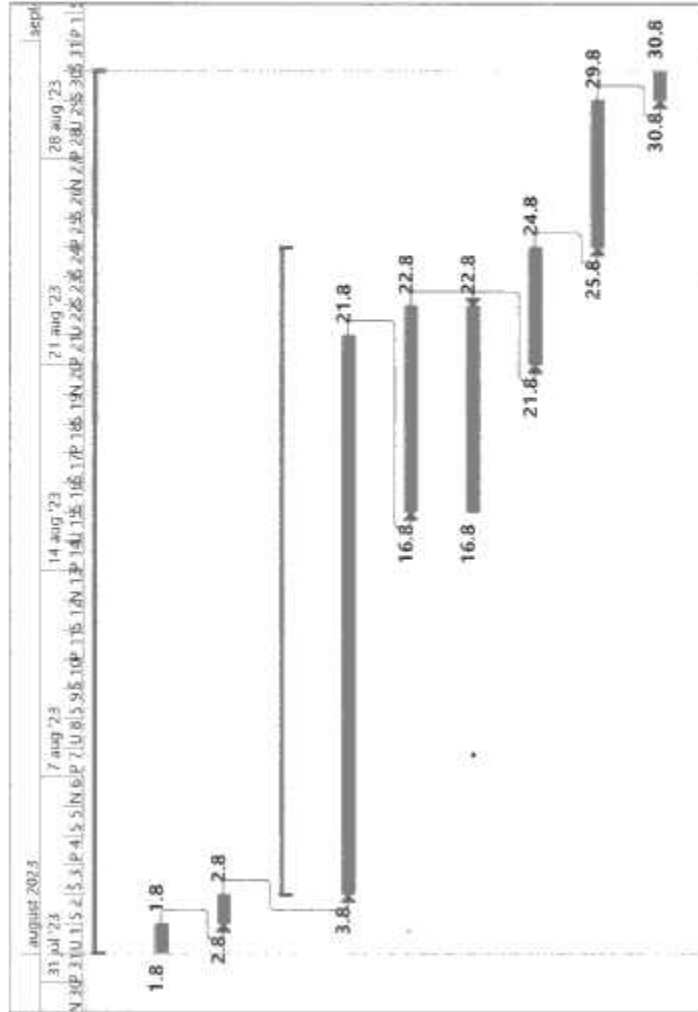


VYPRACOVAL ING.E.GRAMBLIČKOVÁ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.E.GRAMBLIČKOVÁ	KRESLIL ING.E.GRAMBLIČKOVÁ	ING. PETER GRAMBLIČKA HURBANOVA 777 022 01 ČADCA Tel.: [REDACTED]
KONTROLOVAL ING.P.GRAMBLIČKA	OKRES (OBVOD) STAVBY ČADCA		PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB A INŽINIERSKA ČINNOSŤ IČO 30551633 DIČ 1021114886
INVESTOR Mesto ČADCA			STUPEŇ TP
Miesto stavby: ČADCA			FORMÁT xA4
Objekt: Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance			DÁTUM 5/2019
			Č. ZAKÁZKY 201912
Príloha:			MIERKA -
			ARCHÍVNE ČÍSLO 201912
			ČÍSLO VÝKRESU
			ČÍSLO SÚPRAVY

Stavba: **Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy**
Geopark Megoňky - Šance

Zoznam príloh

1. Technická správa	-
2. Prehľadná situácia	1:50 000
3. Situácia	1:6 000
4. Vzorový priečny rez	1:50
5. Rozpočet	-

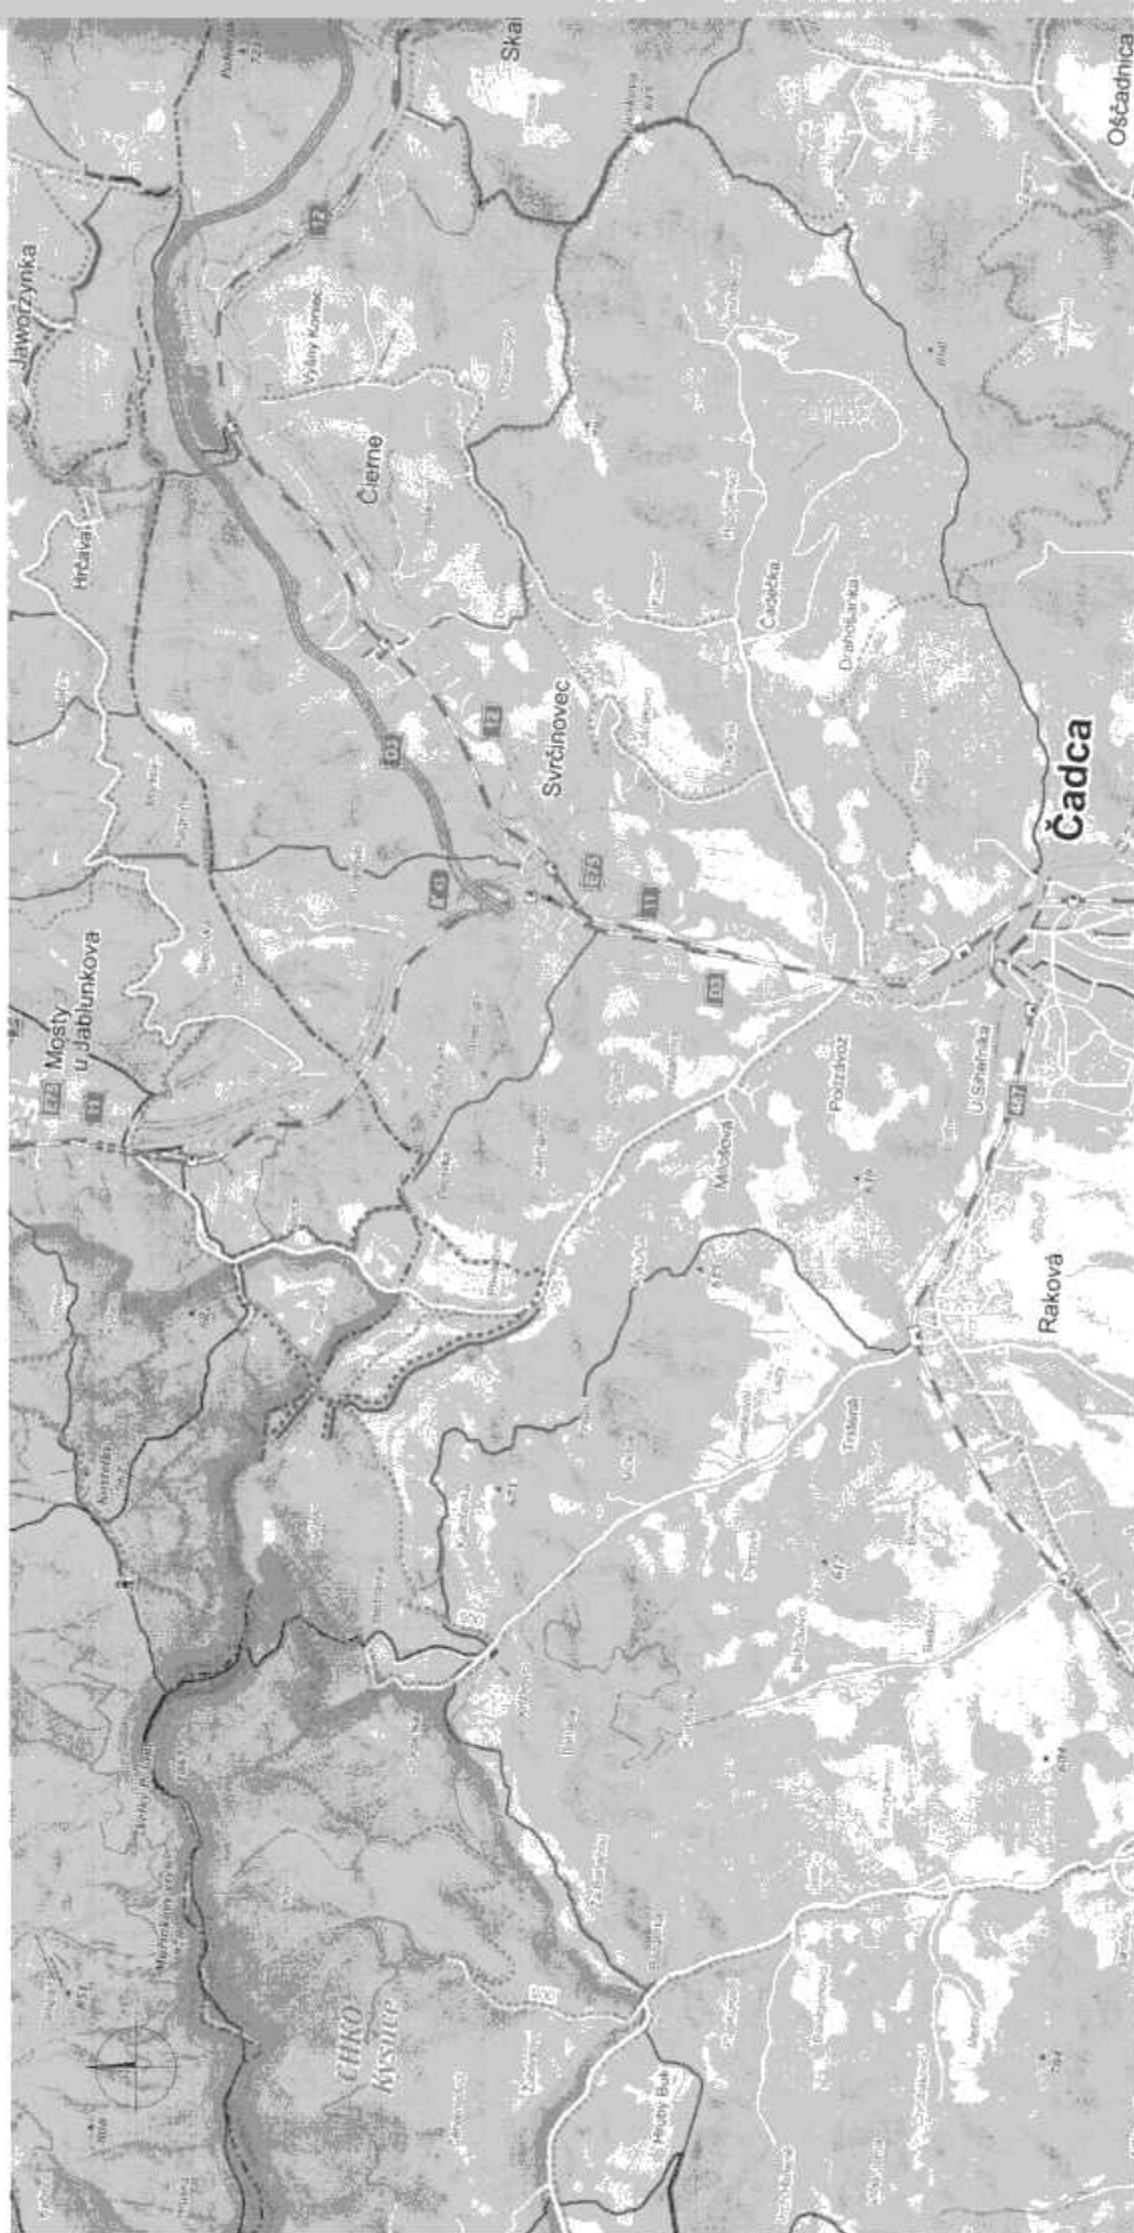


Legenda

- JESTVUJÚCE CYKLOTRASY
- NAUČNÁ CYKLOTRASA GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE
- REKONŠTRUKCIA NAUČNEJ CYKLOTRASY GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE

VYPRACOVÁVATEĽ ING. PETER GRAMELIČKA KONTAKT ING. P. GRAMELIČKA ING. P. GRAMELIČKA MESTO ČADCA	ODPORUČENÝ PROJEKTANT ING. P. GRAMELIČKA ING. P. GRAMELIČKA MESTO ČADCA	VYPRACOVÁVATEĽ ING. PETER GRAMELIČKA HURBANOVÁ 777 022 01 ČADCA PROJEKTOVANIE DOBRÝCH STAVIEB A INŽENIERSKÁ ČINNOSŤ IČO: 30001633 DIČ: 1021114886
Miesto: ČADCA Miestn. oblasť: ČADCA	ÚVODNÁ TP	VYPRACOVÁVATEĽ 2x44
Objekt: Rekonštrukcia naučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance	Dátum: 5/2019	F. číslo: 201912
	Mierka: 1:50 000	Revízia číslo: 201912
		Číslo správy: 2

Legenda

- JESTVUJÚCA CYKLOTRASA 005
- NÁUČNÁ CYKLOTRASA
- GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE
- ZREKONŠTRUOVANÁ NÁUČNÁ CYKLOTRASA (2018)
- GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE
- REKONŠTRUKCIA NÁUČNEJ CYKLOTRASY
- GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE ÚSEK č. 1
- GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE ÚSEK č. 2
- GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE ÚSEK č. 3

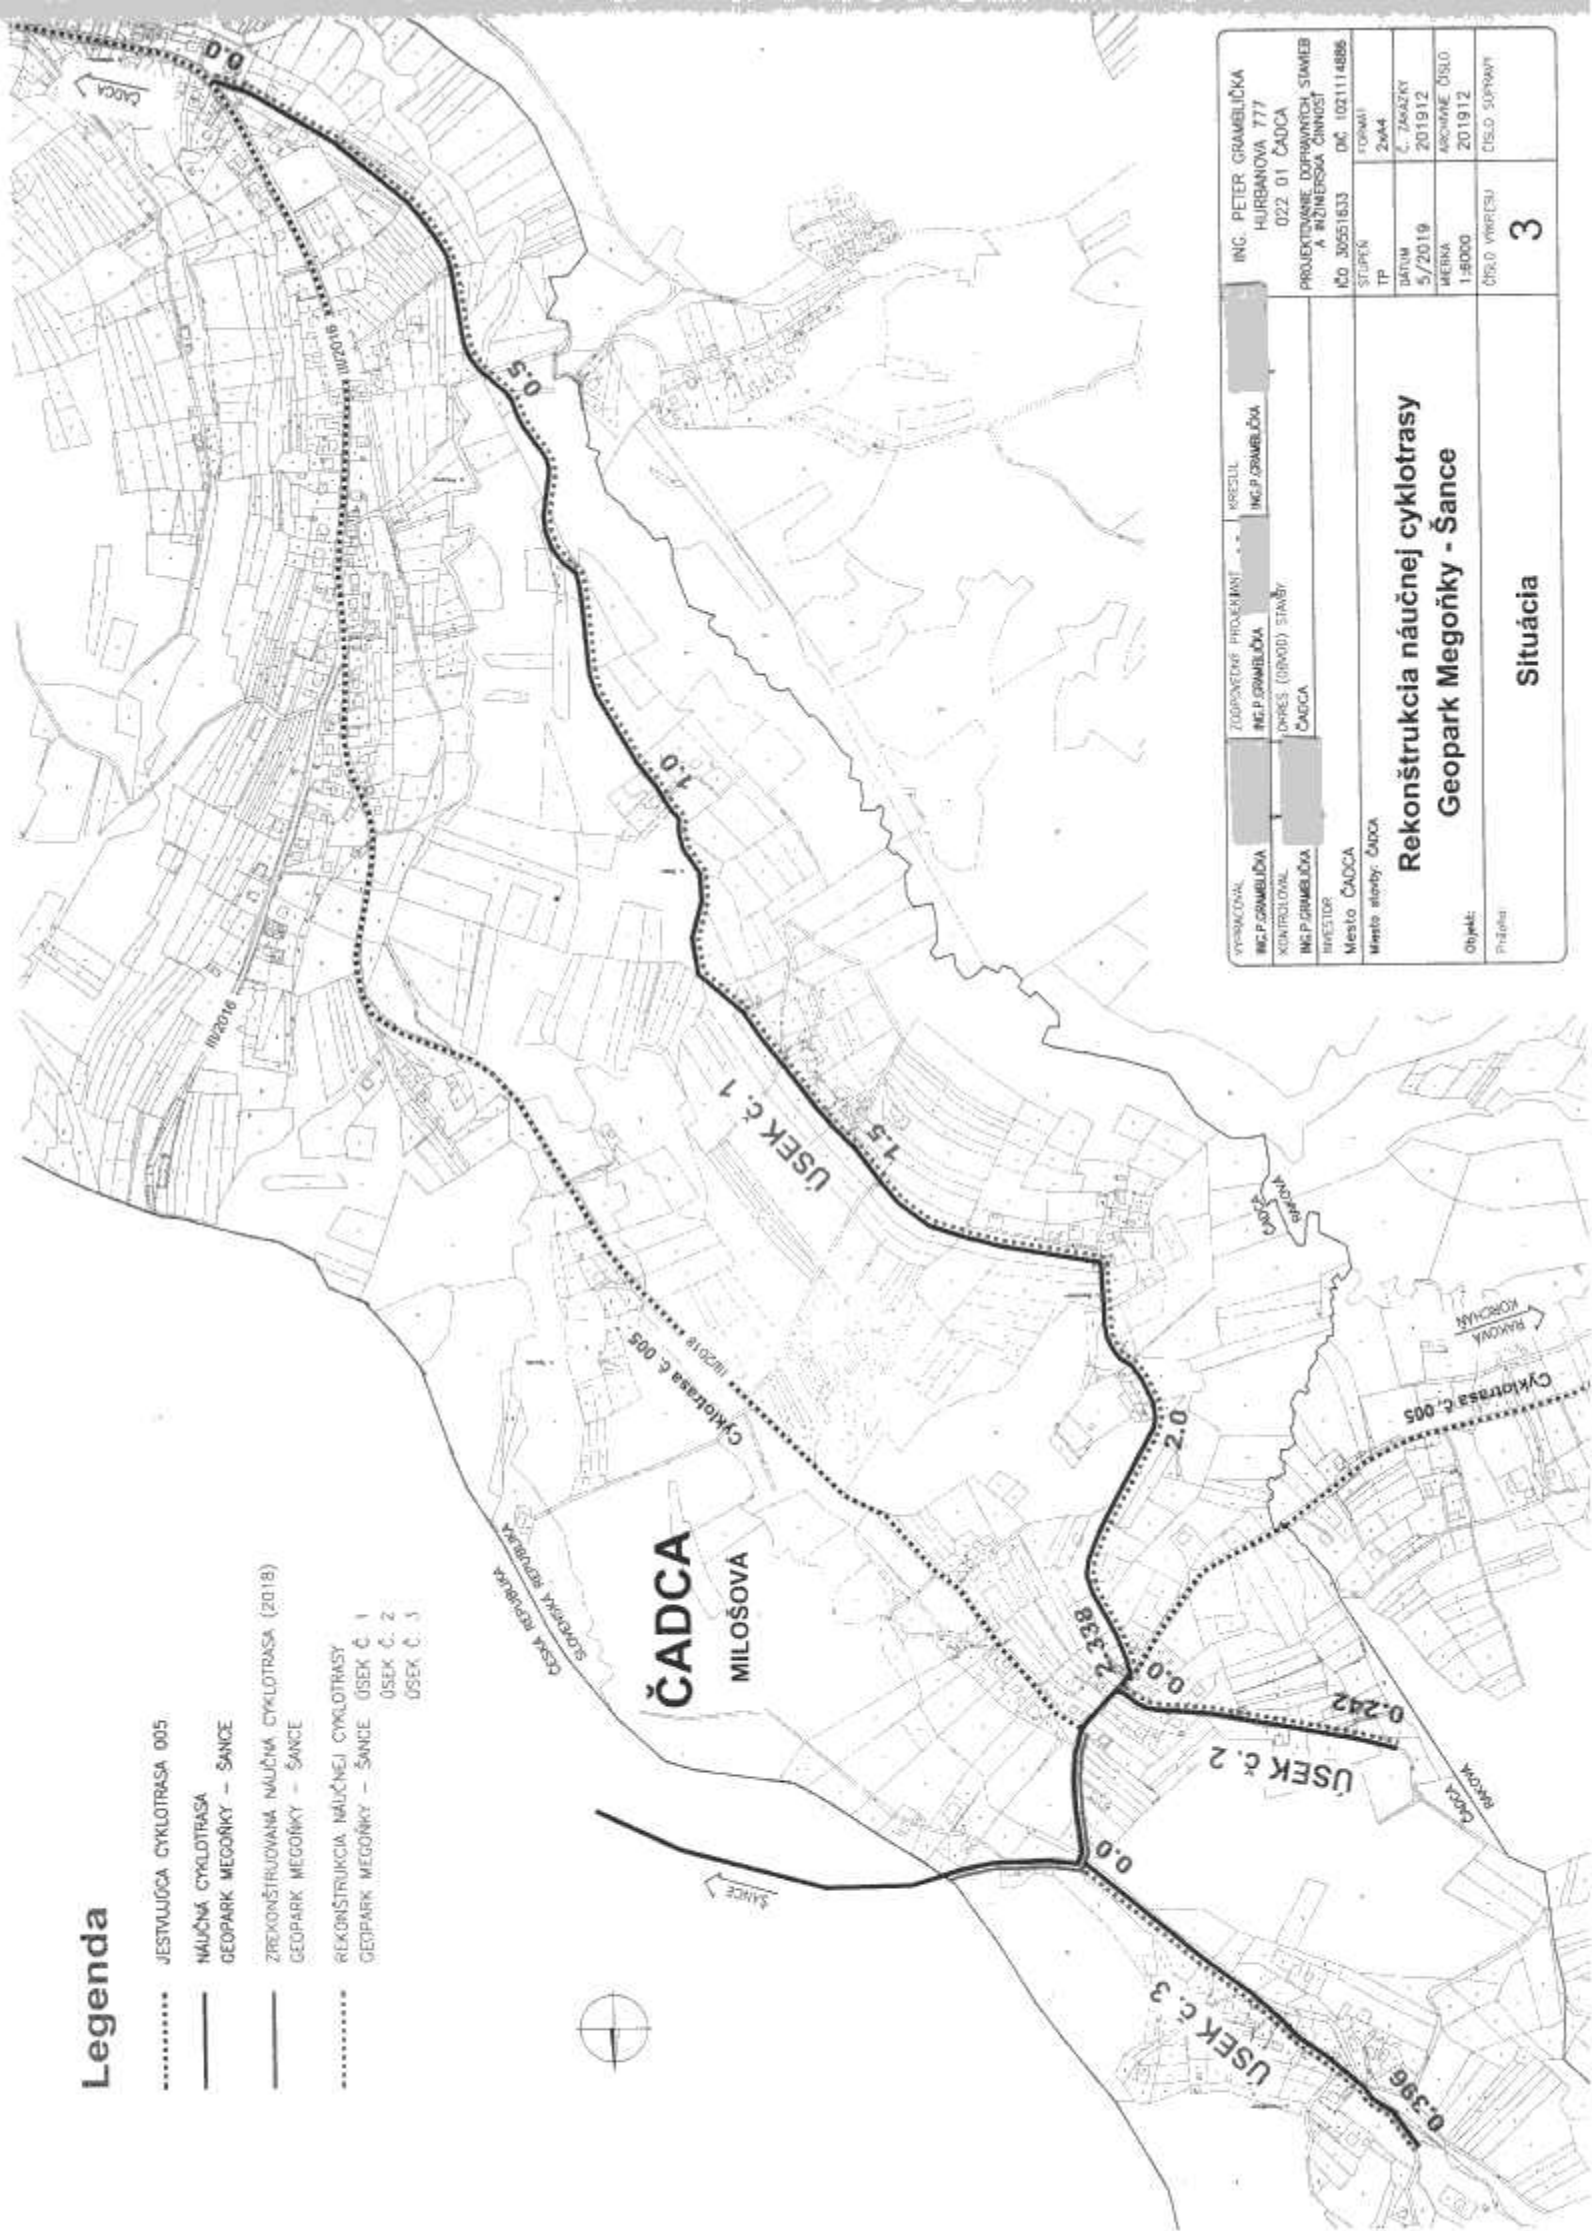


VÝKONOVÁ ING. P. GRAMELIČKA	ZODPOVEDNÝ PRÁCEVNÍK ING. P. GRAMELIČKA	KRESLIL ING. P. GRAMELIČKA	ING. PETER GRAMELIČKA
KONTROLÓVA ING. P. GRAMELIČKA	OPRÁV (OPROD) STAVBY ČADCA		HURBANOVÁ 777 022 01 ČADCA
INVESTOR Mesto ČADCA			PROJEKTOVANÉ DOPRAVNÉ STAVBY A RIŠNERSKÁ ČINNOSŤ
Miesto stavby: ČADCA			IČO 30551833 DIČ 102114886
			STUPEŇ
			FORMA 2x44
			Č. ZÁKAZKY 201912
			ARCHEMNE ČÍSLO 201912
			ČÍSLO VÝKRESU CISLO SOPIAVY
Objekt:			3
Práčka:			

Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance

Situácia

Vzorový priečný rez

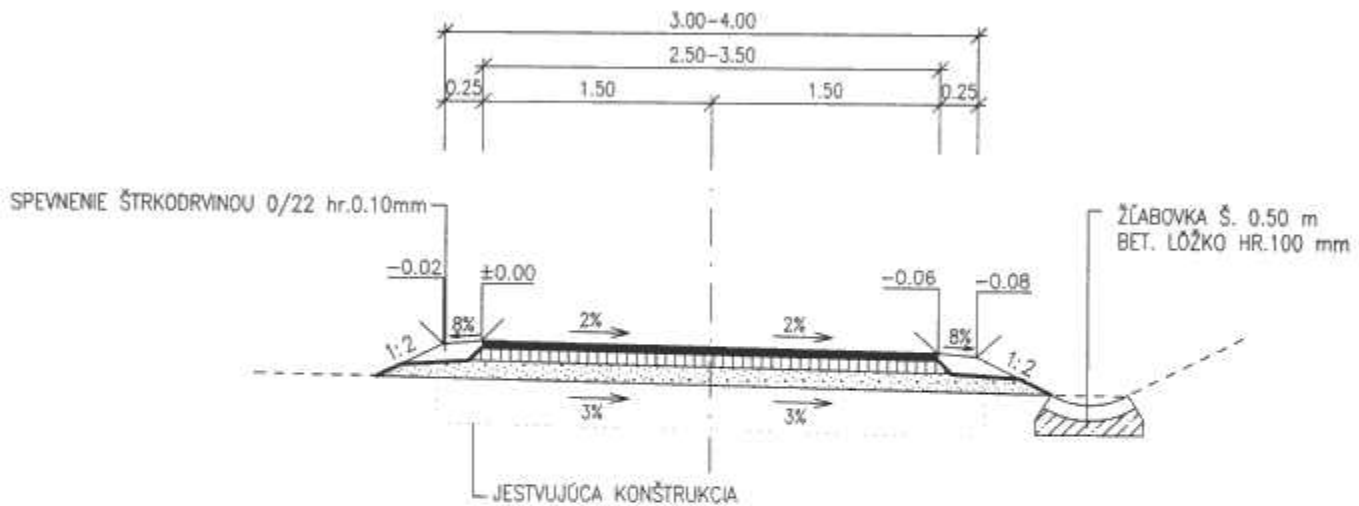


1. **KONŠTRUKCIA VOZOVKY CYKLOTRASY PRE JESTVUJÚCI ASFALTOBETÓNOVÝ POVRCH**
- | | | | |
|---|---------------------|------------|-------------------|
| ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU | AC _{16-II} | 50 mm | STN 73 6121 |
| SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ | PS CBP | | STN 73 6129: 2009 |
| VOZOVKA SPOLU | | MIN. 50 mm | |
2. **KONŠTRUKCIA VOZOVKY CYKLOTRASY PRE JESTVUJÚCI POVRCH Z PENETRAČNEHO MAKADAMU**
- | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|
| ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU | AC _{16-II} | 50 mm | STN 73 6121 |
| SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ | PS CBP | | STN 73 6129: 2009 |
| ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU | AC _{22-II} | 80 mm | STN 73 6121 |
| INFILTRAČNÝ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ | PI CP | | STN 73 6129: 2009 |
| VYSPRAVENIE VÝTLKOV | | | |
| VOZOVKA SPOLU | | MIN. 130 mm | |
3. **KONŠTRUKCIA VOZOVKY CYKLOTRASY PRE JESTVUJÚCI ŠTRKOVÝ POVRCH**
- | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------------|
| ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU | AC _{16-II} | 50 mm | STN 73 6121 |
| SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ | PS CBP | | STN 73 6129: 2009 |
| ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU | AC _{22-II} | 80 mm | STN 73 6121 |
| INFILTRAČNÝ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ | PI CP | | STN 73 6129: 2009 |
| NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY | ŠD 31,5G ₆ | 120 mm | STN 73 6126 |
| VOZOVKA SPOLU | | MIN. 250 mm | |

VYPRACOVAL ING. E. GRAMBLIČKOVÁ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. E. GRAMBLIČKOVÁ	KRESLIL ING. E. GRAMBLIČKOVÁ	ING. PETER GRAMBLIČKA HURBANOVA 777 022 01 ČADCA Tel.: [REDACTED]
KONTROLOVAL ING. P. GRAMBLIČKA	OKRES (OBVOD) STAVBY ČADCA		PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB A INŽINIERSKA ČINNOSŤ IČO 30551633 DIČ 1021114886
INVESTOR Mesto ČADCA	Miesto stavby: ČADCA		STUPEŇ TP
Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance			FORMÁT 1xA4
		DÁTUM 5/2019	Č. ZAKAZKY 201912
Objekt:		MIERKA 1:50	ARCHÍVNE ČÍSLO 201912
Príloha:		ČÍSLO VÝKRESU 4	ČÍSLO SÚPRAVY

Legenda

- JEŠTUVAJÚCA CYKLOTRASA Č. 005
- ▬ REKONŠTRUKCIA CYKLOTRASY Č. 005
- ▬ MĀJÚCĀ CYKLOTRASA
GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE
- ▬ REKONŠTRUKCIA MĀJÚCĀJ CYKLOTRASY
GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE

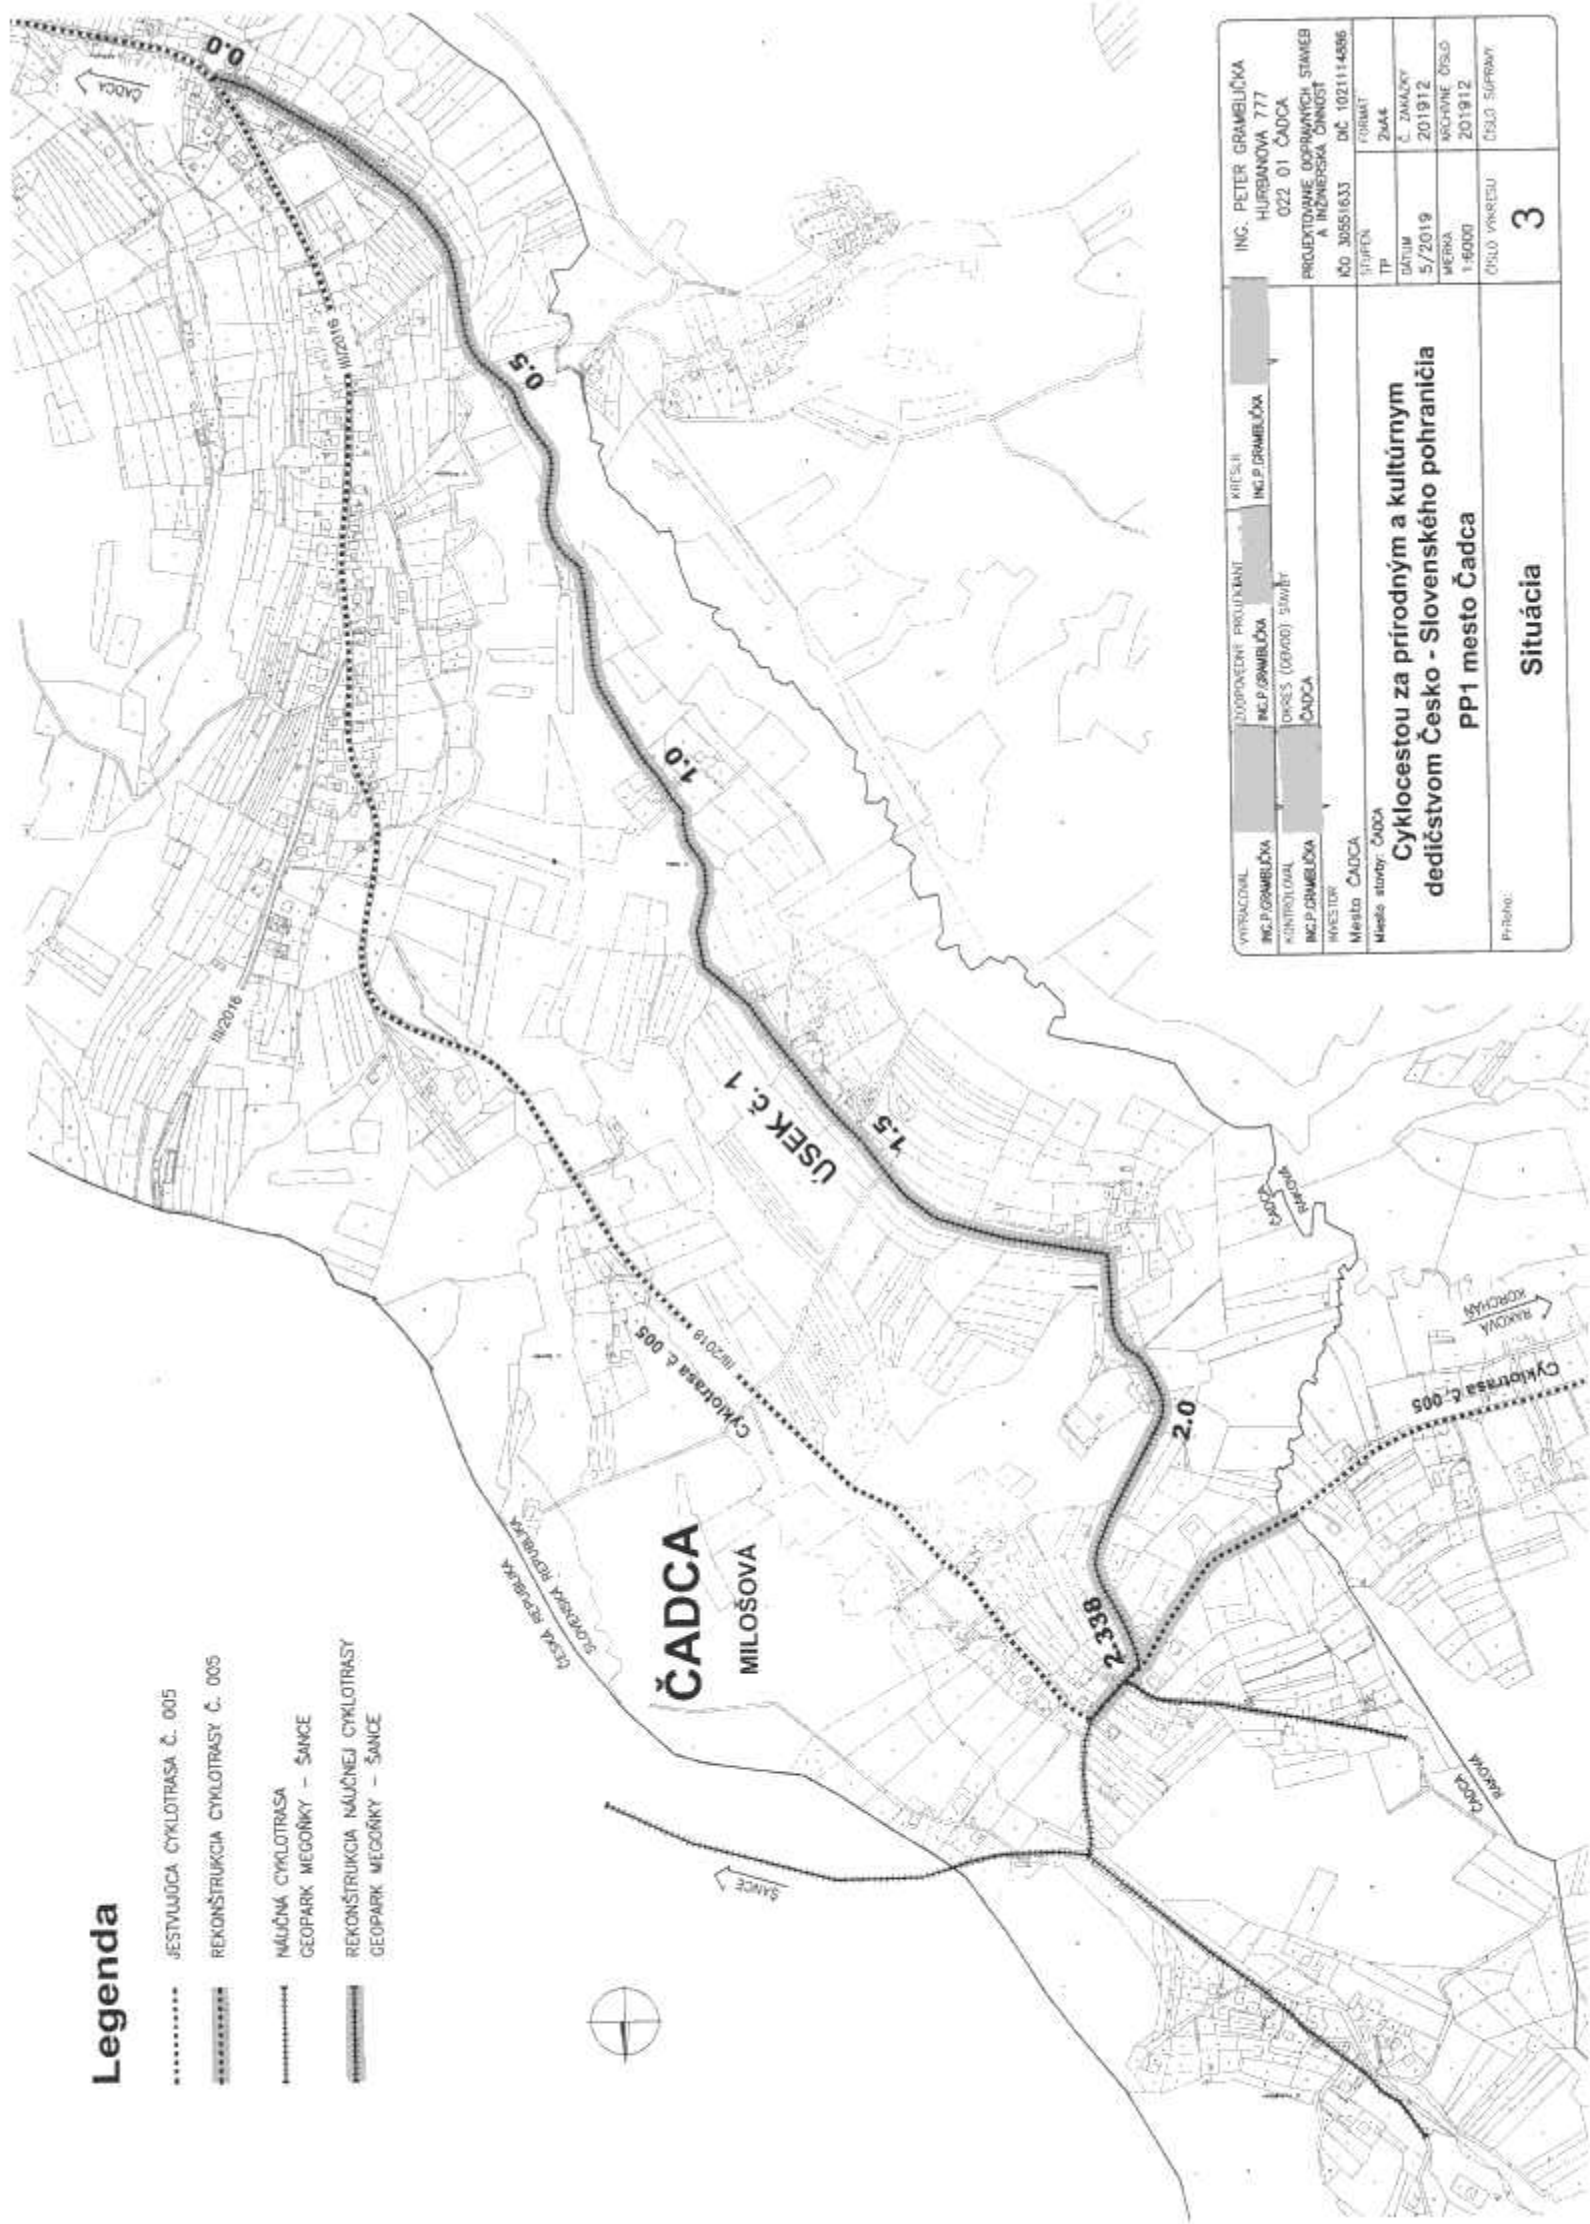

VYPRACOVANÉ ING. P. GRAMELIČKA KONTROLOVANÉ ING. P. GRAMELIČKA MESTSKÝ Mesto ČADCA Miesto staroby: ČADCA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. P. GRAMELIČKA DRESS (00000) staviteľ ČADCA	KRÍŠLÍK ING. P. GRAMELIČKA	ING. PETER GRAMELIČKA HURBANOVA 777 022 01 ČADCA PROJEKTOVANIE DOOPRÁVNENÝCH STAVIEB A INŽENIERSKÁ ČINNOSŤ IČO 30551633 DIC 102111486
FORMÁT ZNAČK	STUPEN TP	Č. ZNAČKY 201912	201912
ČÍSLO VYKRESU 3	ČÍSLO VYKRESU 3	MEZRA 1:6000	MEZRA 1:6000
ČÍSLO VYKRESU 3	ČÍSLO VYKRESU 3	MEZRA 1:6000	MEZRA 1:6000
ČÍSLO VYKRESU 3	ČÍSLO VYKRESU 3	MEZRA 1:6000	MEZRA 1:6000

Cyklocestou za prírodným a kultúrnym dedičstvom Česko - Slovenského pohrančia
PP1 mesto Čadca

Situácia

Príloha:

Technická správa

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	2
2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU	2
2.1	Druh komunikácie a jej funkcia.....	2
2.2	Zdôvodnenie potreby stavby	2
2.3	Podklady	2
2.4	Vecné a časové väzby stavby a súvisiace investície.....	2
2.5	Umiestnenie stavby z hľadiska vplyvov na ŽP a požiadavky na odňatie PPF a LPF.....	3
2.6	Riešenie odpadu z výstavby a prevádzky	3
2.7	Zariadenie civilnej obrany a protipožiarneho zabezpečení stavby.	4
2.8	Starostlivosť o bezpečnosť práce.....	4
2.9	Plnenie podmienok stavebného povolenia	4
3.	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE	4
3.1	Popis funkčného a technického riešenia	4
3.2	Trvalé a dočasné dopravné značenie	5
3.3	Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave a v priebehu výstavby	6
3.4	Zemné práce	6
3.5	Odvodnenie.....	6
3.6	Etapy výstavby a postup výstavby.....	6
3.7	Ďalšie opatrenia na uvoľnenie staveniska	7
3.8	Vytýčenie.....	7
3.9	Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác.....	7
4.	POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE	7

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba	: Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy
Názov stavby	: Geopark Megoňky - Šance
Miesto stavby	: Čadca, Žilinský kraj, okres Čadca
Katastrálne územie	: Čadca
Druh stavby	: rekonštrukcia
Trieda pozemnej komunikácie	: miestna komunikácia C3
Stavebník	
Názov a adresa stavebníka	: Mesto Čadca Mestský úrad, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

2.1 Druh komunikácie a jej funkcia

Riešený úsek je súčasťou **Náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance** dlhej 7 800 m, ktorá vznikla v rámci spoločného cezhraničného projektu **GEPARK MEGOŇKY – ŠANCE (INTERREG V-A SK/ČR, 2018)** medzi mestom Čadca a obcou Mosty u Jablunkova (ČR).

Celková dĺžka spoločnej náučnej cyklotrasy je 7 800 m, pričom územím Čadce prechádza v dĺžke 4 500 m a územím obce Mosty u Jablunkova v dĺžke 3 300 m. V rámci tohto úspešného projektu bola táto náučná cyklotrasa Geopark Megoňky – Šance iba vyznačená v krajine (Informačné stĺpiky, cykloznačky na stromoch, 4 ks infopanely) a iba v úseku cca 262 m od konečnej zastávky autobusu smerom k lomu a až na hranicu SR/ČR bola táto miestna komunikácia vyasfaltovaná.

Táto náučná cyklotrasa nás zavedie na významné a zaujímavé lokality situované priamo v pohraničnom území medzi ČR a SR, ktorými sú :

Vodná nádrž Milošová, Kamenné gule Megoňky, Milošovské šance na území SR

a

Prírodná pamiatka Filúvka, Prírodná pamiatka Motyčanka, Prírodná rezervácia Vfesová stráň, Šance (hradisko, opevnenie), Staré Šance (hradisko, opevnenie) na území ČR.

2.2 Zdôvodnenie potreby stavby

V časti Náučnej cyklotrasy situovanej na území Slovenska, v lokalite Milošová, je povrch cyklotrasy čiastočne spevnený penetračným makadamom, asfaltovým betónom alebo nespevnený. Povrch vykazuje veľké nerovnosti, výmole a výtlky, ktoré spôsobujú, že jazda po cyklotrase je nepohodlná a v istých miestach aj nebezpečná pre niektoré skupiny užívateľov cyklotrasy. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje rekonštrukcia povrchu cyklotrasy a obnova jej odvodnenia.

2.3 Podklady

Podklady:

- rastrová mapa M 1:50 000
- katastrálna mapa M 1:1000

2.4 Vecné a časové väzby stavby a súvisiace investície

Väzby stavby na okolitú zástavbu

Stavba je situovaná v extraviláne mesta Čadce.

Úsek č. 1 na začiatku úpravy sa napája na cyklistickú magistrálu č. 005 v katastri mesta Čadca, lokalita Milošová (Prívarovci), na cestu III/2016. Na konci sa napája na cyklistickú magistrálu č. 005 (Vyšné Megoňky), s ktorou vytvára v lokalite Milošová cyklistický okruh. V pripojení na konci úseku

jestv. cyklotrasa č. 005 smeruje z tejto lokality na jednej strane do katastra obce Raková, na strane druhej do Českej republiky (náučná cyklotrasa).

Úsek č. 2 na začiatku úpravy sa napája na cyklistickú magistrálu č. 005 v katastri mesta Čadca, lokalita Milošová (Vyšné Megoňky). Na konci sa napája na lesnú cestu.

Úsek č. 3 na začiatku úpravy sa napája na náučnú cyklotrasu smerujúcu k hranici s Českou republikou, lokalita Milošová (Padyšákovci). Na konci sa napája na poľnú cestu.

Okolo cyklotrasy sa nachádza malá zástavba, často rekreačného charakteru.

Väzby stavby na inžinierske siete

Vzhľadom k tomu, že ide o povrchovú úpravu cyklotrasy väzby na inž. siete sa neriešia.

Väzby stavby na príslušnú cestnú sieť

Stavba sa na začiatku napája v katastri mesta Čadce na cestu III/2016, na konci na cyklotrasu smerujúcu do katastra obce Raková na jednej strane, na strane druhej na turistickú trasu do ČR.

Koordinácia so zámermi iných stavebníkov

V území dotknutom stavbou nie sú známe zábery iných investítorov.

2.5 Umiestnenie stavby z hľadiska vplyvov na ŽP a požiadavky na odňatie PPF a LPF

Znečistenie ovzdušia, hluk, emisie

Vzhľadom k tomu, že ide o ekologický spôsob dopravy negatívne dôsledky na životné prostredie nie sú známe. Počas výstavby dôjde k zvýšeniu koncentrácie exhalátov a prašnosti na stavbe vplyvom mechanizmov dodávateľa stavebných prác, ktoré sú však len dočasné a vzhľadom na druh prác aj minimálne.

Povrchová a podzemná voda

Jestvujúci systém odvodnenia sa zachováva a ostáva bez zmeny. Voda z cyklotrasy je odvádzaná do okolitého terénu, resp. cez priekopy a priepusty do jestv. vodotečí. Podzemnej vody sa stavba nedotýka.

Pôda

Stavba sa nedotýka záujmov pôdneho ani lesného pôdneho fondu.

Príroda

Stavba nemá negatívny vplyv na prírodu a krajinu.

Krajina

Stavba nezasahuje do národných parkov, prírodných rezervácií, ani chránených oblastí. V území, kde sa nachádza predmetná stavba platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny území. Najbližšie ku stavbe sa nachádza Prírodná pamiatka Megoňky s 5. stupňom ochrany.

2.6 Riešenie odpadu z výstavby a prevádzky

V súvislosti s realizáciou stavby sa predpokladá, že odpad bude produkovany:

- počas realizácie stavebných prác
- počas prevádzky stavby

Odpady, ktoré vznikajú výstavbou sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov a vydáva katalóg odpadov. Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do kategórií a druhov odpadov. Odpady sa členia na kategórie - nebezpečné odpady "N" a ostatné odpady "O".

Opad ktorý vznikne pri realizácii bude odvezený a bude s ním nakladané podľa zákona č. 223/2001 Z.z.

Pri samostatnej prevádzke cyklotrasy vznikajú odpady, ktoré budú riešené jednotlivými správcami (obec Raková), ktorých povinnosťou je aj zabezpečenie zneškodnenia odpadov počas prevádzky ciest podľa schváleného odpadového programu.

Počas výstavby vzniknú odpady ako vedľajší produkt jednotlivých stavebných postupov a technológií (stavebné drevo, oceľ, stavebná suť, frézovaná vozovka). V závere výstavby budú odpady vznikajúť prevažne následkom rušenia dočasného zariadenia staveniska.

Pri realizácii stavebných prác sa uvažuje s nasledovnými prácami a manipuláciou s vybraným materiálom a odpadmi:

- vybúranie starej krajnice jestvujúcej trasy a výkopová zemina. Vybúraný materiál sa odvezie na skládku TKO na Podzávoze v Čadci.

V nasledovnej tabuľke sú odpady zatriedené podľa Katalógu odpadov, určený je zdroj znečistenia, druh a množstvo.

Číslo odpadu	Názov odpadu	Pôvod odpadu	Kategória odpadu	M.J.	Množstvo
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií				
170506	Výkopová zemina iná	vozovka	O	t	1 261

2.7 Zariadenie civilnej obrany a protipožiarneho zabezpečení stavby.

Zariadenia civilnej obrany a protipožiarneho zabezpečení sa v rámci predmetnej stavby nebudú zriaďovať.

2.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce

Na stavenisku objektu nie sú práce s osobitným nebezpečenstvom. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396 z mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný pri stavebných prácach dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti práce.

2.9 Plnenie podmienok stavebného povolenia

Pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie (Dokumentácie na ponuku) bude právoplatné stavebné povolenie súčasťou podkladov pre budúceho zhotoviteľa stavby. Podmienky zo stavebného povolenia zahŕňa zhotoviteľ do svojej ponuky (počas výstavby nebude možné podmienky zo stavebného povolenia zhrnúť do prác navyše).

3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1 Popis funkčného a technického riešenia

Rekonštrukcia cyklotrasy je navrhnutá ako obojsmerná 2-pruhová komunikácia so šírkou j.p. 1,25-1,50 m s krajinami š. 0,25 m.

Dĺžka navrhovanej úpravy je:

- 1. úsek – 2 338 m
- 2. úsek – 242 m
- 3. úsek - 396 m

Smerové a výškové vedenie sa nemení.

Základný priečny sklon je 2,0%. Dostredný priečny sklon je navrhnutý v zmysle orientácie smerových oblúkov.

Konštrukcia vozovky cyklotrasy:

Na trase sa nachádzajú úseky s 3 typmi povrchov:

- nespevnený prašný, resp. so štrkovým povrchom
- z penetračného makadamu PHM
- z asfaltového betónu AB

Živičné povrchy majú rôznu kvalitu – od drobných trhliniek až po odtrhnutie krajnic, prípadne s rozpadom vozovky. V prípade veľmi porušeného živičného povrchu sa dopĺňa vyrovnávacía vrstva zo štrkodrviny hr. 0,120 m.

Pred samotným položením asf. vrstiev je potrebné zbaviť povrch vozovky nánosov zeminy a odstrániť prípadnú vegetáciu.

V rámci lepšieho odvodnenia sa upravujú jestv. krajnice, ktoré bránia odtoku vody z vozovky. Návrh spočíva v odstránení jestv. krajnice a nahradenia vrstvou štrkodrviny hr. 0,100 m.

Riešenie navrhovaných úsekov z hľadiska typu konštrukčnej úpravy:

1. úsek		
Staničenie	Jestv. povrch	Návrh konštrukcie
0,000-0,520	AB	Typ 1
0,520-0,830	PMH	Typ 2
0,830-0,860	PMH	Typ 3
0,860-1,004	PMH	Typ 2
1,004-1,168	AB	Typ 1
1,168-1,280	PMH	Typ 2
1,280-1,310	PMH	Typ 3
1,310-1,348	PMH	Typ 2
1,348-1,535	AB	Typ 1
1,535-1,810	PMH	Typ 3
1,810-2,185	AB	Typ 1
2,185-2,237	PMH	Typ 2
2,237-2,338	AB	Typ 1

2. úsek		
Staničenie	Jestv. povrch	Návrh konštrukcie
0,000-0,156	AB	Typ 1
0,156-0,242	nespevnený	Typ 3

3. úsek		
Staničenie	Jestv. povrch	Návrh konštrukcie
0,000-0,396	AB	Typ 2

(1) Konštrukcia vozovky cyklotrasy pre jestvujúci povrch z asfaltového betónu

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu	ACo 16-II	50 mm	STN 73 6121
Spojovací postrek kationaktívny emulzný	PS CBP	-	STN 73 6129

Vozovka spolu min. 50 mm

(2) Konštrukcia vozovky cyklotrasy pre jestvujúci povrch z penetračného makadamu

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu	ACo 16-II	50 mm	STN 73 6121
Spojovací postrek kationaktívny emulzný	PS CBP	-	STN 73 6129
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu	ACp 22-II	80 mm	STN 73 6121
Infiltračný postrek kationaktívny emulzný	PI CB	-	STN 73 2129

Vozovka spolu min. 130 mm

(3) Konštrukcia vozovky cyklotrasy pre jestvujúci štrkový povrch

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu	ACo 16-II	50 mm	STN 73 6121
Spojovací postrek kationaktívny emulzný	PS CBP	-	STN 73 6129
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu	ACp 22-II	80 mm	STN 73 6121
Infiltračný postrek kationaktívny emulzný	PI CB	-	STN 73 2129
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny	ŠD 31,5 Gc	120 mm	STN 73 6126

Vozovka spolu min. 250 mm

3.2 Trvalé a dočasné dopravné značenie

Trvalé dopravné značenie (TDZ)

TDZ sa nenavrhuje.

Prenosné dopravné značenie (PDZ)

Cyklotrasa sa bude budovať po dielčích úsekoch a počas prác sa uzavrie. Na oboch koncoch dielčích úsekov a všetkých pripájajúcich sa poľných a lesných ciest sa osadí

- kombinácia značiek B1, E12 (okrem vozidiel stavby) a Z2a

- A19 – 20 m pred B1

Realizácia stavby bude ovplyvňovať verejnú premávku v jej najbližšom okolí. Priestor stavby bude uzatváraný po častiach, v ktorých budú prebiehať stavebné práce, t.j. uzávierka jestvujúcej trasy. To znamená, že počas výstavby nebude možné využívať trasu pre akúkoľvek dopravu. Vlastníci nehnuteľností budú musieť svoje automobily odstaviť mimo priestoru výstavby. Bude povinnosťou dodávateľa stavby aby zabezpečil prístup k nehnuteľnostiam pre vozidlá HaZZ a RZS.

3.3 Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave a v priebehu výstavby

Počas výstavby dôjde k uzavretiu cyklotrasy. Bude obmedzený prístup automobilovej dopravy na súkromné pozemky. Bude povinnosťou dodávateľa stavby zabezpečiť technickými opatreniami vstup do stavby vozidlám PO a rýchlej zdrav. služby. Organizáciu dopravy zabezpečuje počas výstavby prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia.

3.4 Zemné práce

Zemné práce spočívajú:

- v odkopávkach zemných krajnic, ktoré sú zdvihnuté po okrajoch trasy a znemožňujú priečne odvodnenie.
- odkopávkach pri obnove rigolov a priekop.

Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040.

Bilancia zemných prác a rozvozov:

Celková bilancia zemných prác: - výkop 664 m³ - násyp 0 m³
 - odvoz zeminy na skládku 664 m³

Zemník

Zemní sa neurčuje.

Skládky

Skládky materiálu a stavebný dvor bude na pozemku stavby. Dodávateľ stavby si zabezpečí plochy pre skládky hlavných stavebných materiálov a pre zariadenia staveniska pokiaľ mu nebude uvedený pozemok stačiť. Náklady na zriadenie a úpravu týchto plôch si zaráta do ponukovej ceny.

3.5 Odvodnenie

Povrchová voda

Odvodnenie vozovky je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do priekop, resp. na terén.

Návrh rigolov a priekop:

1. úsek		
Staničenie	Jestv. stav	Návrh konštrukcie
0,000-0,104	nespevnený	Spevnený rigol
0,350-0,690	nespevnený	Spevnená priekopa

2. úsek		
Staničenie	Jestv. povrch	Návrh konštrukcie
0,087-0,156	nespevnený	Spevnený rigol

Podpovrchová voda

Podpovrchovej vody sa stavba nedotýka.

3.6 Etapy výstavby a postup výstavby

Výstavba cyklotrasy sa bude realizovať po technologických úsekoch.

Postup výstavby:

Stavba začne prípravnými prácami súvisiacimi s prípravou pozemkov, práce spojené s úpravou plôch určených pre činnosť zhotoviteľa stavby, odovzdanie staveniska, príprava pozemkov pre

zariadenie staveniska, skládok materiálu, vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v obvode staveniska.

Postup výstavby sa doporučuje takto:

1. osadenie dočasného dopravného značenia
2. vytýčenie inž. sietí
3. oprava rigolov a priekop
4. odkop jestvujúcich krajníc
5. polozenie konštrukčných vrstiev vozovky
6. likvidácia dočasného DZ a zariadenia staveniska

3.7 Ďalšie opatrenia na uvoľnenie staveniska

Opatrenia na uvoľnenie staveniska nie sú potrebné.

3.8 Vytýčenie

Vytýčenie stavby vzhľadom k tomu, že ide o povrchovú úpravu nie je potrebné.

3.9 Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác

Pred začatím prác na objekte sa osadí prenosné dopravné značenie a vykoná sa vytýčenie jestv. inžinierskych sietí.

Pred začatím prác si dodávateľ spracuje realizačnú dokumentáciu.

4. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Na stavenisku objektu nie sú práce s osobitným nebezpečenstvom. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396 z mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný pri stavebných prácach dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pri realizácii stavebných prác pri styku s verejnou premávkou a za prístupu pešej premávky, kde je nutné dodržiavať prenosné dopravné značenie. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená bezpečnosť práce. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä:

- smernicu č. 92/57/EEC O uplatňovaní minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na dočasných alebo mobilných staveniskách
- nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. O bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Čadca, máj 2019

Mesto Čadca
Námestie slobody č. 30

022 01 Č a d c a

VEC: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.


Mesto Čadca ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení a podľa § 16 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení oznamuje, že

proti uskutočneniu stavebných úprav stavby: „*Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky – Šance*“ dlhej celkom 7 800 m, ktorá vznikla v rámci spoločného cezhraničného projektu Geopark Megoňky - Šance na pozemkoch úsek č. 1 - p.č. C KN 13839/1, C KN 13838/1, C KN 13839/5, C KN 13838/8, C KN 13837/2, C KN 13837/9, C KN 8131, C KN 8033/3, C KN 8133/1 a C KN 8133/2 v k. ú. Čadca, úsek č. 2 na pozemku - C KN 14053/2 v k. ú. Čadca, úsek č. 3 na pozemku - C KN 14101 v k. ú. Čadca v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing. Peter Gramblička, Hurbanova 777, 022 01 Čadca, ktoré stavebník ohlásil dňa 31.05.2019

n e m á n á m i e t k y.

Samotné technické riešenie zahŕňa rekonštrukciu existujúcej náučnej cyklotrasy v lokalite Čadca – Milošová, ktorá pozostáva z rekonštrukcie povrchu cyklotrasy a z obnovy jej odvodnenia. Jedná sa o úpravu cyklotrasy s krytom z asfaltového betónu v nasledujúcich dĺžkach pre jednotlivé úseky: úsek č. 1: 2338 m, úsek č. 2: 242 m, úsek č. 3: 396 m. Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná 2 – pruhová so šírkou jazdného pruhu 1,50 m s krajnicami š. 0,25 m. Smerové a výškové vedenie cyklotrasy sa nemení. Trasovanie je zrejmé z výkresových príloh projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing. Peter Gramblička, Hurbanova 777, 022 01 Čadca.

Podľa § 57 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že oznámenie špeciálneho stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov a stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné technické normy. Na cudzie pozemky vstupovať len so súhlasom ich vlastníkov. Odpad vzniknutý pri stavebných prácach bude likvidovaný v súlade so zákonom o odpadoch.


Ing. Milan G U R A
prímátor mesta

Na vedomie:
Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284, 022 80 Čadca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance	JKSO	
Názov objektu	Úsek č.1 - dl.2 338,0 bm	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Čadca		
Projektant			
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Linková Zdena		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mlmostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 170 013,94	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 170 013,94
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 34 002,79
Dátum a popis	Pečiatka	25 20 % 170 013,94 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 204 016,73
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance

Objekt: Úsek č.1 - dl.2 338,0 bm

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Čadca

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	170 013,943
1	Zemné práce	10 718,780
5	Komunikácie	149 076,760
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 279,360
99	Presun hmôt HSV	1 939,043
	<u>Celkom</u>	<u>170 013,943</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance

Objekt: Úsek č.1 - dl.2 338,0 bm

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Čadca

Zhotoviteľ: Metrostav DS a. s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				170 013,943	
		D	1	Zemné práce				10 718,780	
1	K	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	589,000	7,680	4 523,520	20,0
2	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hĺbky tr. 1-4 do 10000 m	m3	589,000	8,340	4 912,260	20,0
3	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	589,000	0,670	394,630	20,0
4	K	001	181101102	Úprava pláňe v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	1 813,000	0,490	888,370	20,0
		D	5	Komunikácie				149 076,760	
5	K	221	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestením a zhutnením, hr. po zhutnení 120 mm "typ3" 644,0	m2	644,000	5,240	3 374,560	20,0
6	K	221	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestenie,zhutnenie,hr. 100 mm	m2	1 169,000	4,070	4 757,830	20,0
7	K	221	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t 116,0*0,2	t	23,200	100,350	2 328,120	20,0
8	K	221	573191111	Náter infiltráčny kationaktívnu emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 "typ2" 2706,0 "typ3" 644,0 Súčet	m2	3 350,000	0,670	2 244,500	20,0
9	K	221	573231111	Postrek asfaltový spejovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 "typ1" 3405,0 "typ2" 2706,0 "typ3" 644,0 Súčet	m2	6 755,000	0,520	3 512,600	20,0
10	K	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50mm "typ1" 3405,0 "typ2" 2706,0 "typ3" 644,0 Súčet	m2	6 755,000	10,930	73 832,150	20,0
11	K	221	577171225	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.ľôžkový (ABL) hr.80 mm "typ2" 2706,0 "typ3" 644,0 Súčet	m2	3 350,000	17,620	59 027,000	20,0
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 279,360	
12	K	221	935112111	Osadenie priekop. Zláb z betón, priekopových tváric šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5 340,0*104,0	m	444,000	12,240	5 434,560	20,0
13	M	MAT	5922794100.1	Tvárnica priekopová TBM 55-16 rozm 500x550x160 444,000*2	ks	888,000	2,600	2 308,800	20,0
14	K	221	938909311	Odstánenie biela, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. "typ2" 2706,0 "typ3" 644,0 Súčet	m2	3 350,000	0,160	536,000	20,0
		D	99	Presun hmôt HSV				1 939,043	
15	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu <u>Celkom</u>	t	2 041,098	0,950	1 939,043	20,0
								<u>170 013,943</u>	

Príloha č. 7 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
			0,00

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :



Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva



Ing. Lenka Sykorová
podpredseda predstavenstva





Dátum: 28.06.2023

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

ZOZNAM KLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

Meno a priezvisko odborníka	Identifikačné údaje	Odborná činnosť
Ing. Mário Mesiarik	Osvedčenie o autorizácii SKSI č.13354 - Inžinierske stavby – dopravné stavby	Organizácia a riadenie stavebných prác na stavbe, príprava fakturácie a nárokov na naviac práce
Ing. Miloš Novák	Oprávnenie-Autorizovaný geodet a kartograf s registračným číslom 940	Zodpovedá za odborný výkon geodetických prác na stavbe a koordinuje činnosť geodetov jednotlivých podzhotoviteľov a účastníkov
Ing. Alena Lacúchová	Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality	Kontrola kvality vstupov stavebnej výroby, vykonaných <i>stavebných</i> prác a použitého materiálu

V Bratislave, dňa 28.06.2023


Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
