

1766

Zmluva o dielo č. 19/OV/2023

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:
Fax:
E - mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Poprad

Nábřeží Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Ing. Anton Danko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
00 326 470
2021031144

Mesto Poprad nie je platcom DPH
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK03 1111 0000 0010 3667 3009

Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562

052/7167 276

052/7721 218

vystavba@msupoprad.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

ACTION&HEALTH, s.r.o.

Párovská 1184/9, 949 01 Nitra

Zápis v registri:

Okresný súd Nitra, odd. Sro, vložka č. 22199/N

Osoby oprávnené na rokovanie a konanie
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:
v technických veciach:

PaedDr. Vladimír Zlatoš, PhD., konateľ

PaedDr. Vladimír Zlatoš, PhD., konateľ

IČO:

44 105 258

IČ DPH:

SK2022606652

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK94 1100 0000 0026 2514 8709

Telefón:

0904 140 305

e - mail:

vlado@vladozlatos.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.08.2023 predložená v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy.
- 2.2 Názov stavby:
„Workoutové ihrisko“
- 2.3 Projekt stavby vypracovala spoločnosť:
CelinakHOME s.r.o., 179, Golianovo 951 58, Ing. Denis Čeliňák, stavebný inžinier

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa stavbu (ďalej len „dielo“):
„Workoutové ihrisko“
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela s prílohami vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III. bode 3.1 **do 45-tich kalendárnych dní od odovzdania staveniska**. Odovzdanie staveniska sa predpokladá v druhej polovici septembra resp. po vydaní povolenia na realizáciu stavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo jeho dohodnutú časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, projekt dočasného dopravného značenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov/vlastníkov inžinierskych sietí protokolárne najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Povolenie stavby bude zhotoviteľovi odovzdané pri odovzdaní staveniska.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri odovzdaní staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným a časovým plánom, poistný certifikát alebo kópiu poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.
- 4.6 Objednávateľ môže vydať zhotoviteľovi písomný pokyn zápisom do stavebného denníka, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti z dôvodov podľa bodu 4.7. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z dôvodov podľa bodu 4.7 sa všetky základné termíny t. j. lehota výstavby posúva o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela t. j. zhotoviteľ nie je v omeškaní. Po obdržaní písomného pokynu objednávateľa na obnovenie prác t. j. zápisom do stavebného denníka, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní práce na zhotovení diela obnoviť.
- 4.7 Dôvod na prerušenie prác na zhotovovaní diela sú:
- a) nevyhovujúce klimatické podmienky pre realizáciu technologických postupov v rámci realizácie stavby. Zhotoviteľ túto skutočnosť potvrdí predložením písomného vyjadrenia projektanta.
 - b) vznik prác navyše, ktoré vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedené práce neobsahuje ponukový rozpočet, nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii a z uvedeného dôvodu je potrebné meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy v zmysle čl. XIV bodu 14.2.
- 4.8 V prípade prerušenia prác v zmysle bodu 4.6 je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela s prílohami vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. I k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena stavby bez DPH:	31 429,76 €
DPH 20%	6 285,95 €
Celková cena vrátane DPH	37 715,71 €

(Slovom: Tridsaťsedemtisícšesťdesiatpäť eur a sedemdesiatjeden centov)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená, ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vytýčenie priestorovej polohy stavby, vytýčenie inžinierskych sietí, všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vyhotovenie podrobnejšej dokumentácie pre realizáciu diela, vyhotovenie dielenskej, konštrukčnej a výrobnjej dokumentácie, poplatkov za zhodnotenie/zneškodnenie odpadov a uloženie sutiny, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska s príslušnými stavebnými prípojkami, zabezpečenie staveniska v zmysle BOZP, tabuľu pre označenie stavby (na ktorej bude uvedené meno stavebníka, zhotoviteľa, orgánu, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia, meno a kontakt stavbyvedúceho), uzavretie poistnej zmluvy a na zabezpečenie ostatných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.

- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela:
- a) nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenaná v stavebnom denníku,
 - b) vzniknú práce navyiac musia byť vopred odsúhlasené projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenané v stavebnom denníku,
 - c) vzniknú práce menej musia byť vopred odsúhlasené projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenané v stavebnom denníku.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyiac za cenu určenú nasledovne:
- 5.8.1 v prípade položiek prác, ktoré obsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela, použije sa jednotková cena z položkovitej kalkulácie rozpočtu diela,
 - 5.8.2 v prípade položiek prác, ktoré neobsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni, položkovitej kalkulácie rozpočtu diela,
 - 5.8.3 v prípade položiek prác, ktoré neobsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.
- 5.9 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa čl. III zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo:
- a) sa podrobne oboznámil s projektovou dokumentáciou a návrhom tejto zmluvy,
 - b) v položkovitej kalkulácii rozpočtu diela zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluvy,
 - c) do položkovitej kalkulácie rozpočtu diela zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na dielo.
- 6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa (ďalej len „súpis prác“), odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa.
- 6.4 Súpis prác predloží zhotoviteľ technickému dozoru objednávateľa na odsúhlasenie a podpísanie 2 dni pred predložením faktúry v tlačenej aj v elektronickej podobe (vo formáte xlsx). K súpisu prác doloží vážne lístky s dokladom o nakladaní s odpadom v tlačenej forme a fotodokumentáciu (na online úložisku) z priebehu fakturovaných stavebných prác.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom odpadov a ich zhodnotením/zneškodnením len na základe predložených vážnych lístkov, dokladu o odovzdaní odpadu osobe oprávnenej na nakladanie s príslušným druhom odpadu, vrátane oprávnenia tejto osoby na nakladanie s týmto odpadom.
- 6.6 Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.7 V prípade zasielania faktúry e - mailom, faktúru zasielať na e - mail adresu: faktury@msupoprad.sk.

- 6.8 Zhotoviteľovi bude z predloženej faktúry zadržaných 10% z fakturovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní. Podkladom pre uvoľnenie zádržného bude objednávateľom a zhotoviteľom podpísaný Súhrnný protokol o odstránení väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.
- 6.9 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.10 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená podmienka z bodu 6.8 tejto zmluvy.
- 6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry. Faktúra musí byť vystavená v zmysle platných právnych predpisov **v dvoch originálnych vyhotoveniach** pre objednávateľa a musí obsahovať aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. Prílohou faktúry musí byť súpis prác s vyčíslením ich hodnoty odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa a/alebo potvrdený objednávateľom.
- 6.12 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.13 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.14 Objednávateľ prehlasuje, že na dielo sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Poprad.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré dielo bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle tohto článku do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie práca, z ktorej nevyplýva finančné plnenie, sama o sebe ani v spojení s inými nebráni plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), avšak jej realizácia je potrebná ku konečnému kompletnému rozsahu a obsahu vyhotovenia diela v požadovanej kvalite v zmysle projektovej dokumentácie. Nedorobkom nie je práca/položka/stavebný objekt z položkovitej kalkulácie rozpočtu diela nerealizovaný ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.11 Havarijné stavy t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, povolenie stavby, projekt dočasného dopravného značenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov/vlastníkov inžinierskych sietí a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby odbornou spôsobilou osobou na vlastné náklady. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, tieto práce obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará objednávateľ.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste označiť dielo (stavenisko) tabuľou pre označenie stavby (na ktorej bude uvedený stavebník, zhotoviteľ, orgán, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia, meno a kontakt stavbyvedúceho) bezprostredne po prevzatí staveniska.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plniť povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, STN, podmienok povolenia stavby, vydaných povolení, stanovísk a vyjadrení k realizácii diela a podmienky zodpovedného projektanta uvedené v projektovej dokumentácii.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.16 Objednávateľ poskytne súčinnosť zhotoviteľovi pri zabezpečení napojenia sa na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.17 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre povolenie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.19 Ak sa technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
 - k vytýčovaniu stavby,
 - na prevzatie výkopových prác,
 - na kontrolu zakladania,
 - na kontrolu vykonania miery zhutnenia pláne ak je predpísaná projektom a predložiť atest o zhutnení pláne,

- ku kontrole vykonania podkladových vrstiev a pred kladením konečnej povrchovej úpravy,
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 1 pracovný deň vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa čl. IX bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
 - 8.22 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 - 8.23 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 - 8.24 Technický dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovávania.
 - 8.25 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.
 - 8.26 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a koordinátora dokumentácie v zmysle právnych predpisov.
 - 8.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela prebrať na seba a plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, ktorým je Mesto Poprad v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a to okrem iného zabezpečovať označovanie a triedenie vznikajúcich odpadov podľa druhov a zhromažďovať ich tak, aby nedochádzalo k ich nežiadúcim únikom. Zarádovať odpady v zmysle platného Katalógu odpadov, viesť evidenciu o vznikajúcich odpadoch, odovzdávať odpady za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia výlučne osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.
 - 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“).
 - 8.29 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
 - 8.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy pomocou činnosti stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí odbornými a profesionálnymi znalosťami zaručovať riadne a včasné splnenie svojich povinností.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol počas zhotovovania diela, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude mailom oznámený minimálne 2 pracovné dni vopred, pokiaľ sa zhotoviteľ s objednávateľom nedohodnú inak (napr. pri odovzdaní staveniska, zápisom v stavebnom denníku a pod.)
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 2 pracovné dni vopred.

- 9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávatel'om preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.8 Dielo bude zhotoviteľ'om odovzdané a objednávatel'om prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.9 Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávatel'a.
- 9.10 Zhotoviteľ' odovzdá objednávatel'ovi k odovzdaniu a prevzatiu diela nasledovné doklady nevyhnutné k užívaniu stavby v rozsahu podľa účelu stavby, minimálne v dvoch vyhotoveniach a to najmä:
- 9.10.1 *Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)*
 - 9.10.2 *Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.*
 - 9.10.3 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľ'om.*
 - 9.10.4 *Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od povolenia stavby, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľ'om, zapísané a odsúhlasené technickým dozomom objednávatel'a v stavebnom denníku.*
 - 9.10.5 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).*
 - 9.10.6 *Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.*
 - 9.10.7 *Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom.*
 - 9.10.8 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.*
 - 9.10.9 *Doklad o zhodnotení/zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu – súpis v rozsahu: názov odpadu, druh, katalógové číslo a množstvo odpadu).*
 - 9.10.10 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
 - 9.10.11 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok*

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ' odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3 Ak objednávatel' neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bode 6.9 a 6.10, zaplatí zhotoviteľ'om vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Ak zhotoviteľ' nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.5 Ak zhotoviteľ' neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.6 Zhotoviteľ' zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry.
- 10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ' sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:
 - 12.2.1 neprevzatie staveniska v zmysle čl. IV ods. 4.1.,
 - 12.2.2 nepredloženie poistného certifikátu alebo kópie poistnej zmluvy v zmysle čl. IV ods. 4.5,
 - 12.2.3 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska,
 - 12.2.4 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
 - 12.2.5 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.23),
 - 12.2.6 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,
 - 12.2.7 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
 - 12.3.1 proti zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
 - 12.3.2 zhotoviteľ vstúpil do likvidácie
 - 12.3.3 zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 ZVO, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 14.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.

- 14.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela s prílohami, vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy
- 14.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

V Poprade dňa

V dňa

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za zhotoviteľa: ACTION&HEALTH, s.r.o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
PaedDr. Vladimír Zlatoš, PhD.
konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 375
Stavba: Workoutové ihrisko

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.8.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
výberovým konaním

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Bielik

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	31 429,76
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	31 429,76
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 429,76	6 285,95

Cena s DPH	v	EUR	37 715,71
------------	---	-----	-----------

POZNÁMKA:

Všetky materiály alebo výrobky použité vo vypracovanej PD je možné nahradiť vhodnejším ekvivalentom s lepšími alebo rovnakými vlastnosťami.

Zámena nesmie spôsobiť zníženie kvality stavby !

Výber je nutné konzultovať s projektantom stavby !

Podrobný opis ocelovej konštrukcie z položky č.26 bude riešený v samostatnom dokumente, ktorý bude prílohou k vypracovanému rozpočtu !

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 375

Stavba: Workoutové ihrisko

Miesto:

Dátum: #####

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant:

Zhotoviteľ: výberovým konaním

Spracovateľ: Ing. Bielik

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		31 429,76	37 715,71
01B	Workoutové ihrisko	31 429,76	37 715,71
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		31 429,76	37 715,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Workoutové ihrisko

Objekt: Workoutové ihrisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Bielik

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.08.2023

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				31 429,76
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				31 429,76
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 429,76	6 285,95

Cena s DPH	v EUR	37 715,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Workoutové ihrisko

Objekt: Workoutové ihrisko

Miesto:

Dátum:

25.08.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad
Zhotoviteľ: výberovým konaním

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Bielík

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

31 429,76

HSV - Práce a dodávky HSV

31 429,76

1 - Zemné práce

3 317,66

2 - Zakladanie - príprava podkladu

2 924,21

5 - Komunikácie

2 439,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 193,10

99 - Presun hmôt HSV

1 555,30

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 429,76

ROZPOČET

Stavba: Workoutové ihrisko

Objekt: Workoutové ihrisko

Miesto:

Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad
Zhotoviteľ: výberovým konaním

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Bielik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 429,760

HSV - Práce a dodávky HSV

31 429,760

1 - Zemné práce

3 317,657

1	K	121101111	Odstránenie ornice s voďor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,518	15,870	357,361
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 (HTU)	m3	15,012	15,870	238,240
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,500	75,000	337,500
4	K	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,500	11,230	50,535
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	37,530	3,650	136,985
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3 000 m	m3	37,530	3,650	136,985
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	450,360	1,650	743,094
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,530	2,750	103,208
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,000	19,500	955,500
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,800	97,500	175,500
11	K	174101001a	Štrkové lôžko pod základy	m3	0,500	165,500	82,750

2 - Zakladanie - príprava podkladu

2 924,215

12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	145,120	2,450	355,544
13	K	271573001S1	Drenážna vrstva zo štrkopiesku fr.8 - 16 mm - hr. 100	m3	14,512	53,720	779,585
14	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,000	287,120	1 148,480
15	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	145,120	0,950	137,864
16	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	162,534	1,860	302,313
17	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - pod základy	m3	0,500	112,350	56,175
18	M	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	0,869	166,000	144,254

5 - Komunikácie

2 439,491

19	K	564721111	Podklad alebo kryt z kameniva triedené riečne kamenivo frakcie 4 až 8 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 80 mm	m3	12,010	50,000	600,500
20	K	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva triedené riečne kamenivo frakcie 4 až 8 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	27,022	35,000	945,770
21	K	564801112	Podklad alebo kryt z kameniva triedené riečne kamenivo frakcie 4 až 8 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 40 mm	m2	6,005	35,000	210,175
22	K	566501111S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva triedené riečne kamenivo frakcie 4 až 8 mm v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	150,120	4,550	683,046

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 193,103


23	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	49,400	9,450	466,830
24	M	5921745000	Obrubník betónový parkový sivý 100 x 20 x 5 cm	ks	49,894	6,860	342,273
25	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	0,000	0,000	0,000
26			Oceľová konštrukcia MOVO gymstructure 1.0 (cena zahŕňa kompletnú výrobu konštrukcie, montáž, dodávku a dopravu celej konštrukcie priamo na stavbu. V cene je zahrnutá aj edukačná tabuľa s video návodmi, ako danú konštrukciu používať, typový certifikát od autorizovaného úradu (TUV)).	ks	1,000	17 600,000	17 600,000
27			Informačná tabuľa	ks	2,000	495,000	990,000
28			Montáž Informačnej tabule	ks	2,000	250,000	500,000
29			Kovový odpadkový kôš, objem 65 l.	ks	1,000	229,000	229,000
30			Parková lavička na sedenie (šírka 360 mm, výška 420 mm, dĺžka 1 800 mm)	ks	1,000	450,000	450,000
31			Montáž a doprava kovový odpadkový kôš, objem 65 l.	ks	1,000	90,000	90,000
32			Montáž a doprava parková lavička na sedenie (šírka 360 mm, výška 420 mm, dĺžka 1 800 mm).	ks	1,000	300,000	300,000
33	K	9529014115	Výčistenie ostatných objektov	m2	150,000	1,500	225,000

99 - Presun hmôt HSV

1 555,295

34	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	88,874	17,500	1 555,295
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

MOVO park - modul 1 (konštrukcia)

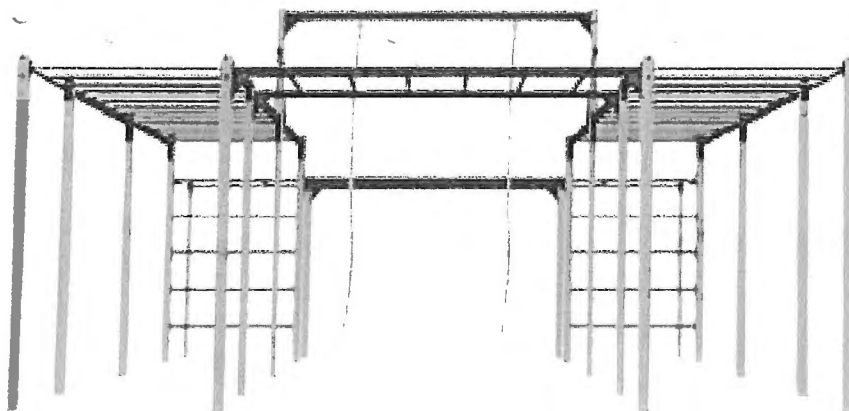

V cene je zahrnuté:

- (1) vstupné **konzultácie** k realizácii projektu
- (2) projektová **dokumentácia** (komplexné podklady pre architekta)
- (3) **výroba, doprava a montáž** konštrukcie
- (4) typový **certifikát** od autorizovaného úradu (TÜV)
- (5) tlačaná **dokumentácia** k projektu, certifikáty, manuál, tabuľa o používaní
- (6) **edukačná** tabuľa (3x2m) s video návodmi, ako konštrukciu používať
- (7) 24 párov certifikovaných **kruhov** spolu s opratami (+ ich inštalácia)
- (8) 2x certifikované **lano** na šplhanie (+ inštalácia)
- (9) vstupná odborná **inštrukcia o používaní zariadenia**
- (10) video **reportáž** z realizácie projektu

*V cene **nie sú zahrnuté** náhradné diely, servis MOVO parku, či stavebné práce.*


PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.
vlado@vladozlatos.com
+421 904 140 305
park.movo.sk

(1) vstupné **konzultácie** k realizácii projektu

- obhliadka priestorov a optimálny návrh rozloženia modulov
- prihliadnutie na priestorové a ekonomické možnosti subjektu

(2) projektová **dokumentácia** (komplexné podklady pre architekta)

- komplexná výkresová dokumentácia ku každému modulu
- výkazy a výmery + cenová ponuka stavebných prác



(3) **výroba, doprava a montáž** konštrukcie

- autorizovaná montáž konštrukcie
- poskytujeme stavebné podklady

(4) typový **certifikát** od autorizovaného úradu (TÜV)

- TÜV certifikáty na zostavu a dopadové plochy
- v súlade s STN EN 1176-1 a STN EN 16630
- atesty kruhov a konštrukčnej ocele, statika posudok




(5) tlačaná **dokumentácia** k projektu, certifikáty, manuál, tabuľa o používaní

- všetky potrebné dokumenty vytlačené a zviazané
- zakladač pre prípadnú kontrolu či evidenciu poznatkov o projekte

(6) **edukačná** tabuľa (3x2m) s video návodmi, ako konštrukciu používať

- 3x2 metre veľká edukačná tabuľa s video návodmi
- malá legislatívna tabuľka o správnej používaní



(7) 24 párov certifikovaných **kruhov** spolu s opratmi

- osadenie kruhov priamo do konštrukcie pri montáži
- kruhy aj opraty sú do konštrukcie zaskrutkované

(8) 2x certifikované **lano** na šplhanie (+ inštalácia)

- osadenie certifikovaných lán do konštrukcie pri montáži
- laná sú do konštrukcie zaskrutkované

(9) vstupná odborná **inštrukcia o používaní zariadenia**

- 1x školenie pre športových odborníkov, trénerov, inštruktorov a pedagógov
- informácie ako správne a bezpečne používať konštrukciu a naučiť deti nové pohyby

(10) video **reportáž** z realizácie projektu

- 1x záverečná video reportáž o spolupráci a projekte
- video umiestnené a propagované na sociálnych sieťach





Konštrukcia **MOVO** gymstructure

určená k **športu na školách** pre **výživný** pohyb detí a mládeže

modul 1




MOVO[®] gymstructure

PaedDr. Vlado **Zlatoš**, PhD.

1. Základné informácie


- **typové označenie:** MOVO *gymstructure* V2
- **tvorca a výrobca** projektu: PaedDr. Vlado **Zlatoš**, PhD.
 - **kontakt:** 0904 140 305
 - ACTION&HEALTH,s.r.o.
 - Párovská 9, 949 01 Nitra
 - IČO: 44105258
- **dodávateľ** projektu:
 - FITRON s.r.o., IČO: 48 035 076
 - Drevárska 2, Spišská Nová Ves 052 01
 - Ondrej **Slivko**: 0915 314 010

2. Umiestnenie zostavy



Zostava ihriska, dopadové plochy a umiestnenie konštrukcie je v súlade s

STN EN 1176-1
a STN EN 16630



3. Zloženie zostavy



- 14x stojka 80x80 / celková výška 2515 mm (cvičebná výška / os hrazdy 2120 mm)
- 4x stojka 80x80 / celková výška 2115 mm (cvičebná výška / os hrazdy 1720 mm)
- 2x stojka 80x80 / výška 3515 mm (cvičebná výška / os hrazdy 3000 mm)
- 10x segment na rúčkovanie
 - 4x segment s dĺžkou 2,5m
 - 2x segment s dĺžkou 3m
 - 4x rebríkový segment 1,36m
- 16x hrazda Ø 34 mm (rozostup hrázdi 428 mm)
- 10x betónové pätky 500x500x800 mm
- zostava umiestnená v 300 mm štrkovom bazéne
- **extra inštalované prvky:**
 - 24 párov plastových gymnastických kruhov:
 - Hrúbka: 28mm
 - Vnútorný priemer: 175mm
 - Vonkajší priemer 235mm
 - Materiál: ABS plast
 - 2x lano na šplhanie Ø 35 mm (koniec lana od zeme: 400 mm)

Dátum spracovania dokumentácie: **5/2022**

4.

Základný opis zariadenia

- zostava MOVO **gymstructure** V2 je cvičebná konštrukcia určená na **všestranný rozvoj fyzickej zdatnosti** detí od veku 6 rokov
- konštrukcia umožňuje nácvik **základných pohybových vzorov** ako je visenie, rúčkovanie, zhyby, šplhanie a ďalšie **všestranné** pohybové zručnosti
- konštrukcia je primárne určená ako **pomôcka na telesnú výchovu** detí, ale aj voľnočasové pohybové aktivity **sprevádzané dozorujúcou** dospelou osobou (učiteľka, telocvikár, tréneri, iní)
- **celkové rozmery zostavy**: 5956 x 8096 mm, výška 3515 mm
- pre zvýšenú bezpečnosť je konštrukcia umiestnená v **300 mm** hlbokom **štrkovom** bazéne

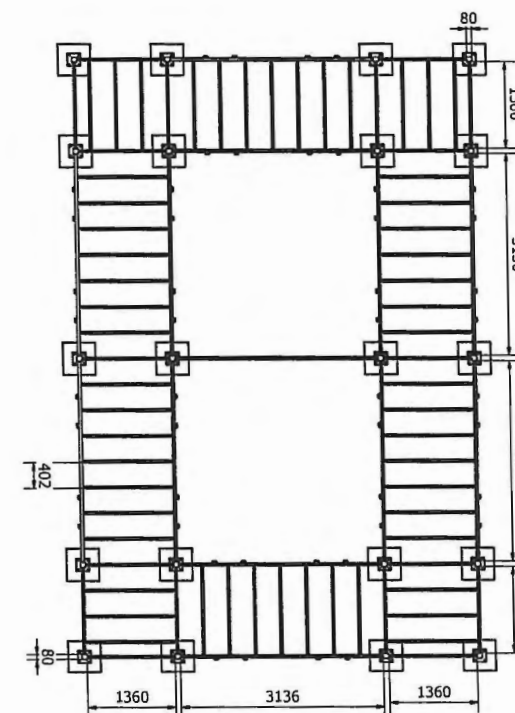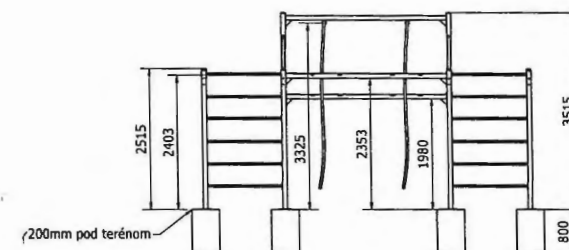

5.

Doklady vydané k zariadeniu

- | | |
|--|---|
| • A) inšpekčný certifikát od TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | • F) doklad o odbornej spôsobilosti zvärača |
| • B) statický posudok | • F) doklad o nezávadnosti použitých povrchových náterov |
| • C) Atest kruhov a opratov | • H) štítok umiestnený na konštrukcii |
| • D) Atest konštrukčnej ocele | • I) prílohy k dokladu o nezávadnosti použitých povrchových náterov* |
| • E) certifikáty o použitých spojovacích materiáloch | |

A) odovzdávací **protokol**
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

B) **statický** posudok

C) **Atest** zát'ažového testu
kruhov s opratmi

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFIKAAT ♦ CERTIFIKÁT

Slovensko
Slovakia

CERTIFIKÁT TYPU

evidenčné číslo 004/22/13/02/PLZ

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán výrobcov
vydaný výrobcom

ACTION&HEALT, s.r.o.

Párováká 9

949 01 Nitra

na výrobok:

Názov:

Konštrukcia na cvičenie MOVO gymstructure

Typ:

movo_V2 gymstructure

Modifikácia:

modul č. 1

Výrobca:

ACTION&HEALT, s.r.o., Párováká 9, 949 01 Nitra

Miesto výroby:

FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
a miesto inštalácie

u ktorého bola vykonaná certifikácia podľa schémy 1a, ktorej výsledky sú uvedené
v Správe o hodnotení evidenčné číslo 7165039821/20/22/ZI/SHP/LZ za dňa
28.05.2022.

Výššie uvedený typ výrobku spĺňa aplikovateľné požiadavky nasledujúcich noriem,
ktoré boli základom pre jeho hodnotenie:

STN EN 1176-1:2019, STN EN 1176-7:2021, STN EN 16630:2019

Tento certifikát platí od 27.05.2022 do: 26.05.2027

Podrobnosti a podmienky platnosti sú uvedené v prílohe tohto certifikátu, ktorá tvorí
jeho neoddeliteľnú súčasť a obsahuje 2 strany

V Bratislave, dňa 27. mája 2022

Ing. Peter Bústak
za certifikačný orgán

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jaskova 6, 821 03 Bratislava

FOU 616/140

Mastat s.r.o.

Príprava a realizácia projektov a statická výstavba nových a existujúcich statických zariadení, odborná poradená služba
Právnická osoba z.č. 34, 032 01 Spilná Nová Ves, Slovensko, tel. Jurský Marko 09-08 523 313

[illegible][illegible]

D) **Atesty** použitej konštrukčnej ocele

[illegible][illegible][illegible]

352 214 655 METAL TRADE COM. **U.S.**
 1947-1948
 1949-1950
 1951-1952
 1953-1954
 1955-1956
 1957-1958
 1959-1960
 1961-1962
 1963-1964
 1965-1966
 1967-1968
 1969-1970
 1971-1972
 1973-1974
 1975-1976
 1977-1978
 1979-1980
 1981-1982
 1983-1984
 1985-1986
 1987-1988
 1989-1990
 1991-1992
 1993-1994
 1995-1996
 1997-1998
 1999-2000
 2001-2002
 2003-2004
 2005-2006
 2007-2008
 2009-2010
 2011-2012
 2013-2014
 2015-2016
 2017-2018
 2019-2020
 2021-2022
 2023-2024
 2025-2026
 2027-2028
 2029-2030
 2031-2032
 2033-2034
 2035-2036
 2037-2038
 2039-2040
 2041-2042
 2043-2044
 2045-2046
 2047-2048
 2049-2050
 2051-2052
 2053-2054
 2055-2056
 2057-2058
 2059-2060
 2061-2062
 2063-2064
 2065-2066
 2067-2068
 2069-2070
 2071-2072
 2073-2074
 2075-2076
 2077-2078
 2079-2080
 2081-2082
 2083-2084
 2085-2086
 2087-2088
 2089-2090
 2091-2092
 2093-2094
 2095-2096
 2097-2098
 2099-2100
 2101-2102
 2103-2104
 2105-2106
 2107-2108
 2109-2110
 2111-2112
 2113-2114
 2115-2116
 2117-2118
 2119-2120
 2121-2122
 2123-2124
 2125-2126
 2127-2128
 2129-2130
 2131-2132
 2133-2134
 2135-2136
 2137-2138
 2139-2140
 2141-2142
 2143-2144
 2145-2146
 2147-2148
 2149-2150
 2151-2152
 2153-2154
 2155-2156
 2157-2158
 2159-2160
 2161-2162
 2163-2164
 2165-2166
 2167-2168
 2169-2170
 2171-2172
 2173-2174
 2175-2176
 2177-2178
 2179-2180
 2181-2182
 2183-2184
 2185-2186
 2187-2188
 2189-2190
 2191-2192
 2193-2194
 2195-2196
 2197-2198
 2199-2200
 2201-2202
 2203-2204
 2205-2206
 2207-2208
 2209-2210
 2211-2212
 2213-2214
 2215-2216
 2217-2218
 2219-2220
 2221-2222
 2223-2224
 2225-2226
 2227-2228
 2229-2230
 2231-2232
 2233-2234
 2235-2236
 2237-2238
 2239-2240
 2241-2242
 2243-2244
 2245-2246
 2247-2248
 2249-2250
 2251-2252
 2253-2254
 2255-2256
 2257-2258
 2259-2260
 2261-2262
 2263-2264
 2265-2266
 2267-2268
 2269-2270
 2271-2272
 2273-2274
 2275-2276
 2277-2278
 2279-2280
 2281-2282
 2283-2284
 2285-2286
 2287-2288
 2289-2290
 2291-2292
 2293-2294
 2295-2296
 2297-2298
 2299-2300
 2301-2302
 2303-2304
 2305-2306
 2307-2308
 2309-2310
 2311-2312
 2313-2314
 2315-2316
 2317-2318
 2319-2320
 2321-2322
 2323-2324
 2325-2326
 2327-2328
 2329-2330
 2331-2332
 2333-2334
 2335-2336
 2337-2338
 2339-2340
 2341-2342
 2343-2344
 2345-2346
 2347-2348
 2349-2350
 2351-2352
 2353-2354
 2355-2356
 2357-2358
 2359-2360
 2361-2362
 2363-2364
 2365-2366
 2367-2368
 2369-2370
 2371-2372
 2373-2374
 2375-2376
 2377-2378
 2379-2380
 2381-2382
 2383-2384
 2385-2386
 2387-2388
 2389-2390
 2391-2392
 2393-2394
 2395-2396
 2397-2398
 2399-2400
 2401-2402
 2403-2404
 2405-2406
 2407-2408
 2409-2410
 2411-2412
 2413-2414
 2415-2416
 2417-2418
 2419-2420
 2421-2422
 2423-2424
 2425-2426
 2427-2428
 2429-2430
 2431-2432
 2433-2434
 2435-2436
 2437-2438
 2439-2440
 2441-2442
 2443-2444
 2445-2446
 2447-2448
 2449-2450
 2451-2452
 2453-2454
 2455-2456
 2457-2458
 2459-2460
 2461-2462
 2463-2464
 2465-2466
 2467-2468
 2469-2470
 2471-2472
 2473-2474
 2475-2476
 2477-2478
 2479-2480
 2481-2482
 2483-2484
 2485-2486
 2487-2488
 2489-2490
 2491-2492
 2493-2494
 2495-2496
 2497-2498
 2499-2500
 2501-2502
 2503-2504
 2505-2506
 2507-2508
 2509-2510
 2511-2512
 2513-2514
 2515-2516
 2517-2518
 2519-2520
 2521-2522
 2523-2524
 2525-2526
 25

E) **Certifikáty** o použitých spojovacích materiáloch

[illegible][illegible][illegible]


F) doklad o odbornej spôsobilosti **zvárača**



G) doklad o **nezávadnosti** použitých povrchových náterov



H) Štítok umiestnený na konštrukcii

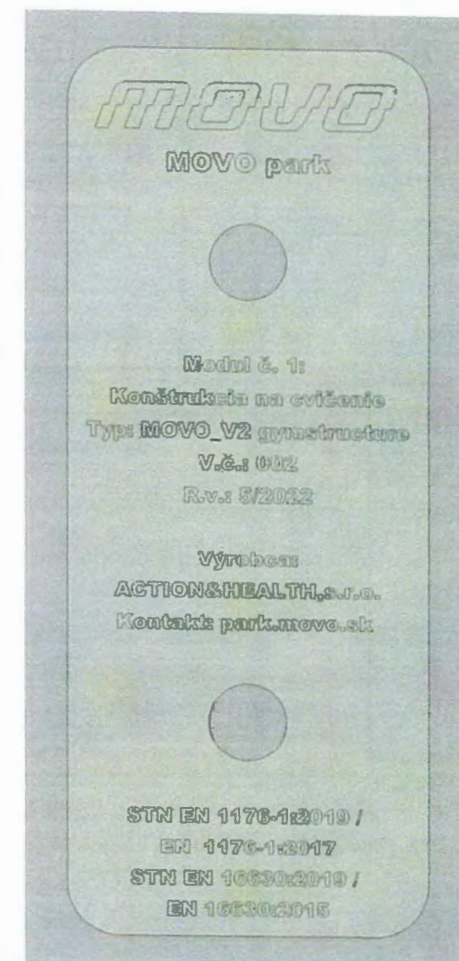

1) Prílohy k dokladu o **nezávadnosti** použitých povrchových náterov*

[illegible]

1. NAME _____ 2. ADDRESS _____ 3. CITY _____ 4. STATE _____ 5. ZIP _____		6. DATE _____ 7. TIME _____ 8. PLACE _____	
9. REASON FOR CALL _____ 10. REASON FOR CALL _____ 11. REASON FOR CALL _____ 12. REASON FOR CALL _____ 13. REASON FOR CALL _____ 14. REASON FOR CALL _____ 15. REASON FOR CALL _____ 16. REASON FOR CALL _____ 17. REASON FOR CALL _____ 18. REASON FOR CALL _____ 19. REASON FOR CALL _____ 20. REASON FOR CALL _____ 21. REASON FOR CALL _____ 22. REASON FOR CALL _____ 23. REASON FOR CALL _____ 24. REASON FOR CALL _____ 25. REASON FOR CALL _____ 26. REASON FOR CALL _____ 27. REASON FOR CALL _____ 28. REASON FOR CALL _____ 29. REASON FOR CALL _____ 30. REASON FOR CALL _____ 31. REASON FOR CALL _____ 32. REASON FOR CALL _____ 33. REASON FOR CALL _____ 34. REASON FOR CALL _____ 35. REASON FOR CALL _____ 36. REASON FOR CALL _____ 37. REASON FOR CALL _____ 38. REASON FOR CALL _____ 39. REASON FOR CALL _____ 40. REASON FOR CALL _____ 41. REASON FOR CALL _____ 42. REASON FOR CALL _____ 43. REASON FOR CALL _____ 44. REASON FOR CALL _____ 45. REASON FOR CALL _____ 46. REASON FOR CALL _____ 47. REASON FOR CALL _____ 48. REASON FOR CALL _____ 49. REASON FOR CALL _____ 50. REASON FOR CALL _____ 51. REASON FOR CALL _____ 52. REASON FOR CALL _____ 53. REASON FOR CALL _____ 54. REASON FOR CALL _____ 55. REASON FOR CALL _____ 56. REASON FOR CALL _____ 57. REASON FOR CALL _____ 58. REASON FOR CALL _____ 59. REASON FOR CALL _____ 60. REASON FOR CALL _____ 61. REASON FOR CALL _____ 62. REASON FOR CALL _____ 63. REASON FOR CALL _____ 64. REASON FOR CALL _____ 65. REASON FOR CALL _____ 66. REASON FOR CALL _____ 67. REASON FOR CALL _____ 68. REASON FOR CALL _____ 69. REASON FOR CALL _____ 70. REASON FOR CALL _____ 71. REASON FOR CALL _____ 72. REASON FOR CALL _____ 73. REASON FOR CALL _____ 74. REASON FOR CALL _____ 75. REASON FOR CALL _____ 76. REASON FOR CALL _____ 77. REASON FOR CALL _____ 78. REASON FOR CALL _____ 79. REASON FOR CALL _____ 80. REASON FOR CALL _____ 81. REASON FOR CALL _____ 82. REASON FOR CALL _____ 83. REASON FOR CALL _____ 84. REASON FOR CALL _____ 85. REASON FOR CALL _____ 86. REASON FOR CALL _____ 87. REASON FOR CALL _____ 88. REASON FOR CALL _____ 89. REASON FOR CALL _____ 90. REASON FOR CALL _____ 91. REASON FOR CALL _____ 92. REASON FOR CALL _____ 93. REASON FOR CALL _____ 94. REASON FOR CALL _____ 95. REASON FOR CALL _____ 96. REASON FOR CALL _____ 97. REASON FOR CALL _____ 98. REASON FOR CALL _____ 99. REASON FOR CALL _____ 100. REASON FOR CALL _____			

1. <u>NAME</u>	2. <u>ADDRESS</u>	3. <u>CITY</u>	4. <u>STATE</u>	5. <u>ZIP</u>
6. <u>NAME OF THE COMPANY OR INSTITUTION</u> 7. <u>ADDRESS</u> 8. <u>CITY</u> 9. <u>STATE</u> 10. <u>ZIP</u>				
11. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 12. <u>ADDRESS</u> 13. <u>CITY</u> 14. <u>STATE</u> 15. <u>ZIP</u>				
16. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 17. <u>ADDRESS</u> 18. <u>CITY</u> 19. <u>STATE</u> 20. <u>ZIP</u>				
21. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 22. <u>ADDRESS</u> 23. <u>CITY</u> 24. <u>STATE</u> 25. <u>ZIP</u>				
26. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 27. <u>ADDRESS</u> 28. <u>CITY</u> 29. <u>STATE</u> 30. <u>ZIP</u>				
31. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 32. <u>ADDRESS</u> 33. <u>CITY</u> 34. <u>STATE</u> 35. <u>ZIP</u>				
36. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 37. <u>ADDRESS</u> 38. <u>CITY</u> 39. <u>STATE</u> 40. <u>ZIP</u>				
41. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 42. <u>ADDRESS</u> 43. <u>CITY</u> 44. <u>STATE</u> 45. <u>ZIP</u>				
46. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 47. <u>ADDRESS</u> 48. <u>CITY</u> 49. <u>STATE</u> 50. <u>ZIP</u>				
51. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 52. <u>ADDRESS</u> 53. <u>CITY</u> 54. <u>STATE</u> 55. <u>ZIP</u>				
56. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 57. <u>ADDRESS</u> 58. <u>CITY</u> 59. <u>STATE</u> 60. <u>ZIP</u>				
61. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 62. <u>ADDRESS</u> 63. <u>CITY</u> 64. <u>STATE</u> 65. <u>ZIP</u>				
66. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 67. <u>ADDRESS</u> 68. <u>CITY</u> 69. <u>STATE</u> 70. <u>ZIP</u>				
71. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 72. <u>ADDRESS</u> 73. <u>CITY</u> 74. <u>STATE</u> 75. <u>ZIP</u>				
76. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 77. <u>ADDRESS</u> 78. <u>CITY</u> 79. <u>STATE</u> 80. <u>ZIP</u>				
81. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 82. <u>ADDRESS</u> 83. <u>CITY</u> 84. <u>STATE</u> 85. <u>ZIP</u>				
86. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 87. <u>ADDRESS</u> 88. <u>CITY</u> 89. <u>STATE</u> 90. <u>ZIP</u>				
91. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 92. <u>ADDRESS</u> 93. <u>CITY</u> 94. <u>STATE</u> 95. <u>ZIP</u>				
96. <u>NAME OF THE PERSON TO WHOM THE ORDER IS TO BE SENT</u> 97. <u>ADDRESS</u> 98. <u>CITY</u> 99. <u>STATE</u> 100. <u>ZIP</u>				

[illegible][illegible]

1. NAME _____ 2. ADDRESS _____ 3. CITY _____		4. DATE _____ 5. TIME _____	
6. REASON FOR VISIT _____			
7. REASON FOR VISIT _____			
8. REASON FOR VISIT _____			
9. REASON FOR VISIT _____			
10. REASON FOR VISIT _____			
11. REASON FOR VISIT _____			
12. REASON FOR VISIT _____			
13. REASON FOR VISIT _____			
14. REASON FOR VISIT _____			
15. REASON FOR VISIT _____			
16. REASON FOR VISIT _____			
17. REASON FOR VISIT _____			
18. REASON FOR VISIT _____			
19. REASON FOR VISIT _____			
20. REASON FOR VISIT _____			
21. REASON FOR VISIT _____			
22. REASON FOR VISIT _____			
23. REASON FOR VISIT _____			
24. REASON FOR VISIT _____			
25. REASON FOR VISIT _____			
26. REASON FOR VISIT _____			
27. REASON FOR VISIT _____			
28. REASON FOR VISIT _____			
29. REASON FOR VISIT _____			
30. REASON FOR VISIT _____			
31. REASON FOR VISIT _____			
32. REASON FOR VISIT _____			
33. REASON FOR VISIT _____			
34. REASON FOR VISIT _____			
35. REASON FOR VISIT _____			
36. REASON FOR VISIT _____			
37. REASON FOR VISIT _____			
38. REASON FOR VISIT _____			
39. REASON FOR VISIT _____			
40. REASON FOR VISIT _____			
41. REASON FOR VISIT _____			
42. REASON FOR VISIT _____			
43. REASON FOR VISIT _____			
44. REASON FOR VISIT _____			
45. REASON FOR VISIT _____			
46. REASON FOR VISIT _____			
47. REASON FOR VISIT _____			
48. REASON FOR VISIT _____			
49. REASON FOR VISIT _____			
50. REASON FOR VISIT _____			
51. REASON FOR VISIT _____			
52. REASON FOR VISIT _____			
53. REASON FOR VISIT _____			
54. REASON FOR VISIT _____			
55. REASON FOR VISIT _____			
56. REASON FOR VISIT _____			
57. REASON FOR VISIT _____			
58. REASON FOR VISIT _____			
59. REASON FOR VISIT _____			
60. REASON FOR VISIT _____			
61. REASON FOR VISIT _____			
62. REASON FOR VISIT _____			
63. REASON FOR VISIT _____			
64. REASON FOR VISIT _____			
65. REASON FOR VISIT _____			
66. REASON FOR VISIT _____			
67. REASON FOR VISIT _____			
68. REASON FOR VISIT _____			
69. REASON FOR VISIT _____			
70. REASON FOR VISIT _____			
71. REASON FOR VISIT _____			
72. REASON FOR VISIT _____			
73. REASON FOR VISIT _____			
74. REASON FOR VISIT _____			
75. REASON FOR VISIT _____			
76. REASON FOR VISIT _____			
77. REASON FOR VISIT _____			
78. REASON FOR VISIT _____			
79. REASON FOR VISIT _____			
80. REASON FOR VISIT _____			
81. REASON FOR VISIT _____			
82. REASON FOR VISIT _____			
83. REASON FOR VISIT _____			
84. REASON FOR VISIT _____			
85. REASON FOR VISIT _____			
86. REASON FOR VISIT _____			
87. REASON FOR VISIT _____			
88. REASON FOR VISIT _____			
89. REASON FOR VISIT _____			
90. REASON FOR VISIT _____			
91. REASON FOR VISIT _____			
92. REASON FOR VISIT _____			
93. REASON FOR VISIT _____			
94. REASON FOR VISIT _____			
95. REASON FOR VISIT _____			
96. REASON FOR VISIT _____			
97. REASON FOR VISIT _____			
98. REASON FOR VISIT _____			
99. REASON FOR VISIT _____			
100. REASON FOR VISIT _____			

[illegible][illegible]

8. <u>NAME</u> _____ 9. <u>ADDRESS</u> _____ 10. <u>TELEPHONE</u> _____	11. <u>DATE</u> _____ 12. <u>TIME</u> _____ 13. <u>LOCATION</u> _____ 14. <u>WIND</u> _____ 15. <u>WAVE</u> _____ 16. <u>SEA</u> _____ 17. <u>SKY</u> _____ 18. <u>TEMP</u> _____ 19. <u>MOON</u> _____ 20. <u>STARS</u> _____ 21. <u>PLANETS</u> _____ 22. <u>COMET</u> _____ 23. <u>SHOOTING STAR</u> _____ 24. <u>OTHER</u> _____	25. <u>REMARKS</u> _____ 26. <u>REMARKS</u> _____ 27. <u>REMARKS</u> _____ 28. <u>REMARKS</u> _____ 29. <u>REMARKS</u> _____ 30. <u>REMARKS</u> _____ 31. <u>REMARKS</u> _____ 32. <u>REMARKS</u> _____ 33. <u>REMARKS</u> _____ 34. <u>REMARKS</u> _____ 35. <u>REMARKS</u> _____ 36. <u>REMARKS</u> _____ 37. <u>REMARKS</u> _____ 38. <u>REMARKS</u> _____ 39. <u>REMARKS</u> _____ 40. <u>REMARKS</u> _____ 41. <u>REMARKS</u> _____ 42. <u>REMARKS</u> _____ 43. <u>REMARKS</u> _____ 44. <u>REMARKS</u> _____ 45. <u>REMARKS</u> _____ 46. <u>REMARKS</u> _____ 47. <u>REMARKS</u> _____ 48. <u>REMARKS</u> _____ 49. <u>REMARKS</u> _____ 50. <u>REMARKS</u> _____ 51. <u>REMARKS</u> _____ 52. <u>REMARKS</u> _____ 53. <u>REMARKS</u> _____ 54. <u>REMARKS</u> _____ 55. <u>REMARKS</u> _____ 56. <u>REMARKS</u> _____ 57. <u>REMARKS</u> _____ 58. <u>REMARKS</u> _____ 59. <u>REMARKS</u> _____ 60. <u>REMARKS</u> _____ 61. <u>REMARKS</u> _____ 62. <u>REMARKS</u> _____ 63. <u>REMARKS</u> _____ 64. <u>REMARKS</u> _____ 65. <u>REMARKS</u> _____ 66. <u>REMARKS</u> _____ 67. <u>REMARKS</u> _____ 68. <u>REMARKS</u> _____ 69. <u>REMARKS</u> _____ 70. <u>REMARKS</u> _____ 71. <u>REMARKS</u> _____ 72. <u>REMARKS</u> _____ 73. <u>REMARKS</u> _____ 74. <u>REMARKS</u> _____ 75. <u>REMARKS</u> _____ 76. <u>REMARKS</u> _____ 77. <u>REMARKS</u> _____ 78. <u>REMARKS</u> _____ 79. <u>REMARKS</u> _____ 80. <u>REMARKS</u> _____ 81. <u>REMARKS</u> _____ 82. <u>REMARKS</u> _____ 83. <u>REMARKS</u> _____ 84. <u>REMARKS</u> _____ 85. <u>REMARKS</u> _____ 86. <u>REMARKS</u> _____ 87. <u>REMARKS</u> _____ 88. <u>REMARKS</u> _____ 89. <u>REMARKS</u> _____ 90. <u>REMARKS</u> _____ 91. <u>REMARKS</u> _____ 92. <u>REMARKS</u> _____ 93. <u>REMARKS</u> _____ 94. <u>REMARKS</u> _____ 95. <u>REMARKS</u> _____ 96. <u>REMARKS</u> _____ 97. <u>REMARKS</u> _____ 98. <u>REMARKS</u> _____ 99. <u>REMARKS</u> _____ 100. <u>REMARKS</u> _____
--	--	--

[illegible]


1. <u>NAME</u> _____ 2. <u>ADDRESS</u> _____ 3. <u>CITY</u> _____ 4. <u>STATE</u> _____ 5. <u>ZIP</u> _____ 6. <u>TELEPHONE</u> _____ 7. <u>DATE</u> _____ 8. <u>TIME</u> _____ 9. <u>REASON</u> _____ 10. <u>REMARKS</u> _____ 11. <u>SIGNATURE</u> _____ 12. <u>DATE</u> _____ 13. <u>TIME</u> _____ 14. <u>REASON</u> _____ 15. <u>REMARKS</u> _____ 16. <u>SIGNATURE</u> _____ 17. <u>DATE</u> _____ 18. <u>TIME</u> _____ 19. <u>REASON</u> _____ 20. <u>REMARKS</u> _____ 21. <u>SIGNATURE</u> _____ 22. <u>DATE</u> _____ 23. <u>TIME</u> _____ 24. <u>REASON</u> _____ 25. <u>REMARKS</u> _____ 26. <u>SIGNATURE</u> _____ 27. <u>DATE</u> _____ 28. <u>TIME</u> _____ 29. <u>REASON</u> _____ 30. <u>REMARKS</u> _____ 31. <u>SIGNATURE</u> _____ 32. <u>DATE</u> _____ 33. <u>TIME</u> _____ 34. <u>REASON</u> _____ 35. <u>REMARKS</u> _____ 36. <u>SIGNATURE</u> _____ 37. <u>DATE</u> _____ 38. <u>TIME</u> _____ 39. <u>REASON</u> _____ 40. <u>REMARKS</u> _____ 41. <u>SIGNATURE</u> _____ 42. <u>DATE</u> _____ 43. <u>TIME</u> _____ 44. <u>REASON</u> _____ 45. <u>REMARKS</u> _____ 46. <u>SIGNATURE</u> _____ 47. <u>DATE</u> _____ 48. <u>TIME</u> _____ 49. <u>REASON</u> _____ 50. <u>REMARKS</u> _____ 51. <u>SIGNATURE</u> _____ 52. <u>DATE</u> _____ 53. <u>TIME</u> _____ 54. <u>REASON</u> _____ 55. <u>REMARKS</u> _____ 56. <u>SIGNATURE</u> _____ 57. <u>DATE</u> _____ 58. <u>TIME</u> _____ 59. <u>REASON</u> _____ 60. <u>REMARKS</u> _____ 61. <u>SIGNATURE</u> _____ 62. <u>DATE</u> _____ 63. <u>TIME</u> _____ 64. <u>REASON</u> _____ 65. <u>REMARKS</u> _____ 66. <u>SIGNATURE</u> _____ 67. <u>DATE</u> _____ 68. <u>TIME</u> _____ 69. <u>REASON</u> _____ 70. <u>REMARKS</u> _____ 71. <u>SIGNATURE</u> _____ 72. <u>DATE</u> _____ 73. <u>TIME</u> _____ 74. <u>REASON</u> _____ 75. <u>REMARKS</u> _____ 76. <u>SIGNATURE</u> _____ 77. <u>DATE</u> _____ 78. <u>TIME</u> _____ 79. <u>REASON</u> _____ 80. <u>REMARKS</u> _____ 81. <u>SIGNATURE</u> _____ 82. <u>DATE</u> _____ 83. <u>TIME</u> _____ 84. <u>REASON</u> _____ 85. <u>REMARKS</u> _____ 86. <u>SIGNATURE</u> _____ 87. <u>DATE</u> _____ 88. <u>TIME</u> _____ 89. <u>REASON</u> _____ 90. <u>REMARKS</u> _____ 91. <u>SIGNATURE</u> _____ 92. <u>DATE</u> _____ 93. <u>TIME</u> _____ 94. <u>REASON</u> _____ 95. <u>REMARKS</u> _____ 96. <u>SIGNATURE</u> _____ 97. <u>DATE</u> _____ 98. <u>TIME</u> _____ 99. <u>REASON</u> _____ 100. <u>REMARKS</u> _____ 101. <u>SIGNATURE</u> _____ 102. <u>DATE</u> _____ 103. <u>TIME</u> _____ 104. <u>REASON</u> _____ 105. <u>REMARKS</u> _____ 106. <u>SIGNATURE</u> _____ 107. <u>DATE</u> _____ 108. <u>TIME</u> _____ 109. <u>REASON</u> _____ 110. <u>REMARKS</u> _____ 111. <u>SIGNATURE</u> _____ 112. <u>DATE</u> _____ 113. <u>TIME</u> _____ 114. <u>REASON</u> _____ 115. <u>REMARKS</u> _____ 116. <u>SIGNATURE</u> _____ 117. <u>DATE</u> _____ 118. <u>TIME</u> _____ 119. <u>REASON</u> _____ 120. <u>REMARKS</u> _____ 121. <u>SIGNATURE</u> _____ 122. <u>DATE</u> _____ 123. <u>TIME</u> _____ 124. <u>REASON</u> _____ 125. <u>REMARKS</u> _____ 126. <u>SIGNATURE</u> _____ 127. <u>DATE</u> _____ 128. <u>TIME</u> _____ 129. <u>REASON</u> _____ 130. <u>REMARKS</u> _____ 131. <u>SIGNATURE</u> _____ 132. <u>DATE</u> _____ 133. <u>TIME</u> _____ 134. <u>REASON</u> _____ 135. <u>REMARKS</u> _____ 136. <u>SIGNATURE</u> _____ 137. <u>DATE</u> _____ 138. <u>TIME</u> _____ 139. <u>REASON</u> _____ 140. <u>REMARKS</u> _____ 141. <u>SIGNATURE</u> _____ 142. <u>DATE</u> _____ 143. <u>TIME</u> _____ 144. <u>REASON</u> _____ 145. <u>REMARKS</u> _____ 146. <u>SIGNATURE</u> _____ 147. <u>DATE</u> _____ 148. <u>TIME</u> _____ 149. <u>REASON</u> _____ 150. <u>REMARKS</u> _____ 151. <u>SIGNATURE</u> _____ 152. <u>DATE</u> _____ 153. <u>TIME</u> _____ 154. <u>REASON</u> _____ 155. <u>REMARKS</u> _____ 156. <u>SIGNATURE</u> _____ 157. <u>DATE</u> _____ 158. <u>TIME</u> _____ 159. <u>REASON</u> _____ 160. <u>REMARKS</u> _____ 161. <u>SIGNATURE</u> _____ 162. <u>DATE</u> _____ 163. <u>TIME</u> _____ 164. <u>REASON</u> _____ 165. <u>REMARKS</u> _____ 166. <u>SIGNATURE</u> _____ 167. <u>DATE</u> _____ 168. <u>TIME</u> _____ 169. <u>REASON</u> _____ 170. <u>REMARKS</u> _____ 171. <u>SIGNATURE</u> _____ 172. <u>DATE</u> _____ 173. <u>TIME</u> _____ 174. <u>REASON</u> _____ 175. <u>REMARKS</u> _____ 176. <u>SIGNATURE</u> _____ 177. <u>DATE</u> _____ 178. <u>TIME</u> _____ 179. <u>REASON</u> _____ 180. <u>REMARKS</u> _____ 181. <u>SIGNATURE</u> _____ 182. <u>DATE</u> _____ 183. <u>TIME</u> _____ 184. <u>REASON</u> _____ 185. <u>REMARKS</u> _____ 186. <u>SIGNATURE</u> _____ 187. <u>DATE</u> _____ 188. <u>TIME</u> _____ 189. <u>REASON</u> _____ 190. <u>REMARKS</u> _____ 191. <u>SIGNATURE</u> _____ 192. <u>DATE</u> _____ 193. <u>TIME</u> _____ 194. <u>REASON</u> _____ 195. <u>REMARKS</u> _____ 196. <u>SIGNATURE</u> _____ 197. <u>DATE</u> _____ 198. <u>TIME</u> _____ 199. <u>REASON</u> _____ 200. <u>REMARKS</u> _____ 201. <u>SIGNATURE</u> _____ 202. <u>DATE</u> _____ 203. <u>TIME</u> _____ 204. <u>REASON</u> _____ 205. <u>REMARKS</u> _____ 206. <u>SIGNATURE</u> _____ 207. <u>DATE</u> _____ 208. <u>TIME</u> _____ 209. <u>REASON</u> _____ 210. <u>REMARKS</u> _____ 211. <u>SIGNATURE</u> _____ 212. <u>DATE</u> _____ 213. <u>TIME</u> _____ 214. <u>REASON</u> _____ 215. <u>REMARKS</u> _____ 216. <u>SIGNATURE</u> _____ 217. <u>DATE</u> _____ 218. <u>TIME</u> _____ 219. <u>REASON</u> _____ 220. <u>REMARKS</u> _____ 221. <u>SIGNATURE</u> _____ 222. <u>DATE</u> _____ 223. <u>TIME</u> _____ 22

[illegible]


6.

Súhrn technických údajov


- konštrukcia určená do **exteriéru na celoročnú** prevádzku
- celkový **rozmer zostavy**: 5956 x 8096 mm, výška 3515 mm
- vyrobené z **konštrukčnej ocele S235** s Atestom
- povrchová úprava ocele **práškovým lakovaním**
- **hmotnosť** konštrukcie je 1100 kg
- **dopadová** plocha: 300 mm hlboký štrk pod celou zostavou
- **štrk** plavený / guľatý, veľkosť zrn 2-8 mm
- štrkový **bazén vysunutý** až do 2200 mm od okraja zostavy
- najnižšia **veková kategória**: deti nad 6 rokov
- maximálny **počet cvičiacich**: 30-40 osôb
- **inštalácia** konštrukcie bola vykonaná výrobcom podľa vlastného technologického postupu
- **premiestňovanie** konštrukcie je oprávnený vykonávať iba výrobca
- **náhradné diely** sú dostupné u výrobcu konštrukcie
- **likvidácia** konštrukcie sa odporúča v súčinnosti s výrobcom

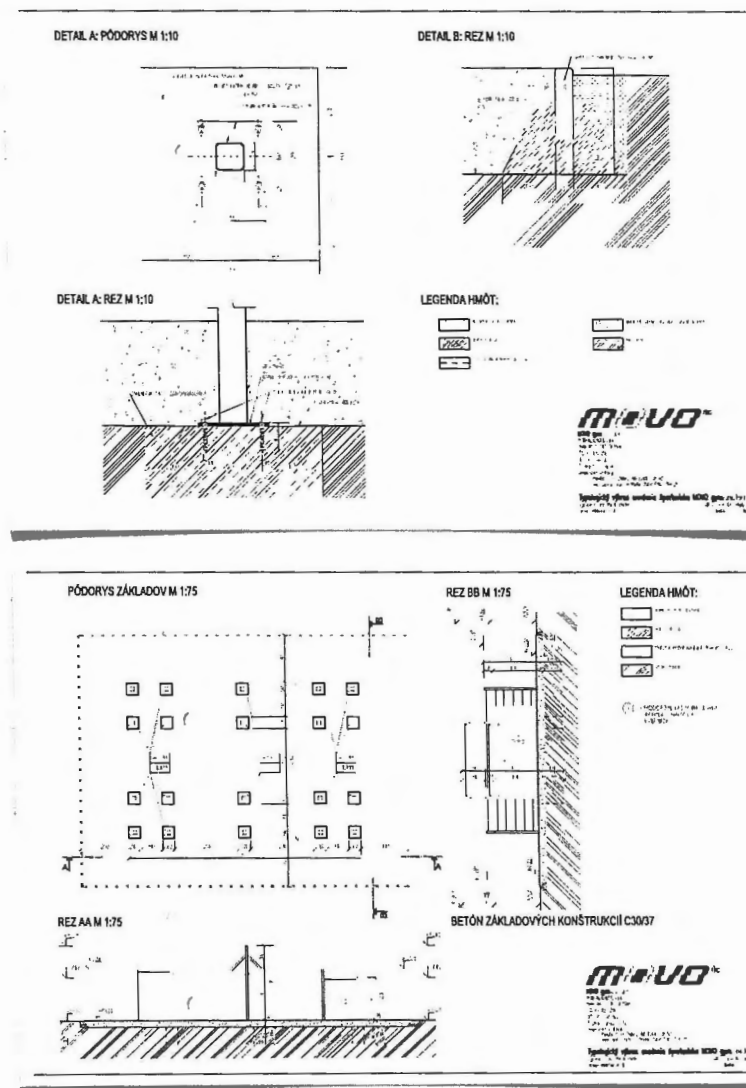


PÔDORYS M 1:75

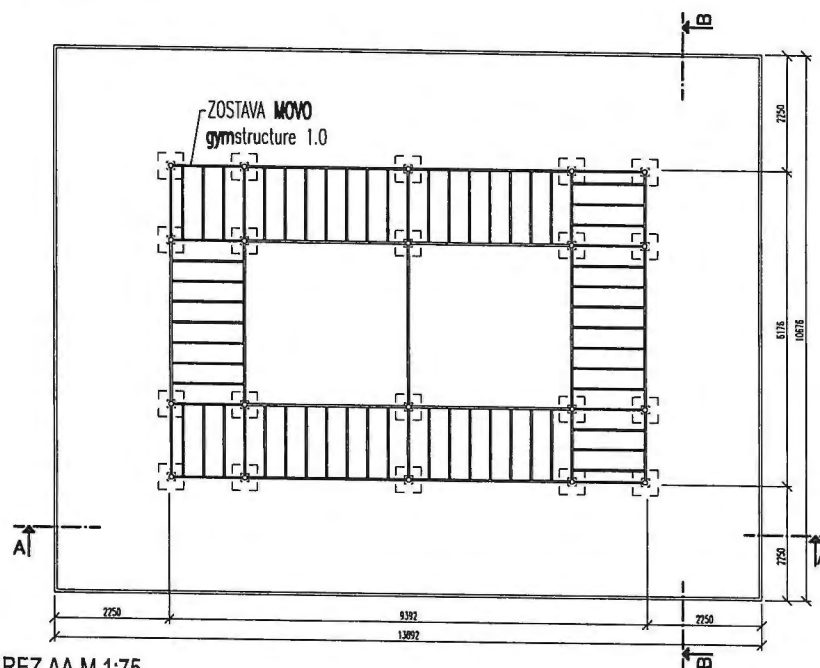

REZ AA M 1:75

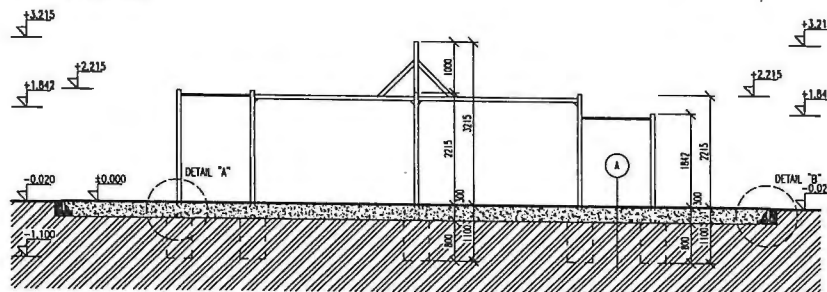

REZ BB M 1:75

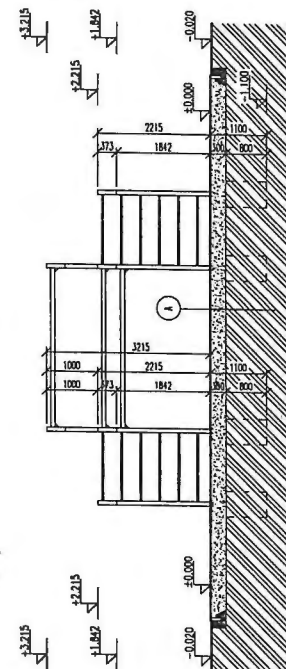

LEGENDA HMÔT:

- HUTNÝ ZÁSTY ZEMNODU
- BETÓN C16/20
- TRIEDENÉ PÍČNÉ KAMENNÝ TRACIE 4-BM
- RASTLÝ TERÉN

- ⊙ - TRIEDENÉ PÍČNÉ KAMENNÝ TRACIE 4-BM
- ⊙ - CENTRÁLNA VEŤKÁ 500x500
- ⊙ - RASTLÝ TERÉN

MOVO®

MOVO gymstructure

ACTIONREALITY s.r.o.

Pávková 3, 949 01 Húň

ČZ: 44 105 258

DI: 202 260 6652

Č: DIPI: SK022606652

Zodpovedné konštrukt:

Posuš. Voda Zelená, PhD 0904 140 305

Autorizovaný dealer - Martin Zelená 0903 683 299

Typologický výkres osadenia športoviska MOVO gymstructure

Výpracoval: Ing. Marek Biskup


Dátum: Október 2021

Výkres: Ešte: 01 Pôdorys

Mierka: 1/75



7. Základné inštrukcie k používaniu zostavy

- zostava je navrhnutá na **bezpečný pohyb** detí od veku 6 rokov
- pohybové programy alebo voľnočasové aktivity sú možné len v **prítomnosti dospelaj osoby / učiteľa / trénera**
- cvičenie je vhodné podľa počasia aj na **boso** a ideálne **bez rukavíc**
- cvičenci majú **zakázané hojdanie** sa v prípade, že sú na konštrukcii umiestnené laná, kruhy alebo oboje naraz, rovnako **zakázané je liezť na hornú plochu konštrukcie**
- skupina cvičencom na zostave trénuje tak, že majú okolo seba **rozostup 500 mm** a používajú na vísenie / zhyby **každú druhú hrazdu**
- **voľný pád** cvičenca do štrkového "bazéna" je v maximálnej výške hlavy 3000 mm
- vzniknuté zranenia sa musia riadne **zaevidovať** do formulára
- zostavu je nutné pravidelne **kontrolovať** podľa inštrukcii na nasledovných stranách
- **prvá kontrola** konštrukcie je vykonaná v deň ukončenia montáže ešte pred prvým použitím
- žiadne **zmeny na konštrukcii** nie je možné vykonať bez súhlasu tvorca a výrobcu projektu
- v prípade požiaru sa konštrukcia hasí vodným či penovým prístrojom

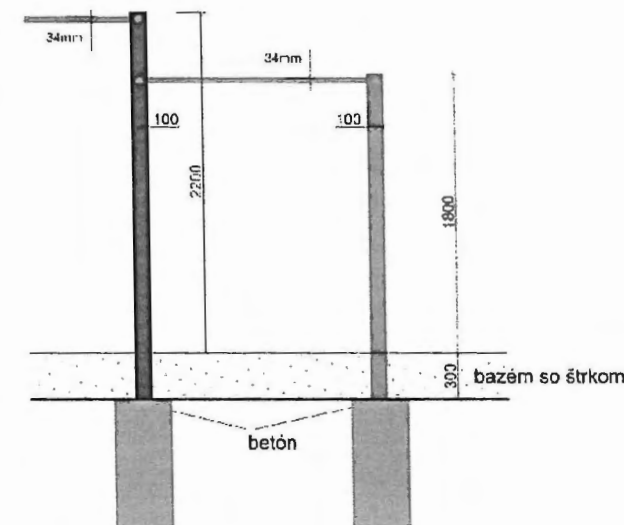

8. Zostatkové riziko:

- **riziko**: pri cvičeniach na kruhoch je nutné zvýšiť opatnosť a zabrániť deťom / študentom aby si strčili hlavu do kruhov
- **miesto**: plastové kruhy s priemerom 230 mm sú umiestnené na viacerých miestach okolo celej konštrukcie
- **príčina**: gymnastické kruhy s týmto priemerom sú dôležitá metodická pomôcka na nácvik rôznych pohybových zručností pre účely telesnej výchovy a športových krúžkov
- **eliminácia rizika**: používanie konštrukcie i kruhov nie je možné bez dozoru učiteľa či inej dospelšej osoby
- **zakázané používanie**: do kruhov sa nesmie vkladat' hlava cvičenca



9. Kvartálna kontrola zariadenia zo strany prevádzkovateľa

- prevádzkovateľ vykonáva **raz za deň** vizuálnu kontrolu a údržbu zariadenia, ak nie sú žiadne závady, nieje potrebný písomný záznam
- prevádzkovateľ vykonáva **raz za 3 mesiace** komplexnú kontrolu a údržbu zariadenia a stav zaznamená
 - **kontrola zahŕňa:** kontrolu stability zariadenia, možné poškodenia vandalizmom či inými vplyvmi, stav lán a kruhov, kontrolu štrkovej plochy i okolitého prostredia s následným písomným záznamom o stave
- v prípade **zistených konštrukčných závad** prevádzkovateľ kontaktuje výrobcu na odstránenie nedostatkov
- bežné nedostatky (znečistenie, úpravy terénu) odstraňuje prevádzkovateľ sám

Číslo	Dátum	Zistenia	Meno osoby a podpis	Dátum odstránenia nedostatku

Číslo	Dátum	Zistenia	Meno osoby a podpis	Dátum odstránenia nedostatku

10. Hlavná ročná kontrola zariadenia

- kontrola zo strany **špecialistov**, nezávisle od prevádzkovateľa
 - **kontrola zahŕňa:** kontrolu stability zariadenia, pevnosť upevnenia konštrukcie, opotrebovanie konštrukcie, možné poškodenia vandalizmom či inými vplyvmi, kontrolu štrkovej plochy i okolitého prostredia s následným písomným záznamom o stave

Číslo	Dátum	Zistenia	Meno osoby a podpis	Dátum odstránenia nedostatku

11.

Formulár na registrovanie úrazu

- akýkoľvek úraz je potrebné zaevidovať aby bolo možné preskúmať povahu úrazu a príčiny následne odstrániť

Číslo	Dátum	Opis úrazu	Meno dieťaťa	Príčina úrazu	Počet prítomných detí / svedkovia

Číslo	Dátum	Opis úrazu	Meno dieťaťa	Príčina úrazu	Počet prítomných detí / svedkovia



Kontakt:

PaedDr. Vlado **Zlatoš**, PhD.
movement & lifestyle expert
vlado@vladozlatos.com
+421 904 140 305



www.vladozlatos.com



park.movo.sk

@vladozlatos

MOVO®



Návod na používanie konštrukcie



- konštrukcia MOVO **gymstructure 1.0** je určená pre deti staršie ako **6 rokov**
- pohybové aktivity sú možné len v **prítomnosti dospeljej osoby: učiteľ' / tréner / vychovávateľ' / rodičia**
- cvičenie je vhodné podľa počasia aj na **boso** a ideálne **bez rukavíc**
- cvičenci majú **zakázané:**
 - **hojdať sa na lanách či kruhoch** (minimálne hojdanie je OK)
 - **vyliezť na hornú časť konštrukcie**
 - **strkať hlavu do kruhov**
- pri cvičení je potrebný **rozstup 500 mm**
- väčšia skupina visiacych cvičencov visí na **každej druhej hrazde**
- v prípade zistenia nedostatku na konštrukcii je nutné závalu **hlásiť** prevádzkarovi priamo na škole

MOVO®



PaedDr. Vlado **Zlatoš**, PhD.
+421 904 140 305
vladozlatos.com
park.movo.sk

Zostava ihriska, dopadové plochy
a umiestnenie konštrukcie je v súlade
s **STN EN 1176-1** a **STN EN 16630**
