

ZMLUVA O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.“)**

Sídlo: Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava

Zastúpený: PhDr. Pavel Kelemen, PhD. – poverený výkonom funkcie riaditeľa

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2034 0750

SWIFT code: TATRSKBX

IČO: 35 778 458

IČ DPH: SK2020244699

DIČ: 2020244699

Obchodný register: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Pš,

Vložka č.: 418/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava

Číslo účtu: 2620340750/1100

Telefón: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Internetová adresa: www.lps.sk

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „LPS SR, š. p.“)

Zhotoviteľ:

Názov: **SITEL s.r.o.**

Sídlo: Zemplínska 6
Košice 040 01

Zastúpený: Ing. Ján Novák, CSc., konateľ

Na podpis zmluvy oprávnený: Ing. Eduard Nemec, výkonný riaditeľ, na základe poverenia

IBAN: SK69 0200 0000 0000 8860 1512

SWIFT code: SUBASKBX

IČO: 31668305

IČ DPH: SK2020494619

DIČ: 2020494619

Obchodný register: Mestský súd Košice

Oddiel: Sro, vložka číslo 2773/V

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

Číslo účtu: 88601512/0200

Telefón: [REDACTED]

Internetová adresa: www.sitel.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“) je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas pre objednávateľa dielo „**Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3.etapa**“, v rozsahu a kvalite určenej Prílohou č. 2 - Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie, vrátane výkazu výmer spracovanou spoločnosťou **TELECOMPROJECT spol. s r.o.** (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa prevziať dielo a zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas dodané dielo zmluvnú cenu za podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
- 2.2 Súčasťou vyhotovenia diela je aj:
- 2.2.1 Vykonanie požadovaných skúšok,
 - 2.2.2 Dodávka dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia.
 - 2.2.3 Zameranie skutkového stavu stavby a vypracovanie geometrických plánov na zameranie a zapísanie vecných bremien po jednotlivých katastrálnych územiach.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo a poskytnúť objednávateľovi **všetky služby** potrebné pre realizáciu diela, za podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

Článok 3.

Miesto plnenia

- 3.1. Miesto vykonania diela:
- 3.1.1 Dokladová časť diela:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava
 - 3.1.2 Fyzická realizácia diela:
Stavba sa zväčša nachádza v oplotenom areáli letiska M.R. Štefánika, Bratislava, Ivanská cesta, 820 01 Bratislava s kontrolovaným a regulovaným vstupom. Malá časť stavby prechádza za toto oplotenie.

Článok 4.

Cena za dielo

- 4.1 Dielo musí spĺňať požiadavky objednávateľa, je ocenené podľa požiadaviek objednávateľa a navrhovaná cena za dielo je úplná a nemenná. Žiadne opomenutia, chyby pri spracovaní ceny za dielo alebo akákoľvek iná príčina na strane zhotoviteľa nebudú dôvodom na zmenu ceny za dielo počas plnenia zmluvy. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa za realizáciu diela:
- | | |
|--------------|--|
| cena bez DPH | 1.799.754,28 EUR |
| DPH | 359.950,86 EUR |
| Cena s DPH | 2.159.705,14 EUR |
| slovom: | dvamiliónystopäťdesiatdeväťtisíc sedemstopäť eur a 14 eurocentov s DPH |

Zhotoviteľ vyhlasuje, že platenie DPH bude podliehať režimu samozdanenia podľa podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch, najmä podmienok uvedených v § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 222/2004 Z. z.“), na stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA.

- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná zmluvné práce na diele a prijíma riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za cenu za dielo.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo zhotoviteľovi podľa platobných podmienok špecifikovaných v **Článku 6.** tejto zmluvy.
- 4.4 Rozpis ceny je uvedený v **Prílohe č. 1** tejto zmluvy – **Rozpočet.**
- 4.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že si vopred skontroloval výkaz výmer s Prílohou č. 2 - Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie a prípadné nezrovnalosti alebo chýbajúce položky zohľadnil vo výslednej zmluvnej cene za dielo.
- 4.6 V cene za dielo sú zohľadnené všetky miestne podmienky na stavenisku, najmä, nie však výlučne, dopravné náklady, náklady na individuálny a ručný presun materiálov, stavebného a iného odpadu a vybúraných hmôt, náklady na ich odvoz a likvidáciu resp. uloženie na povolenej skládke, náklady na zakrývanie technológie v dotknutých priestoroch, odsávanie, čistenie a vysávanie po vykonaných prácach a ďalšie činnosti (plnenie povinností BOZP, OPP, na ochranu verejného zdravia a pod.) v ich priebehu, náklady spojené so skutočnosťou, že dielo sa bude realizovať za plnej prevádzky Letiska M.R. Štefánika, Bratislava (stráženie, dohľad, stavebný dozor, koordinátora BOZP a pod).
- 4.7 V zmluvnej cene je tiež zahrnuté zhotoviteľovo poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody pri realizácii diela **podľa bodu 15.9 tejto zmluvy** a vyhotovenie všetkých dokladov uvedených v **Článku 13. bod 13.5** nevyhnutných k protokolárnemu prevzatiu diela ako aj poistenie zodpovednosti za prípadné škody. V cene diela sú tiež zahrnuté búracie a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela, stavebný a iný materiál, odvoz a uloženie stavebného odpadu na povolenú skládku o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi príslušný doklad v súlade s **Článkom 13 bod 13.5.**
- 4.8 Cena za dielo môže byť zmenená v priebehu realizácie zmluvy dohodou zmluvných strán len na základe legislatívnych zmien týkajúcich sa sadzby DPH.

Článok 5.

Termín zhotovenia diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce a vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do osemnástich mesiacov od odovzdania príslušného staveniska.
- 5.2 Termíny zhotovenia stavby sú rozpísané v **Prílohe č. 3** tejto zmluvy – **Harmonogram prác.**
- 5.3 Termín zhotovenia diela môže byť zmenený len v prípade písomnej dohody zodpovedných osôb pre veci zmluvné, podľa ust. 11.32 a 11.33 tejto zmluvy) medzi oboma zmluvnými stranami.
- 5.4 V prípade prekážok v plnení termínov zhotovenia diela na strane objednávateľa, ktoré budú prekážkou plnenia termínov zhotovenia diela na strane zhotoviteľa, sa termín zhotovenia diela predĺži o dobu trvania týchto prekážok.

Článok 6. Platobné podmienky a Fakturácia

6.1 Počas trvania účinnosti tejto zmluvy smie Zhotoviteľ vystaviť maximálne štyri čiastkové faktúry a to nasledovne:

- **1.čiastkovú faktúru** po zrealizovaní (zabudovaní) minimálne 20% cenovej hodnoty jednotlivých zabudovaných alebo realizovaných položiek uvedených v **Prílohe č.1 - Rozpočet**
- **2.čiastkovú faktúru** po zrealizovaní (zabudovaní) minimálne 40% cenovej hodnoty jednotlivých zabudovaných alebo realizovaných položiek uvedených v **Prílohe č.1 - Rozpočet**
- **3.čiastkovú faktúru** po zrealizovaní (zabudovaní) minimálne 60% cenovej hodnoty jednotlivých zabudovaných alebo realizovaných položiek uvedených v **Prílohe č.1 - Rozpočet**
- **4.čiastkovú faktúru** po zrealizovaní (zabudovaní) minimálne 80% cenovej hodnoty jednotlivých zabudovaných alebo realizovaných položiek uvedených v **Prílohe č.1 - Rozpočet v Článku 4 bod 4.1**

Čiastková faktúra môže byť vystavená len na zrealizované (zabudované) výmery jednotlivých položiek a ich ceny. Súčet vystavených čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 80 % ceny diela uvedenej v **Článku 4 bod 4.1** Všetky položky uvedené v **Prílohe č.1 – Rozpočet** môžu byť fakturované do 100 % len jeden krát.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovené dielo v súlade s **Článkom 4.** tejto zmluvy na základe konečnej faktúry.

6.3 Oprávnenie vystaviť konečnú faktúru vzniká dňom splnenia zmluvnej dodávky, t. j. dňom odovzdania a prevzatia diela v súlade s Článkom 13. tejto zmluvy.

6.4 Zhotoviteľ doručí objednávateľovi osobne alebo doporučeným listom konečnú faktúru v dvoch vyhotoveniach do 10–tich dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

6.5 V konečnej faktúre budú odpočítané všetky čiastkové faktúry, ak boli vystavené v zmysle bodu 6.1 tohto článku a boli objednávateľom uhradené zhotoviteľovi.

6.6 **Fakturácia a splatnosť faktúr.**

6.6.1 Cena diela bude fakturovaná v EUR.

6.6.2 Splatnosť faktúry je do 14-násť dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. Súčasťou faktúr bude objednávateľom a zhotoviteľom písomne potvrdený odovzdávací a preberací protokol (doklad potrebný pri predložení pri konečnej faktúre), súpis vykonaných prác a dodávok s uvedením jednotkovej ceny a celkovej ceny po jednotlivých položkách, podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky zhotoviteľa.

6.6.3 Zhotoviteľom vystavená faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z.

6.6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle bodu 6.6.3 tohto článku, alebo nebude faktúra vecne alebo cenovo správna, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru do lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti.

6.7 **Objednávateľ zadrží čiastku 2 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH až do konca záručnej doby.** Objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku, alebo jej zostatok v prípade jej využitia podľa tejto zmluvy, do 10-tich dní odo dňa, v ktorom uplynie záručná doba diela.

- Objednávateľ zadrží hore uvedenú 2% čiastku priebežne z fakturovanej sumy každej vystavenej faktúry.
- 6.8 Zhotoviteľ môže po úspešnom odovzdaní diela nahradiť zádržné (2% z ceny diela bez DPH) na jeho celú výšku bezpodmienečnou, neodvolateľnou bankovou zárukou (Warranty bond) na prvú výzvu a bez námietok podľa ust. § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. V prípade predloženia bankovej záruky zhotoviteľom, objednávateľ uvoľní zádržné do 7 pracovných dní od jej prijatia. V prípade predloženia bankovej záruky musí byť jej platnosť určená na celú záručnú dobu, prípadne aj predĺženú záručnú dobu, ak predĺženie záručnej doby bolo spôsobené v dôsledku neplnenia záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy.
- 6.9 Banka poskytujúca bankovú záruku a text bankovej záruky podliehajú schváleniu objednávateľom. Náklady spojené so splnením tohto odseku hradí v celom rozsahu zhotoviteľ. V prípade sporu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, banka poskytujúca bankovú záruku nie je oprávnená uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ich priamo objednávateľovi. V prípade následného vyriešenia sporu v neprospech objednávateľa vráti objednávateľ takto prijaté plnenie bezodkladne zhotoviteľovi.
- 6.10 V prípade, že zhotoviteľ nebude v rámci záručnej doby plniť svoje povinnosti voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy, použije objednávateľ finančné prostriedky zo zadržanej čiastky alebo bankovej záruky k odstráneniu prípadných reklamovaných väd. Objednávateľ môže zadržanú čiastku, resp. bankovú záruku použiť ak nastane akákoľvek udalosť podľa Článku 10. bod 10.11, 10.15 Článku 11. bod 11.6, bod 11.15, alebo Článku 14. bod 14.10 tejto zmluvy.
- 6.11 Zádržná čiastka, resp. banková záruka slúži tiež na prípadné úhrady nákladov na odstránenie väd, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania/nekonania zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto zmluvou.

Článok 7.

Záruka na vykonanie diela

- 7.1 Do pätnástich (15) dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zhotoviteľ zabezpečí a odovzdá objednávateľovi záruku na vykonanie diela (Performance Bond) vo forme bezpodmienečnej a neodvolateľnej bankovej záruky v prospech objednávateľa vo výške 10% z ceny za vykonanie diela podľa Článku 4. bod 4.1 tejto zmluvy bez DPH (ďalej len „banková záruka“).
- 7.2 Banka poskytujúca bankovú záruku a text bankovej záruky podliehajú schváleniu objednávateľom. Náklady spojené so splnením tohto odseku hradí v celom rozsahu zhotoviteľ. V prípade sporu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, banka poskytujúca bankovú záruku nie je oprávnená uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ich priamo objednávateľovi. V prípade následného vyriešenia sporu v neprospech objednávateľa vráti objednávateľ takto prijaté plnenie bezodkladne zhotoviteľovi.
- 7.3 Objednávateľ je oprávnený čerpať peniaze z bankovej záruky:
- a) na náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hroziacej škody,
 - b) na zaistenie náhradného plnenia, pokiaľ:

- i) dielo alebo jeho časť je zhotovené v rozpore s ustanovením Článku 2. bod 2.1 tejto zmluvy;
 - ii) zhotoviteľ ukončil zmluvu z iného dôvodu než je uvedené v Článku 18. bod 18.5 tejto zmluvy;
 - iii) objednávateľ odstúpil od zmluvy podľa Článku 18. bod 18.2 tejto zmluvy.
- 7.4 Banková záruka bude platná minimálne do termínu 10-tich pracovných dní po dni zhotovenia diela podľa Článku 5. bod 5.1 tejto zmluvy.
- 7.5 Banková záruka alebo jej nevyčerpaný zostatok bude vrátená zhotoviteľovi na jeho výzvu po dokončení diela, podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty stanovenej v bode 7.4 tejto zmluvy.
- 7.6 V prípade nutnosti predĺženia platnosti záruky, teda po prípadnej zmene termínu zhotovenia diela, musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci predĺženie platnosti záruky minimálne 5 (päť) dní pred zmluvným termínom odovzdania a prevzatia diela podľa Článku 5. bod 5.1 tejto zmluvy. V opačnom prípade má objednávateľ bezodkladný nárok na uplatnenie bankovej záruky v celom rozsahu.
- 7.7 Pred uplatnením nárokov na základe bankovej záruky objednávateľ oznámi zhotoviteľovi druh neplnenia, vo vzťahu ku ktorému mieni nárok uplatniť.

Článok 8.

Zhotovenie diela

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v súlade so zákonmi, vyhláškami, opatreniami, normami, smernicami a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozsahu stanovenom v schválenej projektovej dokumentácii. Slovenské technické normy sú pre realizáciu diela záväznými predpismi.

Článok 9.

Projektová dokumentácia

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi 2 paré projektovej dokumentácie stavby pri podpise zmluvy v papierovej forme a v príslušnom editovateľnom formáte *.dwg, *.doc, *.xls prípadne *.pdf.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pri dodatočnom zistení chyby v projektovej dokumentácii na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa a objednávateľ je povinný odstránenie tejto chyby skoordinať s projektantom. V prípade zníženia rozsahu prác bude primerane znížená cena diela a v prípade potreby ďalších prác, ktoré z toho vzniknú z tohto dôvodu, zmluvné strany uzatvoria písomný dodatok k zmluve na realizáciu týchto prác.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený projektovú dokumentáciu použiť len pre účely vykonania diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený na žiadne iné použitie alebo nakladanie s projektovou dokumentáciou, ako napríklad jej spracovanie, ďalšie využitie pre seba alebo iné osoby, šírenie a pod.

Článok 10.

Miesto realizácie diela (stavenisko) a zariadenie staveniska

- 10.1 Objednávateľ sa zaväzuje formou zápisnice odovzdať zhotoviteľovi stavenisko k realizácii diela a do správy počas celej doby realizácie až po ukončenie diela.

- 10.2 Dielo sa bude realizovať v oplotenom areáli Letiska M. R. Štefánika s kontrolovaným vstupom.
- 10.3 Dielo sa bude realizovať za špeciálneho bezpečnostného režimu definovaného v DOPADOVEJ ANALÝZE 06/2019 (**Príloha č.4**). Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť rešpektovať.
- 10.4 Prevzatie staveniska sa uskutoční na základe výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 10.5 Prevzatie staveniska bude písomne zaznamenané v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami pre veci technické obidvoch zmluvných strán.
- 10.6 Zhotoviteľ po prevzatí staveniska odovzdá objednávateľovi zoznam elektrického ručného náradia, prenosných spotrebičov, ktoré bude používať pri realizácii diela aj s kópiami platných revízií a kontrol pre tieto zariadenia.
- 10.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie úloh BOZP, OPP a ochrany verejného zdravia v celom rozsahu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a protipožiarnych opatrení a podmienok uvedených v **Prílohe č.4** tejto zmluvy, ako aj požiadaviek BOZP na stavenisku a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu staveniska a jeho okolia v zmysle platných predpisov.
- 10.8 Zhotoviteľ pri preberaní staveniska predloží objednávateľovi zoznam zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na realizácii diela spolu s platným potvrdením o ich zaškolení v oblasti BOZP a OPP a s potvrdením o ich spôsobilosti na zaistenie BOZP a bezpečnosti pri používaní technických zariadení. Podmienky pre zaistenie ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom tvoria **Prílohu č. 4** tejto zmluvy.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za všetkých svojich zamestnancov a zamestnancov jeho subdodávateľov ako aj osoby, ktoré sa budú s jeho vedomím zdržiavať na stavenisku za to, že títo zamestnanci a osoby nebudú vykonávať pracovné činnosti pod vplyvom alkoholu a ďalších psychoaktívnych látok, že nebudú fajčiť na miestach, na ktorých to nie je povolené a všetci budú odborne a zdravotne spôsobilí na vykonávanú pracovnú činnosť.
- 10.10 Určení zamestnanci objednávateľa majú právo vykonávať kontroly dodržiavania podmienok na stavenisku uvedených v tejto zmluve vrátane príloh. V prípade zistenia osôb vykonávajúcich pracovné činnosti pre zhotoviteľa, že nespĺňajú požiadavky odbornej, zdravotnej spôsobilosti, alebo sú pod vplyvom alkoholu, alebo iných psychoaktívnych látok, majú právo takúto osobu vykázať zo staveniska a priestorov LPS SR, š.p. Tento stav oznámia určenému zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa. Táto skutočnosť nebude mať vplyv na záväzok zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas.
- 10.11 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad si objednávateľ vyhradzuje právo na náklady zhotoviteľa zabezpečiť na udržanie poriadku a čistoty inú firmu. Náklady s tým spojené bude v plnej výške hradiť zhotoviteľ.
- 10.12 Zhotoviteľ musí zaviesť na stavenisku také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (požívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.). Zhotoviteľ stavby si musí zabezpečiť mobilné WC, pričom náklady s tým spojené bude v plnej výške hradiť zhotoviteľ.
- 10.13 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy a kvality vykonávaných stavebných prác a dodávok musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek iný zamestnanec zhotoviteľa zo stavby bezodkladne odvolaný a nahradený novým zamestnancom. Odvolaný zamestnanec nesmie viac vykonávať

žiadne práce na diele a ani nesmie byť ďalej prítomný na stavenisku. Táto skutočnosť nebude mať vplyv na záväzok zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas.

- 10.14 Zhotoviteľ musí odstrániť najneskôr do dvoch (2) pracovných dní po úspešnom odovzdávaní a preberaní konaní všetok svoj materiál a zariadenie staveniska, zabezpečiť pôvodný stav miesta realizácie diela, dôkladné vyčistenie staveniska a zabezpečiť opravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Náklady s tým spojené bude v plnej výške hradíť zhotoviteľ.
- 10.15 V prípade nákladov vzniknutých objednávateľovi z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovania nápravných opatrení vyššie spomenutých nedostatkov na strane zhotoviteľa, tieto budú priamo odpočítané z faktúry predloženej zhotoviteľom alebo bude využité zádržné alebo banková záruka podľa bodu 6.10 tejto zmluvy.

Článok 11.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa Článku 2. bod 2.1 tejto zmluvy, v lehote uvedenej v Článku 5. tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ všetky určené doklady napr. vyhlásenia o parametroch, vyhlásenia zhody, atesty, certifikáty, skúšky, správy o odborných prehliadkach a skúškach, revízie, kontroly a osvedčenia materiálov a dodávok a pod., si zabezpečuje na vlastné náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály a dodávky budú nové, nepoužité, prvej akosti, uvedené na trh predpísaným spôsobom pre Slovenskú republiku a EÚ a vyhovujú predpisom a technickým normám platným na území Slovenskej republiky. Dielo sa považuje za dokončené a odovzdané až po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, ktoré sa vyžadujú v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ má nárok na predloženie týchto dokladov na požiadanie aj vopred pred ich zabudovaním, aby si mohol overiť či daný výrobok alebo materiál zodpovedá požiadavkám schválenej projektovej dokumentácii.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov a osoby, ktoré budú vykonávať práce v jeho mene alebo sa budú zdržiavať na stavenisku, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej „OOPP“) podľa nebezpečenstva rizika vykonávaných prác a požadovať od nich, ako aj od zamestnancov jeho subdodávateľov ich používanie.
- 11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie a dodržiavanie príslušných požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov EN, STN, povinností a pravidiel na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku objednávateľa alebo tretích osôb. (**Príloha č. 4** – Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a vstupného režimu osôb a vozidiel).
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný pred zriadením staveniska a začatím prác predložiť Objednávateľovi Plán BOZP vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktorý predloží Objednávateľovi.
- 11.6 Akékoľvek poškodenie majetku objednávateľa alebo tretích strán spôsobené činnosťou, nečinnosťou alebo nedbanlivosťou zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov a subdodávateľov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady alebo v plnom rozsahu nahradiť.

- 11.7 Zhotoviteľ je povinný do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa svojich najlepších možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením diela pred neodbornými zásahmi vlastných zamestnancov alebo jeho subdodávateľov.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie odborných činností pracovníkmi, ktorí budú mať vystavené platné osvedčenia, oprávnenia, preukazy, doklady o odbornej spôsobilosti minimálne v rozsahu požadovaných odborných činností súvisiacich so zhotovením diela a zodpovedajúcu zdravotnú spôsobilosť.
- 11.9 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi po dobu realizácie diela nasledovné spolupôsobenie:
- odovzdá zhotoviteľovi súhlas príslušného stavebného úradu s realizáciou stavebných prác (stavebné povolenie „PASÍVNA INFRAŠTRUKTÚRA NA LETISKU BRATISLAVA – 3. ETAPA“ č. 5138/2020/ŠSÚ-9/MV zo dňa 07.02.2020 a predĺženie platnosti stavebného povolenia č.6856/2022/ŠSÚ-7/MV zo dňa 25.03.2022),
 - poskytne nevyhnutné spolupôsobenie pri zhotoviteľovom vybavovaní prístupov do oploteného areálu Letiska M.R. Štefánika, Bratislava na miesto realizácie diela,
 - poskytne priestor na umiestnenie mobilného WC,
 - pripojenie na odber elektrickej energie potrebnej na realizáciu diela len vo veľmi obmedzenej miere ,
 - miestom na skladovanie materiálu a výrobkov bude miesto realizácie.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný sa presvedčiť a vopred vyhodnotiť všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na podmienky vykonávania prác súvisiacich s realizáciou diela, oboznámi sa so všetkými vlastnosťami staveniska a so všetkými viazanosťami, ktoré sa vzťahujú na stavenisko (prístup, zdroj energie a jeho napojenie a pod.).
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku prašnosti a jej prenikaniu do priestorov s technologickými zariadeniami a prevádzkovými priestormi objednávateľa, oddeľovať priestory realizácie od ostatných priestorov umelými konštrukciami, používať pri búraní resp. rozobraní konštrukcií odsávanie a stále udržiavať čistotu vo všetkých dotknutých priestoroch. V prípade porušenia tejto povinnosti (prašnosti obmedzujúcej prevádzku objednávateľa alebo letiska), má objednávateľ právo na nariadenie zastavenia prác a dohodnutie týchto prác na vhodný čas prípadne na zabezpečenie ďalších opatrení zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať tieto opatrenia objednávateľa v celom rozsahu a ich realizácia nebude mať vplyv na cenu diela alebo termín dodania diela.
- 11.12 Objednávateľ je oprávnený vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa, ako aj materiálov, ktoré zhotoviteľ zabudováva. Na základe upozornení a príkazov objednávateľa v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarom a udržiavania čistoty musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu v súlade s platnými predpismi. Neuposlúchnutie takéhoto pokynu alebo zabudovanie materiálu, ktorý bol objednávateľom vylúčený na použitie, sa považuje za závažné porušenie ustanovení tejto zmluvy.
- 11.13 Zamestnanci objednávateľa uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý objednávateľ povinne predloží zhotoviteľovi pri prevzatí staveniska, môžu vstupovať na stavenisko. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku a po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Aktuálny zoznam oprávnených osôb vedie počas celej doby výstavby objednávateľ a zhotoviteľ zodpovedá za včasné zmeny a doplnenia tohto zoznamu.

- 11.14 Zhotoviteľ je povinný umožniť príslušným kontrolným orgánom a zástupcom objednávateľa, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11.15 Pokiaľ zhotoviteľ vykoná práce a konštrukcie odchyľne od zmluvy, predloženej projektovej dokumentácie alebo písomných pokynov objednávateľa, alebo vykoná práce nekvalitne, nebudú tieto práce objednávateľom uhradené. Zhotoviteľ je povinný ich bezodkladne odstrániť na svoje náklady a vykonať nápravu. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonával v lehote do troch (3) dní, je objednávateľ oprávnený objednať na tieto práce inú obchodnú spoločnosť na náklady zhotoviteľa.
- 11.16 Zhotoviteľ nesmie zasahovať do prevádzky objednávateľa a Letiska M.R. Štefánika, Bratislava a nesmie narúšať jej nepretržitý chod, rovnako nesmie vstupovať do prevádzkových priestorov objednávateľa bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
- 11.17 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za svoje prístroje, nástroje, pracovné prostriedky a materiály a musí sa postarať o ich ochranu, údržbu, predpísané kontroly, skúšky a revízie. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pracovné činnosti iba s nepoškodenými a kompletnými prístrojmi a zariadeniami; musí mať na prístrojoch a zariadeniach vykonávané pravidelné kontroly, skúšky a revízie.
- 11.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zrealizované dodávky a materiály určené a potrebné k realizácii diela alebo jeho časti pred poškodením a krádežou a to až do ich protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom.
- 11.19 Zhotoviteľ nesmie odpad skladovať. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. Odpad sa hneď po vytvorení musí odviezť na zneškodnenie a doklad o zneškodnení odpadu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť očistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska, aby bolo znečistenie rolovacích dráh vylúčené alebo minimalizované na najnižšiu možnú mieru.
- 11.20 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku viesť stavebný denník. Objednávateľ svojím podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že bol oboznámený s údajmi v stavebnom denníku. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne vyjadrí do dvoch (2) pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Záznamy objednávateľa majú účinok bezprostredného písomného oznámenia a zhotoviteľ je povinný okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho, aj keď ho nepodpíše.
- 11.21 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný do dvoch (2) pracovných dní upozorniť zodpovedného zástupcu objednávateľa na závažné zápisy v stavebnom denníku. Objednávateľ je povinný pravidelne sledovať obsah zápisov v stavebnom denníku.
- 11.22 Denné záznamy za zhotoviteľa čitateľne zapisuje a podpisuje vedúci prác, prípadne jeho oprávnený zástupca. Vedúci prác je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavenisku trvalo prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy oprávnené osoby určené podľa zoznamov a platných predpisov.
- 11.23 Stavebný denník sa vedie na stavenisku odo dňa prevzatia staveniska do dňa písomného odovzdania a prevzatia diela. Rovnopis a 1. kópiu stavebného denníka archivuje objednávateľ.

- 11.24 Zodpovedný zástupca objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného diela, životy alebo zdravie zamestnancov na stavenisku, ak je ohrozená bezpečnosť letovej prevádzky, alebo hrozia iné vážne škody. Inak nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa.
- 11.25 Odovzdaním staveniska zhotoviteľovi sa zhotoviteľ stáva správcom týchto priestorov a v celom rozsahu zodpovedá za tieto priestory. Počas doby realizácie diela je povinný na svoje náklady zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce vrátane projektu BOZP stavby. Osobné údaje koordinátora BOZP (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) ako aj jeho oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi Referátu BOZP OPP email: [REDACTED], tel. č. [REDACTED], [REDACTED] alebo mob. č. [REDACTED]) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím prác.
- 11.26 Zhotoviteľ stavby je povinný vopred poslať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej „SZČO“) pred začatím práce podľa odovzdaného zoznamu na školenie a oboznámenie o BOZP a OPP u objednávateľa, pričom termín dohodne vopred s Referátom BOZP OPP objednávateľa. V prípade nástupu nových zamestnancov a/alebo iných osôb konajúcich pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov na stavenisko je zhotoviteľ povinný tieto osoby vopred nahlásiť na Referát BOZP OPP objednávateľa a až po absolvovaní oboznámenia a preškolenia môžu vstupovať do priestorov staveniska a priestorov objednávateľa a podieľať sa na činnostiach zhotoviteľa.
- 11.27 V priestoroch objednávateľa nie sú oprávnení zamestnanci a subdodávateľia zhotoviteľa manipulovať so zariadeniami objednávateľa, sú povinní dodržiavať vyznačené zákazy, príkazy a tiež požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány príp. pokyny vyhlásené domácim rozhlasom v objekte.
- 11.28 Zhotoviteľ je povinný vopred najmenej 48 hodín objednávateľovi - Referátu BOZP OPP oznámiť činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak by ich vykonával ako aj predložiť k týmto činnostiam potrebnú dokumentáciu (oprávnenie osôb na výkon týchto činností, písomný pokyn, povolenie pri zváraní a rezaní kovov, dokumentáciu o školení osôb, ktoré budú túto činnosť vykonávať, odbornú prípravu členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a pod.) ako aj vopred preukázať zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich pre takéto činnosti z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Toto ustanovenie nevyklučuje plnú zodpovednosť zhotoviteľa za zabezpečenie týchto činností v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj zabezpečenie plnej náhrady škody objednávateľovi, ktorá by vznikla pri takýchto činnostiach a následkom likvidácie napr. požiaru, ktorý by vznikol pri alebo po ich vykonávaní resp. v súvislosti s ich vykonávaním.
- 11.29 Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vopred vykonávanie činností pri zhotovovaní diela napr. inštaláciu požiarnych uzáverov, vyhotovovanie prestupov, požiarnych vedení a trás a pod., pričom zhotoviteľ je povinný pri vymienení oznámení ďalších činností nahlasovať aj tie.
- 11.30 Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať:
- doporučenou poštou;
 - zápisom podpísaným oboma stranami;
 - zápisom do stavebného denníka;
 - elektronickou poštou (právne nezáväzná forma komunikácie, pokiaľ nebude potvrdená listom).

11.31 Dielo sa bude realizovať počas nepretržitého poskytovania letových prevádzkových služieb. Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť rešpektovať a prispôbiť tomu všetky svoje činnosti a postupy.

11.32 Zodpovedným zamestnancom objednávateľa je:

- Pre veci zmluvné: [REDACTED]
- Pre veci technické: [REDACTED]

11.33 Zodpovedným zamestnancom zhotoviteľa je:

- Pre veci zmluvné: [REDACTED]
- Pre veci technické: [REDACTED]

11.34 Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetky jeho mobilné prostriedky, ktoré vstúpia do oploteného areálu letiska, hasiacim prístrojom, svetelným zábleskovým zariadením (maják s oranžovou farbou záblesku) a ak nemajú výraznú farbu karosérie (napr. žltú alebo oranžovú) tak musia byť vybavené výstražným značením na streche, prípadne na prednej časti a v prípade, ak na vozidle nie je možné z konštrukčných dôvodov plochu umiestniť na streche, tak na bokoch vozidla. Signálne plochy majú šachovnicový tvar zložený z kombinácie bielej reflexnej farby a oranžovej návestnej alebo červenej rumelkovej farby. Signálna plocha na streche alebo prednej/zadnej časti vozidla má šachovnicový vzor tvaru štvorca s dĺžkou strany plochy min. 60 cm. Strana štvorca šachovnice musí mať dĺžku minimálne 20 cm. Rohové štvorce šachovnice musia byť tmavšej farby. Signálne plochy na bokoch vozidla majú šachovnicový vzor tvaru štvorca s dĺžkou strany plochy min. 36 cm, pričom strana jedného štvorca šachovnice má rozmer minimálne 12 cm. Rohové štvorce šachovnice musia byť tmavšej farby.

Článok 12.

Povinnosti zhotoviteľa na odbornú spôsobilosť

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby účinnosti zmluvy mať platné oprávnenia, doklady a certifikáty o odbornej spôsobilosti na všetky požadované činnosti podľa predloženej technickej špecifikácie najmä, nie však výlučne:

12.1.1 platné oprávnenia, preukazy, doklady, osvedčenia alebo preškolenia na vykonávanie odborných činností nevyhnutných na plnenie predmetu zmluvy ak ich platné všeobecne záväzné právne predpisy alebo výrobca zariadení požadujú a to najneskôr pred pripájaním nových technologických celkov do existujúcich prevádzkových systémov, resp. pred výkonom akýchkoľvek činností zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, ktoré môžu mať vplyv na prevádzkové systémy objednávateľa (napríklad napájanie, a pod.) alebo na protipožiarnu bezpečnosť a BOZP objednávateľa,

12.1.2 oprávnenie dodávateľa na výkon činnosti S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu zariadení E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000V pre triedu objektov A objekty bez nebezpečenstva výbuchu vydané podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),

- 12.1.3 pre minimálne jedného pracovníka dodávateľa osvedčenie na výkon činnosti E revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov v rozsahu zariadení E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000V pre triedu objektov A objekty bez nebezpečenstva výbuchu vydané podľa §14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.,
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa Článku 2. bod 2.1 tejto zmluvy, v lehote uvedenej v Článku 5. tejto zmluvy, a to vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť, odborne spôsobilými osobami so zodpovedajúcou zdravotnou spôsobilosťou a s náležitou odbornou starostlivosťou so zárukou kvality, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platných oprávnení, dokladov, osvedčení, preukazov alebo po určenom preškolení.
- 12.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo počas celej doby účinnosti zmluvy kedykoľvek požiadať zhotoviteľa prostredníctvom zodpovedného zamestnanca objednávateľa pre veci technické o predloženie platných oprávnení, preukazov, dokladov, osvedčení alebo potvrdení o preškolení na vykonávanie odborných činností nevyhnutných na realizáciu diela, ktoré môžu mať vplyv na prevádzkové systémy objednávateľa napríklad napájanie, a pod.).
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky požadované oprávnenia, doklady, preukazy, osvedčenia, potvrdenia a certifikáty ako kópie, v prípade potreby na žiadosť určenej osoby objednávateľa aj ich originál alebo overenú kópiu.

Článok 13.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 13.1 Odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom sa rozumie úspešné dokončenie diela pre všetky stavebné objekty v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, vykonaním komplexných skúšok uvedených v projektovej dokumentácii s následným preukázaním projektovaných parametrov nových nainštalovaných zariadení a odovzdání príslušnej sprievodnej dokumentácie. O úspešnom ukončení komplexných skúšok sa vyhotoví protokol, ktorý bude súčasťou odovzdania diela.
- 13.2 Dielo sa bude odovzdávať v zmysle Článku 5.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný po úspešnom ukončení komplexných skúšok písomne prostredníctvom stavebného denníka 2 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 13.4 Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak nemá vady a nedorobky a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, certifikáty, vyhlásenia o parametroch, osvedčenia o konštrukciách, protokoly o vykonaných skúškach, revízne správy vyhradených elektrických zariadení a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu určenom v tejto zmluve. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 13.5 K záverečnému protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá tieto doklady:

- dodacie listy,
- záručné listy,
- vyhlásenia o parametroch, vyhlásenia o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov o uvádzaní výrobkov na trh vyžadujú,
- certifikáty a protokoly o skúškach použitých výrobkov a materiálov,
- správy o úradných skúškach, o odborných prehliadkach a skúškach vyhradených elektrických zariadení v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
- sprievodnú dokumentáciu v zmysle príslušnej technickej správy,
- 4x projekt skutočného vyhotovenia v písomnej forme a 2x v digitálnej forme v editovateľných formátoch *.dwg, *.doc, *.xls a *.pdf,
- doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, vyprodukovanými počas realizácie diela,
- stavebný denník (rovnopis a 1. kópiu),
- zápisy a protokoly o vykonaných skúškach,
- Protokolárne odovzdanie stavebných konštrukcií (káblové trasy) pred ich zakrytím, zakopaním po jednotlivých úsekoch
- overené geometrické plány na zameranie a zapísanie vecných bremien po jednotlivých katastrálnych územiach.
- doklady k oceľovým konštrukciám:
 - Trvale prekryté časti konštrukcie sa budú preberať ešte pred ich zakrytím, pričom pri prevzatí konštrukcie bude vyhotovená a dodaná objednávateľovi fotodokumentácia s odmeranými hlavnými rozmermi.
 - V odovzdávanej dokumentácii musí byť predpísaná trieda zhotovenia, druh ochrany proti korózii, tolerancia, potrebné na splnenie technologických parametrov prevádzky, pre ktorú konštrukcia slúži.
- ďalšie doklady podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. osvedčenie o požiarnej konštrukcii, o odbornej spôsobilosti od výrobcov zariadení a pod.).

Všetky požadované doklady musia byť predložené zhotoviteľom v slovenskom jazyku a musia byť platné. Všetky certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, skúšky a osvedčenia materiálov a dodávok a pod. si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.

13.6 O protokolárnom odovzdaní a prevzatí hotového diela spíše zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po dvoch (2) vyhotoveniach dostane každá zmluvná strana.

13.7 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje okrem základných údajov o diele aj:

- zhodnotenie kvality odovzdávaného diela,
- konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu,
- dodatočne požadované práce,
- súpis odovzdávaných dokladov,
- termíny a lehotu realizácie,
- konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a uvedenie dĺžky jej trvania,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

13.8 Všetky náklady, ktoré vyplývajú z prípadného neúspešného odovzdávacieho a preberacieho konania znáša zhotoviteľ aj s príslušným odsunom začatia plynutia záručnej doby.

Článok 14.

Záručná doba, postup zmluvných strán pri vadách diela

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo bude 60 mesiacov (5 rokov) okrem výrobkov a komponentov, na ktoré ich výrobcovia určujú záručnú dobu kratšiu, nie však menej ako 24 mesiacov. Záručná doba môže byť uplatnená aj v zmysle požiadaviek technických správ, kde je na niektoré výrobky uplatnená individuálna záručná doba, nie však menej ako 24 mesiacov.
- 14.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, t. j. protokolárnym odovzdaním diela zhotoviteľom a protokolárnym prevzatím diela objednávateľom.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania záručnej doby vykonať požadované servisné úkony v zmysle príslušných technických správ a akceptovať výkon servisu zariadení odborne spôsobilými zamestnancami objednávateľa, alebo odborne spôsobilými osobami externého poskytovateľa servisných služieb.
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky zistené vady diela, ak objednávateľ takýto nedostatok ohlásí, najneskôr do troch (3) pracovných dní, alebo v prípade väd, ktoré z technických dôvodov vyžadujú dlhšiu dobu na ich odstránenie, v lehote určenej písomne po dohode s objednávateľom.
- 14.5 Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby. Objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky z väd diela kedykoľvek počas trvania záručnej doby a takto uplatnené nároky budú považované za uplatnené včas, bez ohľadu na to, že chyby sa mohli zistiť skôr.
- 14.6 V oznámení o reklamovanej vade musí objednávateľ vady, resp. nedostatky popísať a uviesť ako sa prejavujú.
- 14.7 Právo na odstránenie vady, resp. nedostatku musí byť uplatnené písomne u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak toto právo zaniká. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy a písomného potvrdenia zodpovedného zástupcu objednávateľa o jej odstránení sa do záručnej doby nezapočítava. O túto dobu sa predĺži záručná doba na vykonané dielo.
- 14.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup k odstráneniu reklamovaných väd na diele.
- 14.9 V prípade neplnenia záručných záväzkov si objednávateľ vyhradzuje právo na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť u inej spoločnosti.
- 14.10 Objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky z väd diela v prípade skrytých väd diela počas celej záručnej doby.

Článok 15.

Zmluvné pokuty, náhrada škody, odškodnenie

- 15.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním diela, je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
- 15.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných väd oproti termínu stanovenému podľa Článku 14. bod 14.4 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi právo

- fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
- 15.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každý začatý deň porušovania ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa ustanovení Článku 6. bod 6.8 Článku 7. bod 7.1 a bod 7.6, Článku 9 bod 9.3, Článku 10. bod 10.14, Článku 11. bod 11.5, bod 11.14, bod 11.19 a bod 11.27, Článku 12. bod 12.1, 12.2 a bod 12.4 a Článku 18. bod 18.8, a to za každé jednotlivé porušenie.
- 15.4 Ak sa na plnení predmetu zmluvy bude podieľať subdodávateľ neuvedený v zozname subdodávateľov, alebo subdodávateľ vopred neodsúhlasený objednávatelom, má objednávatel právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR za každého takéhoto subdodávateľa.
- 15.5 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje splniť dotknutú povinnosť ani povinnosť uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávatelovi zo strany príslušných orgánov štátnej správy.
- 15.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť objednávatelovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej objednávatelom.
- 15.7 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu, teda aj nad rámec sumy zmluvnej pokuty.
- 15.8 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne neodborným zásahom, porušením povinností, z nedbanlivosti alebo nerešpektovaním platných právnych predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavebných dielach, už inštalovaných zariadeniach objednávatela alebo Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, miestnostiach resp. objektoch susediacich so staveniskom, káblových vedeniach, a pod. v súvislosti s plnením povinností a záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s konaním, nekonaním alebo z nedbanlivosti zhotoviteľa a ich následkom (napr. škody vzniknuté likvidáciou prípadného požiaru a pod.). Takéto škody bude v plnej výške znášať zhotoviteľ.
- 15.9 Zhotoviteľ má uzavretú zmluvu na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody na poistnú sumu vo výške minimálne 1.000.000,-EUR bez DPH, resp. vo výške ceny diela bez DPH podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby účinnosti tejto zmluvy túto poistnú zmluvu obnovovať tak, aby bola platná po celú dobu účinnosti tejto zmluvy vrátane záručnej doby.

Článok 16.

Vyššia moc

- 16.1 Okolnosti, ktoré zbavujú zodpovednosti:
- 16.1.1 Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností v prípadoch vyššej moci jej priamych alebo nepriamych následkov. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú dlhšie ako štrnásť (14) dní, zmluvné strany sú povinné dodržať zmluvu, pričom sa lehoty predlžujú o dobu trvania vyššej moci.
- 16.1.2 Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy v dôsledku zo strany zmluvných strán nepredvídaných, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, pandémie, výluky a štrajky, ktoré sa neobmedzujú len na jeden závod.

- 16.1.3 Za prípady vyššej moci sa však nepovažuje omeškanie dodávky zo strany subdodávateľa.
- 16.1.4 V prípade vyššej moci sú zmluvné strany povinné písomne sa informovať v priebehu dvoch (2) dní o vzniku a zániku vyššej moci a tiež ich písomne potvrdiť a preukázať. V prípade nedodržania tejto povinnosti nemajú zmluvné strany právo odvolávať sa na vyššiu moc.

Článok 17.

Postúpenie práv a prevod práv

- 17.1 Žiadna zmluvná strana nesmie postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na akúkoľvek tretiu stranu. Takýto súhlas zmluvná strana neodôvodnene neodoprie.

Článok 18.

Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác

- 18.1 V prípade porušenia zmluvných povinností uvedených v tomto článku zmluvy niektorou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
- 18.2.1 keď zhotoviteľ do troch (3) dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác;
 - 18.2.2 keď zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku podľa Článku 7 bod. 7.1;
 - 18.2.3 keď zhotoviteľ nedodrží termín dokončenia diela o viac ako dva (2) týždne;
 - 18.2.4 z dôvodu opustenia staveniska alebo bezdôvodného zastavenia prác zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôbiť sa ustanoveniam zmluvy alebo požiadavkám objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy by zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky;
 - 18.2.5 keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených;
 - 18.2.6 ak sa pre zhotoviteľa stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. Za podstatné zmluvné povinnosti zhotoviteľa sa považuje plnenie podľa tejto zmluvy v požadovanej kvalite a v požadovaných lehotách, alebo strata oprávnení na výkon činností uvedených v Článku 12. bod 12.1 alebo nepredloženie dokladov a oprávnení podľa Článku 12. bod 12.3 a bod 12.4;
 - 18.2.7 ak zhotoviteľ postúpi zmluvu bez schválenia objednávateľa;
 - 18.2.8 ak sa zhotoviteľ stane insolventným;
 - 18.2.9 ak zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nesplnia požiadavku objednávateľa uvedenú v Článku 11. bod. 11.26 Článku 12. bod 12.3 tejto zmluvy;
 - 18.2.10 ak zhotoviteľ závažne poruší zmluvu v zmysle Článku 11. bod. 11.12.
- Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody.
- 18.3 Objednávateľ má aj v prípadoch uvedených v bode 18.2 právo si uplatniť náhradu škody.
- 18.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s objednávatelom ak objednávatel nezaplatí zmluvnú cenu viac ako tridsať (90) dní po lehote splatnosti a to i napriek opakovanej písomnej výzve zo strany zhotoviteľa.

- 18.5 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce na diele zaplatiť vrátane materiálov preukázateľne objednaných na plnenie diela. Tieto materiály je zhotoviteľ povinný bezodkladne odovzdať objednávateľovi.
- 18.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 18.7 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán.
- 18.8 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní opustí a vyprázdni stavenisko.
- 18.9 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane doporučeným listom, ak tá v predtým stanovenej lehote nevykonala nápravu.

Článok 19.

Prechod nebezpečenstva škody na diele a vlastníctva k dielu

- 19.1 Prechod nebezpečenstva škody na diele prechádza na objednávateľa podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, podľa Článku 13. tejto zmluvy.
- 19.2 Vlastnícke právo k celému zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

Článok 20.

Riešenie sporov

- 20.1 V prípade, že z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú spory, zmluvné strany sa zaväzujú, že sa najprv pokúsia také spory pokojne urovnať priateľskou dohodou. Ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť dohodu v riešení rozporov, budú všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, riešené príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky, podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Článok 21.

Ochrana osobných údajov

- 21.1 V prípade, ak dôjde k náhodnému prístupu zhotoviteľa k osobným údajom, ktoré spracováva objednávateľ, je zhotoviteľ povinný zachovávať mlčanlivosť o týchto osobných údajoch a súčasne sa zaväzuje dodržiavať nasledovné pokyny:
- 21.1.1 osobné údaje nevyužiť pre vlastnú potrebu, pre potreby vlastnej podnikateľskej činnosti a ani na účely reklamy,
 - 21.1.2 neposkytnúť, nesprístupniť ani nezverejniť osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám alebo neoprávneným osobám, okrem prípadov, kedy poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov stanovuje právo Európskej únie alebo právne predpisy SR alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 - 21.1.3 nekopírovať, neskenovať, nerozširovať, ani inak nespracúvať osobné údaje,

- 21.1.4 dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov s cieľom chrániť osobné údaje tak, aby nedošlo k ich strate, poškodeniu, prezradeniu alebo zneužitiu treťou osobou alebo inému neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej manipulácii s osobnými údajmi, a to aj nedbanlivostným konaním.
- 21.2 Povinnosť mlčanlivosti osobných údajov nie je časovo obmedzená a trvá aj po skončení trvania zmluvy.
- 21.3 Povinnosť mlčanlivosti neplatí:
- 21.3.1 ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, alebo
- 21.3.2 vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Článok 22.

Subdodávky, subdodávateľia

- 22.1 V prípade, že zhotoviteľ bude realizovať časť dodávky prostredníctvom subdodávateľa je povinný sa riadiť nasledovnými bodmi tejto zmluvy:
- 22.1.1 Za subdodávateľa sa považuje každý jednotlivý hospodársky subjekt, ktorý uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto zmluvy.
- 22.1.2 Každý subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu v súlade so zákonom číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vznikla povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 22.1.3 Zoznam subdodávateľov tvorí **Prílohu č. 5 – Vyhlásenie k subdodávkam**.
- 22.1.4 Ak zhotoviteľ nemá v úmysle využívať subdodávateľov a neuviedol pred podpisom tejto zmluvy objednávateľovi žiadnych subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má v úmysle poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť, je povinný poskytnúť všetky plnenia podľa tejto zmluvy osobne, resp. prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov.
- 22.1.5 Ak má zhotoviteľ úmysel použiť na plnenie tejto zmluvy alebo jej časti subdodávateľov, je zhotoviteľ oprávnený použiť na plnenie tejto zmluvy len subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov.
- 22.1.6 Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ak sú títo zapísaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ im v súlade so zákonom číslo

315/2016 Z. z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vznikla povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

22.1.7 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi pred zmenou subdodávateľa alebo pred doplnením nového subdodávateľa, predložiť písomnú žiadosť o udelenie súhlasu so zmenou alebo doplnením subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne:

22.1.7.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

22.1.7.2 podiel plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa a konkrétnu časť plnenia,

22.1.7.3 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.

22.1.8 Povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy platia rovnako aj pre zamestnancov subdodávateľov, pokiaľ sa týkajú činností vykonávaných podľa tejto zmluvy prostredníctvom zamestnancov subdodávateľa alebo osôb konajúcich pre subdodávateľa.

22.1.9 Odsúhlasenie výberu subdodávateľov objednávateľom alebo poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy a zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.

22.1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby podmienky uvedené v Článku 10., Článku 11. a v Článku 12. boli dodržané aj pri zabezpečovaní činností subdodávateľom a jeho pracovníkmi alebo osobami, konajúcimi v jeho mene.

22.1.11 Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku zmluvy aj v prípade, ak pred podpisom tejto zmluvy nepredložil objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že plnenie podľa tejto zmluvy poskytne osobne a následne vznikla potreba poskytnúť plnenie alebo jeho časť subdodávateľom.

Článok 23.

Záverečné ustanovenia

23.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky ďalšie právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, ale s ňou priamo súvisia alebo z nej vyplývajú, sa budú riadiť platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa k predmetu a obsahu tejto zmluvy.

23.2 Zmluvu bude možné meniť alebo dopĺňať len písomnými, postupne číslovanými dodatkami, schválenými obidvoma zmluvnými stranami.

23.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. Zákonník práce, zákon o nelegálnej práci, zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, zákon o ochrane osobných údajov, nariadenie GDPR, zákon o kybernetickej bezpečnosti atď.), a tiež mať splnené všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, ktoré podmieňujú uzavretie zmluvy (napr. registrácia v registri

partnerov verejného sektora a pod.) a v prípade, že objednávateľovi vzniknú v dôsledku porušenia týchto predpisov zo strany zhotoviteľa akékoľvek škody, výdavky alebo mu budú uložené sankcie, tieto sa zhotoviteľ zaväzuje v plnom rozsahu objednávateľovi zaplatiť. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený započítať tieto výdavky voči pohľadávkam zhotoviteľa.

23.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy, a to nasledovné:

Príloha č. 1 – Rozpočet

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

Príloha č. 3 – Harmonogram

Príloha č. 4 – Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi a vstupného režimu osôb a vozidiel + DOPADOVÁ ANALÝZA 06/2019

Príloha č. 5 – Vyhlásenie k subdodávkam

Príloha č. 6 – Poučenie tretích strán

23.5 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že tento právny úkon urobili slobodne a voľne a podpísaním tejto zmluvy vyslovujú s ňou svoj súhlas. Súčasne zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

23.6 Ak posledný deň lehoty určenej pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbližší nasledujúci pracovný deň.

23.7 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel a ekonomický cieľ, sledovaný uzavretím tejto zmluvy a dotknutým nahrádzaným ustanovením.

23.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčným programom LPS SR, š. p., ktorý je zverejnený na www.lps.sk a deklaruje dodržiavanie etických zásad a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade porušenia etických zásad zverejnených v Protikorupčnom programe LPS SR, š. p., je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.“

23.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) origináloch, dva (2) originály pre objednávateľa a dva (2) originály pre zhotoviteľa.

23.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

23.11 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“), ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.

V Bratislave, dňa [REDACTED]

V Košiciach, dňa [REDACTED]

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

[REDACTED]

PhDr. Pavel Kelemen, PhD.
poverený výkonom funkcie riaditeľa

[REDACTED]

Ing. Eduard Nemec
výkonný riaditeľ, na základe poverenia

Rozpočet.

Výkaz výmer nemusí nutne obsahovať všetky potrebné práce a položky potrebné k zhotoveniu diela.

Správnosť „výkazu výmer“ vo vzájomnom porovnaní s „projektovou dokumentáciou“, je budúci dodávateľ povinný overiť si počas procesu obstarávania. V prípade že k takémuto konaniu nedošlo, má sa za to, že cena za dielo vychádzajúca z dodaného výkazu výmer obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné na realizáciu diela podľa hore uvedenej projektovej dokumentácie. Žiadne opomenutia dodávateľa pri zostavovaní rozpočtu z ktorého vychádza cena za dielo nebudú dôvodom na jej zvyšovanie.

Rozpočet obsahuje aj **Overené geometrické plány** na zameranie a zapísanie vecných bremien po jednotlivých katastrálnych územiach na stavbu uvedenú v bode 2.2.3 zmluvy .

Rozpočet stavby

Vonkajšie káblové rozvody pre zariadenia LPS SR, š.p. na Letisku
M.R.Štefánika v BA,
časť : 3.etapa

PS č.1C- Zemné práce – káblová ryha montáž (súčasť PS č.1C)

Por.č.	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
1	Prípravné práce, vytýčenie trasy a inžinierskych sietí	m	1,20	14560,00	17 472,00
2	Komplet výkop a záhrn káblovej ryhy v hornine 3	m3	27,79	3660,00	101 711,40
	NOVÁ POLOŽKA - Komplet výkop a záhrn káblovej ryhy v hornine 4	m3	27,79	80,64	2 240,99
3	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,00	1100,00	1 100,00
4	Komplet výkop a záhrn káblovej ryhy v hornine 4	m3	27,79	2465,00	68 502,35
5	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,00	700,00	700,00
6	Preosiatie zeminy na káblové lôžko a vyrovnanie kabel.lôžka	m2	2,20	5964,00	13 120,80
7	Pretláčanie chráničiek	m	63,00	200,00	12 600,00
	NOVÁ POLOŽKA - Pretláčanie chráničiek vrátane PE DN110	m	72,00	189,69	13 657,68
8	Riadený pretlak	m	63,00	250,00	15 750,00
	NOVÁ POLOŽKA - Riadený pretlak vrátane PE DN110	m	72,00	-10,80	- 777,60
9	Spätná úprava povrchu kábelovej ryhy	m2	2,20	5964,00	13 120,80
	NOVÁ POLOŽKA - Spätná úprava povrchu kábelovej ryhy	m2	2,20	847,17	1 863,77
10	Osiatie povrchu kábelovej ryhy trávou	m2	0,70	5964,00	4 174,80
	NOVÁ POLOŽKA - Osiatie povrchu kábelovej ryhy trávou	m2	0,70	847,17	593,02
11	Pokládka zákrytovej dosky	m	0,30	14200,00	4 260,00
12	Výstražná fólia 33cm - pokládka	m	0,10	14200,00	1 420,00
13	Odvoz a likvidácia odpadu v zmysle platnej legislatívy vrátane prebytočného materiálu	m3	68,52	300,00	20 556,00
14	Koordinátor BOZP	komplet	23322,00	1,00	23 322,00

Spolu: 315 388,01 €

materiál (súčasť PS č.1C)

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
15	PE chránička DN110	m	9,00	450,00	4 050,00

16	Plastová zákrytová doska 1m	ks	1,17	13900,00	16 263,00
17	Výstražná fólia 33cm - materiál	m	0,07	13900,00	973,00

Spolu: **21 286,00 €**

**PS č.2C - Výstavba káblových komôr
montáž (súčasť PS č.2C)**

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
18	Výkop zeminy pre osadenie káblových komôr	m3	28,00	125,00	3 500,00
	Výkop zeminy pre osadenie káblových komôr	m3	28,00	91,75	2 569,00
19	Zriadenie paženia a rozopretia stien výkopu	ks	65,00	25,00	1 625,00
20	Zriadenie paženia komory počas zhutnenia	ks	65,00	25,00	1 625,00
21	Osadenie KK Ultima, vrátane podbetónovania, zhutnenia, drenáže, vyvrtania otvorov a osadenia poklopu	ks	430,50	25,00	10 762,50
22	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh a KK	ks	41,60	25,00	1 040,00
23	Odvoz prebytočného materiálu na skládku	m3	68,52	100,00	6 852,00
	NOVÁ POLOŽKA - Odvoz prebytočného materiálu na skládku	m3	68,52	125,00	8 565,00
24	Koordinátor BOZP	komplet	1775,00	1,00	1 775,00

Spolu: **38 313,50 €**

materiál (súčasť PS č.2C)

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
25	Komora Ultima 1310x1310 mm - (7x segment 150 mm)	ks	1548,80	25,00	38 720,00
26	Liatinový poklop	ks	2316,60	25,00	57 915,00
27	Štrkodrva 0/32	m3	58,41	100,00	5 841,00
	NOVÁ POLOŽKA- Štrkodrva 0/32	m3	58,41	112,50	6 571,13

Spolu: **109 047,13 €**

**PS č.3C - Výstavba multirúr a optických káblov
montáž (súčasť PS č.3C)**

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
28	Zafúknutie optického minikábla	m	0,70	128341,00	89 838,70
	NOVÁ POLOŽKA - Zafúknutie optického minikábla	m	0,70	5389,00	3 772,30
29	Zatiahnutie multirúry a HDPE rúry do káblovodu a do chráničiek	m	1,20	3100,00	3 720,00
30	Uloženie multirúry 7x12/8mm a chráničky PE DN 110	m	1,38	54730,00	75 527,40
	NOVÁ POLOŽKA - Uloženie multirúry 7x12/8mm a chráničky PE DN 110	m	1,38	-11806,45	Nezahrnuté do súčtu na základe žiadosti objednávateľa o doplnenie cenovej ponuky
31	Zváranie optického kábla	zvar	10,00	2760,00	27 600,00
	NOVÁ POLOŽKA - Zváranie optického kábla	zvar	10,00	-156,00	- 1 560,00
32	Zafúknutie zväzku 5ks MT10/8mm do jestvujúcich rúr	m	2,00	4180,00	8 360,00
33	Inštalácia optického rozvádzača - 48vl. BIDI 48 (osadenie vonkajšieho kabinetu, kompletná zostava)	ks	180,00	3,00	540,00

34	Inštalácia optického rozvádzača - 48vl. BIDI 48 (osadenie nástenného OR, kompletná zostava)	ks	80,00	8,00	640,00
35	Demontáž existujúceho stojanového rozvádzača 42 U vrátane odvozu na skládku	ks	120,00	1,00	120,00
36	Inštalácia stojanového rozvádzača - racku 42U	ks	150,00	3,00	450,00
37	Inštalácia ODF 24vl. 19" 1U do racku	ks	25,00	23,00	575,00
	NOVÁ POLOŽKA - Inštalácia ODF 24vl. 19" 1U do racku	ks	25,00	60,00	1 500,00
38	Inštalácia ODF 48vl. 19" 2U do racku	ks	25,00	3,00	75,00
	NOVÁ POLOŽKA - Inštalácia ODF 48vl. 19" 2U do racku	ks	25,00	-3,00	- 75,00
39	Inštalácia ODF 96vl. 19" 4U do racku	ks	25,00	8,00	200,00
	NOVÁ POLOŽKA - Inštalácia ODF 96vl. 19" 4U do racku	ks	25,00	-8,00	- 200,00
40	Doplnenie 1U horizontálneho káblového organizéra	ks	7,50	18,00	135,00
41	Inštalácia optickej spojky Coyote Dome (inštalácia spojky a všetkých jej súčastí vrátane uchytenia na stenu)	ks	35,00	12,00	420,00
	NOVÁ POLOŽKA - Inštalácia optickej spojky Coyote Dome (inštalácia spojky a všetkých jej súčastí vrátane uchytenia na stenu)	ks	35,00	-7,00	- 245,00
42	Inštalácia spojky, koncovky redukcie 12/10 mm a 10/8 mm	ks	1,50	1100,00	1 650,00
43	Križ optickej rezervy - montáž s uchytením na stenu	ks	7,50	200,00	1 500,00
44	Vyvedenie vlákna v kazete	vlákno	1,00	1920,00	1 920,00
	NOVÁ POLOŽKA - Vyvedenie vlákna v kazete	vlákno	1,00	580,00	580,00
45	Ukončenie OK v optickom rozvádzači	vlákno	1,20	1584,00	1 900,80
	NOVÁ POLOŽKA - Ukončenie OK v optickom rozvádzači	vlákno	1,20	108,00	129,60
46	Meranie OK obojstranné	vlákno	18,00	1584,00	28 512,00
	NOVÁ POLOŽKA - Meranie OK obojstranné	vlákno	18,00	-474,00	- 8 532,00
47	Spracovanie meracích protokolov a dodanie investorovi	zvar	0,50	2760,00	1 380,00
48	Prieryzy stavebných konštrukcií a utesnenie vstupných otvorov izolačnou penou	ks	130,00	30,00	3 900,00
49	Protipožiarne utesnenie otvorov do priemeru 150 mm	ks	80,00	30,00	2 400,00
50	Inštalácia zľabu vo vnútri budov vrátane materiálu	m	7,50	500,00	3 750,00
51	Vnútorňé vedenie káblov a trubičiek	m	2,75	1500,00	4 125,00
52	Marker označovací - montáž	ks	1,00	100,00	100,00
53	Porealizačné zameranie trasy kábla	m	0,95	15600,00	14 820,00
	NOVÁ POLOŽKA - Porealizačné zameranie trasy kábla - duplicitná položka	m	0,95	-15600,00	- 14 820,00
54	Náklady spojené so vstupom vozidiel, mechanizmov a pracovníkov do areálu letiska vrátane prípadného čistenia komunikácií, Koordinátor BOZP	komplet	81653,30	1,00	81 653,30
Spolu:			336 362,10 €		

materiál (súčasť PS č.3C)

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
55	Minikábel optický SMF D 24vl vonkajší	m	0,64	111456,00	71 331,84
	NOVÁ POLOŽKA -Minikábel optický SMF D 24vl vonkajší	m	0,64	4989,00	3 192,96
56	Minikábel optický SMF D 48vl vonkajší	m	0,99	12445,00	12 320,55
57	Minikábel optický SMF D 96vl vonkajší	m	1,63	4430,00	7 220,90
	NOVÁ POLOŽKA -Minikábel optický SMF D 96vl vonkajší	m	1,63	400,00	652,00
58	Optická spojka Coyote Dome (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	140,25	14,00	1 963,50
	NOVÁ POLOŽKA -Optická spojka Coyote Dome (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	140,25	-7,00	- 981,75
59	Držiak spojky Coyote Dome na stenu	ks	36,76	14,00	514,64
	NOVÁ POLOŽKA -Držiak spojky Coyote Dome na stenu	ks	36,76	-7,00	- 257,32

60	Multirúra 7x12/8mm č.1 (červená)	m	2,16	12965,00	28 004,40
	NOVÁ POLOŽKA -Multirúra 7x12/8mm č.1 (červená)	m	2,16	-54,62	- 117,98
61	Multirúra 7x12/8mm č.2 (oranžová)	m	2,16	13205,00	28 522,80
	NOVÁ POLOŽKA -Multirúra 7x12/8mm č.2 (oranžová)	m	2,16	187,26	404,48
62	Multirúra 7x12/8mm č.3 (zelená)	m	2,16	14900,00	32 184,00
	NOVÁ POLOŽKA -Multirúra 7x12/8mm č.3 (zelená)	m	2,16	-5338,31	Nezahrnuté do súčtu na základe žiadosti objednávateľa o doplnenie cenovej ponuky
63	Multirúra 7x12/8mm č.4 (modrá)	m	2,16	12350,00	26 676,00
	NOVÁ POLOŽKA -Multirúra 7x12/8mm č.4 (modrá)	m	2,16	-6292,23	Nezahrnuté do súčtu na základe žiadosti objednávateľa o doplnenie cenovej ponuky
64	PE chránička 110 mm	m	2,22	910,00	2 020,20
65	Mikrotrubička 10/8mm č.1	m	0,17	4180,00	710,60
66	Mikrotrubička 10/8mm č.2	m	0,17	4180,00	710,60
67	Mikrotrubička 10/8mm č.3	m	0,17	4180,00	710,60
68	Mikrotrubička 10/8mm č.4	m	0,17	4180,00	710,60
69	Mikrotrubička 10/8mm č.5	m	0,17	4180,00	710,60
70	Korugovaná chránička DN 110	m	4,50	200,00	900,00
71	Stojanový Rack ODF - 42U 700x1000 - obojstranný (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	704,52	2,00	1 409,04
72	Stojanový Rack ODF - 42U 600x800 (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	479,04	1,00	479,04
73	Spojka trubičková 12mm	ks	1,98	400,00	792,00
74	Koncovka trubičková 12mm	ks	1,12	200,00	224,00
75	Spojka trubičková 10mm	ks	1,82	250,00	455,00
76	Koncovka trubičková 10 mm	ks	0,96	100,00	96,00
77	Redukcia 12/10 mm	ks	2,18	150,00	327,00
78	ODF Bidi 48vl (nástenne prevedenie) + konstrukcia uchytenia na stenu	ks	245,16	8,00	1 961,28
79	ODF Bidi 48vl (samostatne stojaci) + kompletná zostava	ks	291,85	3,00	875,55
80	ODF 24 vl. 19'' 1U (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	484,48	23,00	11 143,04
	NOVÁ POLOŽKA -ODF 24 vl. 19'' 1U (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	484,48	60,00	29 068,80
81	ODF 48 vl. 19'' 2U (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	863,10	3,00	2 589,30
	NOVÁ POLOŽKA -ODF 48 vl. 19'' 2U (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	863,10	-3,00	- 2 589,30
82	ODF 96 vl. 19'' 4U (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	1663,10	8,00	13 304,80
	NOVÁ POLOŽKA -ODF 96 vl. 19'' 4U (vrátane kompletného príslušenstva)	ks	1663,10	-8,00	- 13 304,80
83	Horizontálny káblový organizér 1U	ks	13,32	18,00	239,76
84	Panel adaptérov	ks	9,12	150,00	1 368,00
	NOVÁ POLOŽKA -Panel adaptérov	ks	9,12	-150,00	- 1 368,00
85	Adaptér E2000/APC	ks	6,52	1584,00	10 327,68
	NOVÁ POLOŽKA - Adaptér E2000/APC	ks	6,52	-1726,00	- 11 253,52
86	Patchcord SMF E2000APC/E2000APC 5m	ks	19,97	792,00	15 816,24
87	Montážna pružina E2000	ks	0,10	1584,00	158,40
88	Ochrana zvaru teplotom zmršťiteľná 45mm	ks	0,17	2112,00	359,04
	NOVÁ POLOŽKA - Ochrana zvaru teplotom zmršťiteľná 45mm	ks	0,17	492,00	83,64
89	Kríž pre káblovú rezervu (základ + nadstavec)	ks	31,20	200,00	6 240,00
90	Marker označovací	ks	6,78	100,00	678,00

91	Pridružený materiál vrátane oceľových konštrukcií (pozink.) a kotviaceho materiálu	komplet	8500,00	1,00	8 500,00
----	--	---------	---------	------	----------

Spolu: 296 084,21 €

**PS č.4 C- Výstavba metalických káblov
montáž (súčasť PS č.4C)**

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
92	Zatiahnutie kábla 25XN x 0,8 do káblovodu a do chráničiek	m	1,70	1850,00	3 145,00
	NOVÁ POLOŽKA - Zatiahnutie kábla 25XN x 0,8 do káblovodu a do chráničiek	m	1,70	1415,00	2 405,50
93	Uloženie kábla 25XN x 0,8 do kábelovej ryhy	m	1,30	13125,00	17 062,50
94	Inštalácia kábelovej spojky XAGA 500 43/8-300	ks	60,00	8,00	480,00
95	Spájanie žíl	pár	1,50	400,00	600,00
96	Ukončenie metal.kábla na hlavnom rozvode s popisom káblov	pár	2,00	700,00	1 400,00
97	Inštalácia rozvodu na konštrukciu a uchytenie na stene objektu	ks	310,00	14,00	4 340,00
98	Inštalácia LSA pásu	ks	5,00	70,00	350,00
99	Jednosmerné merania na kábloch pred montážou	pár	4,50	350,00	1 575,00
100	Jednosmerné merania na kábloch po montáži	pár	4,50	350,00	1 575,00
101	Meranie uzemnenia kábla	ks	30,00	7,00	210,00
102	Meranie tlmenia	štvorka	20,00	175,00	3 500,00
103	Porealizačné geodetické zameranie trasy	m	0,58	15700,00	9 106,00
104	Kniha plánov	m	0,37	22070,00	8 165,90
105	Spracovanie meracích protokolov	pár	1,38	700,00	966,00
106	Uloženie napájacieho kábla CYKY 4x16 a CYKY 4x50 do kábelovej ryhy	m	1,20	19370,00	23 244,00
107	Zatiahnutie napájacieho kábla do chráničky alebo káblovodu	m	1,70	1870,00	3 179,00
	NOVÁ POLOŽKA - Zatiahnutie napájacieho kábla do chráničky alebo káblovodu	m	1,70	534,86	909,26
108	Inštalácia CYKY - J 4x25	m	1,50	30,00	45,00
109	Inštalácia teplom zmráziteľnej kábelovej spojky SVCZ do 50 mm ²	ks	15,00	70,00	1 050,00
110	Kompletné montážne oprácie elektrozařízení s ukončením NN káblov v rozvodných skrinách	ks	500,00	1,00	500,00
111	Revízie elektrozařízení	ks	900,00	1,00	900,00
112	Projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie, Koordinátor BOZP	komplet	6831,00	1,00	6 831,00

Spolu: 91 539,16 €

materiál (súčasť PS č.4C)

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
113	Kábel TCEPKPFLE 25XNx0,8	m	9,24	15350,00	141 834,00
	NOVÁ POLOŽKA - Kábel TCEPKPFLE 25XNx0,9	m	9,24	1415,00	13 074,60
114	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300 vrátane príslušenstva	ks	40,74	8,00	325,92
115	Rozpojovací pásik LSA 2/10	ks	4,42	70,00	309,40
116	Uzemňovací pásik 2/10	ks	11,95	70,00	836,50
117	Magazín nableskoistky	ks	13,56	70,00	949,20
118	Bleskoistky	ks	1,29	1400,00	1 806,00
119	Označovacie pásiky nepotlačené	ks	2,43	70,00	170,10
120	Popisný štítok k lište 2/10	ks	2,43	70,00	170,10
121	Montážny plech 2/10 10+1	ks	15,22	14,00	213,08

122	Kábel CYKY- J 4x16	m	6,43	12030	77 352,90
	NOVÁ POLOŽKA -Kábel CYKY- J 4x17	m	6,43	221,22	1 422,44
123	Kábel CYKY- J 4x50	m	20,02	9280	185 785,60
	NOVÁ POLOŽKA -Kábel CYKY- J 4x51	m	20,02	313,64	6 279,07
124	Kábel CYKY- J 4x25	m	11,32	30	339,60
125	Teplom zmraziteľná káblová spojka SVCZ do 50 mm ² vrátane kompletného príslušenstva	ks	22,84	70	1 598,80
126	Skriňa PRIS4 na betónový sokel, výbava 5xodpínač zvislý do 160, "V" svorky)	ks	829,00	5	4 145,00
127	Betónový základ pod skriňu PRIS 4	ks	144,00	5	720,00
128	Poistky PN do 125A	ks	6,15	75	461,25
129	Keramzit - výplň vývodov v PRIS	ks	10,37	5	51,85
130	Zvodič prepätia Saltek FLP B+C MAXI VS3	ks	390,67	9	3 516,03
131	Odpínač poistkový 160A/3	ks	49,10	9	441,90
132	Svorky	ks	4,80	9	43,20
133	Vývodky	ks	4,80	54	259,20
134	Poistky	ks	9,60	27	259,20
135	Skriňa IP43/20	ks	336,00	9	3 024,00
136	Podružný materiál pri inštalácii PRIS	komplet	50,00	5	250,00

Spolu:

445 638,95 €

Vonkajšie káblové rozvody pre zariadenia Hydrometeorologického ústavu na Letisku M.R.Štefánika v BA,
časť : 3.etapa

**PS č.1L - Zemné práce – kábelová ryha
montáž (súčasť PS č.1L)**

Por.č.	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
1	Prípravné práce, vytýčenie trasy a inžinierskych sietí	m	1,20	1100,00	1 320,00
2	Komplet výkop a záhrn káblovej ryhy v hornine 3 (40/90)	m3	27,79	198,00	5 502,42
3	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,00	80,00	80,00
4	Komplet výkop a záhrn káblovej ryhy v hornine 4 (40/90)	m3	27,79	126,00	3 501,54
5	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,00	50,00	50,00
6	Preosatie zeminy na káblové lôžko a vyrovnanie kabel.lôžka	m2	2,20	360,00	792,00
8	Riadený pretlak	m	72,00	430,00	30 960,00
9	Spätná úprava povrchu kábelovej ryhy	m2	2,20	360,00	792,00
10	Osiatie povrchu kábelovej ryhy trávou	m2	0,70	360,00	252,00
11	Pokládka zákrytovej dosky	m	0,30	900,00	270,00
12	Výstražná fólia 33cm - materiál	m	0,10	900,00	90,00
13	Koordinátor BOZP	komplet	3073,00	1,00	3 073,00

Spolu:

46 682,96 €

materiál (súčasť PS č.1L)

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
14	Plastová zákrytová doska 1m	ks	1,17	900,00	1 053,00
15	PE chránička DN 110	m	2,22	200,00	444,00

	NOVÁ POLOŽKA -PE chránička DN 110 pod cestu	m	2,22	92,00	204,24
16	Výstražná fólia 33cm	m	0,07	900,00	63,00

Spolu: 1 764,24 €

**PS č.2L - Výstavba káblových komôr
montáž (súčasť PS č.2L)**

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
17	Výkop zeminy pre osadenie káblových šácht	m3	28,00	20,00	560,00
	NOVÁ POLOŽKA - Výkop zeminy pre osadenie káblových šácht	m3	28,00	18,35	513,80
18	Zriadenie paženia a rozopretia stien výkopu	ks	65,00	5,00	325,00
19	Zriadenie paženia komory počas zhutnenia	ks	65,00	5,00	325,00
20	Osadenie KK Ultima, vrátane podbetónovania, zhutnenia, drenáže, vyvrtania otvorov a osadenia poklopu	ks	430,50	5,00	2 152,50
21	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh a KK	ks	41,60	10,00	416,00
22	Odvoz prebytočného materiálu na skládku	m3	68,52	5,00	342,60
	NOVÁ POLOŽKA - Odvoz prebytočného materiálu na skládku	m3	68,52	25,00	1 713,00
23	Koordinátor BOZP	komplet	212,00	1,00	212,00

Spolu: 6 559,90 €

materiál (súčasť PS č.2L)

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
24	Komora Ultima 1310x1310 mm - (7x segment 150 mm)	ks	1548,80	5,00	7 744,00
25	Liatinový poklop	ks	2316,60	5,00	11 583,00
26	Štrkodrva 0/32	m3	58,40	20,00	1 168,00
	NOVÁ POLOŽKA- Štrkodrva 0/32	m3	58,40	22,50	1 314,00

Spolu: 21 809,00 €

**PS č.3L - Výstavba multirúr a optických káblov
montáž (súčasť PS č.3L)**

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
27	Zafúknutie optického minikábla	m	0,70	4400,00	3 080,00
28	Zatiahnutie multirúry do chráničiek	m	1,78	200,00	356,00
29	Uloženie multirúry 7x12/8mm do kábelovej ryhy	m	1,38	900,00	1 242,00
30	Zváranie optického kábla	vlákno	10,00	180,00	1 800,00
31	Inštalácia optického rozvádzača - 48vl. BIDI 48 (osadenie vonkajšieho kabinetu, komplet zostava)	ks	180,00	16,00	2 880,00
32	Inštalácia optického rozvádzača - 48vl. BIDI 48 (osadenie nástenného OR, komplet zostava)	ks	80,00	1,00	80,00
33	Inštalácia optickej spojky Coyote Dome (inštalácia spojky a všetkých jej súčastí vrátane uchytenia na stenu)	ks	35,00	9,00	315,00
34	Inštalácia spojky, koncovky redukcie 12/10 mm	ks	1,50	150,00	225,00
35	Kríž optickej rezervy - montáž	ks	7,50	5,00	37,50
36	Vyvedenie vlákna v kazete	vlákno	1,00	284,00	284,00
37	Ukončenie OK v optickom rozvádzači	vlákno	2,00	384,00	768,00

Príloha č.1 - Rozpočet

38	Meranie OK obojstranné	vlákno	18,00	384,00	6 912,00
39	Spracovanie meracích protokolov	zvar	1,38	384,00	529,92
40	Porealizačné zameranie trasy kábla	100m	95,00	11,00	1 045,00
	NOVÁ POLOŽKA - Porealizačné zameranie trasy kábla - duplicitná položka	100m	95,00	-8,15	- 774,25
41	Ukončenie multirúry v rozvádzači	ks	5,00	16,00	80,00
42	Vnútročné vedenie káblov	m	2,75	100,00	275,00
43	Vnútročné vedenie mikrotubičky	m	1,50	100,00	150,00
44	Marker označovací - montáž	ks	1,00	30,00	30,00
45	Náklady spojené so vstupom vozidiel, mechanizmov a pracovníkov do areálu letiska vrátane prípadného čistenia komunikácií	komplet	16169,35	2,00	32 338,70
46	Koordinátor BOZP	komplet	1299,00	1,00	1 299,00

Spolu: **52 952,87 €**

materiál (súčasť PS č.3L)

	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo	Cena celkom
47	Minikábel optický SMF D 24vl vonkajší	m	0,38	4400,00	1 672,00
48	Optická spojka Coyote Dome (vrátane potrebného príslušenstva)	ks	140,25	9,00	1 262,25
49	Multirúra 7x12/8mm	m	2,16	1100,00	2 376,00
50	Mikrotubička 10/8mm	m	0,17	100,00	17,00
51	Spojka trubičková 12mm	ks	1,98	100,00	198,00
52	Koncovka trubičková 12mm	ks	1,12	50,00	56,00
53	Spojka trubičková 10mm	ks	1,82	5,00	9,10
54	Redukcia 12/10 mm	ks	2,18	150,00	327,00
55	ODF Bidi 48vl (nástené prevedenie) + konštrukcia uchytenia na stenu	ks	245,16	1,00	245,16
56	ODF Bidi 48vl (samostatne stojaci) + komplet zostava	ks	291,85	16,00	4 669,60
57	Adaptér E2000/APC	ks	6,52	142,00	925,84
58	Patchcord SMF E2000APC/E2000APC 5m	ks	19,97	90,00	1 797,30
59	Montážna pružina E2000	ks	0,10	180,00	18,00
60	Ochrana zvaru teplom zmršťiteľná 45mm	ks	0,17	180,00	30,60
61	Kríž pre kábelovú rezervu	ks	22,80	100,00	2 280,00
62	Marker označovací	ks	6,78	30,00	203,40
63	Kríž optickej rezervy	ks	22,80	5,00	114,00
64	Pridružený materiál vrátane oceľových konštrukcií (pozink.) a kotviaceho materiálu	komplet	125,00	1,00	125,00

Spolu: **16 326,25 €**

Rekapitulácia nákladov

CNS	montáž	materiál	spolu
PS č.1C - Zemné práce – kábelová ryha			
montáž	315 388,01 €		
materiál		21 286,00 €	
			336 674,01 €

PS č.2C - Výstavba káblových komôr	38 313,50		
montáž	€	109 047,13	
materiál		€	147 360,63 €
PS č.3C - Výstavba optických káblov	336 362,10		
montáž	€	296 084,21	
materiál		€	632 446,31 €
PS č.4C - Výstavba metalických káblov	91 539,16		
montáž	€	445 638,95	
materiál		€	537 178,11 €
CNS montáž spolu:	781 602,77		
	€	872 056,28	
CNS materiál spolu:		€	
CNS spolu:			1 653 659,06 €
LMS	montáž	materiál	spolu
PS č.1L - Zemné práce – kábelová ryha			
montáž	46682,96	1 764,24	
materiál		€	48 447,20 €
PS č.2L - Výstavba káblových komôr			
montáž	6559,90	21 809,00	
materiál		€	28 368,90 €
PS č.3L - Výstavba optických káblov			
montáž	52952,87	16 326,25	
materiál		€	69 279,12 €
PS č.4L - Výstavba metalických káblov			
montáž			
materiál			
LMS montáž spolu:	106 195,73		
	€	39 899,49	
LMS materiál spolu:		€	
LMS spolu:			146 095,22 €

Montáž spolu:	887 798,50 €	
Materiál spolu:		911 955,77 €
Celkové náklady podľa projektu:		1 799 754,28 €

Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie.

Hore uvedená „projektová dokumentácia“ je podkladom k zhotoveniu diela (**Tabuľka č.1** tejto prílohy). Pri rozpore medzi informáciami uvedenými v „projektovej dokumentácii“ a vo „výkaze výmer“ platí prednostne údaj uvedený v „projektovej dokumentácii“.

Dôležité upozornenie:

- **Spätné zasypy výkopov** pre káblové trasy a pod. budú do hĺbky 150mm zasypané zeminou ako okolitý terén (napr. ornica s trávnyim semenom) v hĺbke viac ako 150mm bude spätný zasypanie riešený s prímiesou zabezpečujúce splnenie podmienky CBR (kalifornský pomer únosnosti) medzi 15-20. Splnenie podmienky je nutné overiť po realizácii preukaznou skúškou podľa normy! **Uvedená podmienka je požadovaná pre úseky uvedené v Tabuľke č.2** tejto prílohy, stĺpec „Požadované zhutnenie CBR15-20“. **(NEUVEDENÉ VO VÝKAZE VÝMER!!!)**
- **Káblové šachty** ktorých poloha je do 150m od osi dráh, budú vybavené tzv. „nábehovými klinmi“ zo suchého betónu. **Uvedená podmienka je požadovaná pre šachty uvedené v Tabuľke č.2** tejto prílohy, stĺpec „Nábehové klíny“. Detail viď **Tabuľka č.3. (NEUVEDENÉ VO VÝKAZE VÝMER!!!)**
- **Doplnenie výkresu MP.1 – Mikrotrubičkový plán** (viď **Tabuľka č.4**) **(NEUVEDENÉ VO VÝKAZE VÝMER!!!)**
- **Zmena výkresu U.1 Ukončenie kábla 25xN0.8 na LSA pásikoch** + katalógové listy KRONE (viď **Tabuľka č.5**) **(NEUVEDENÉ VO VÝKAZE VÝMER!!!)**
- **Zmena výkresu U.8 Umiestenie ODF - BIDI 48 v objekte JSRLP** (viď **Tabuľka č.6**) **(NEUVEDENÉ VO VÝKAZE VÝMER!!!)**

Projektová dokumentácia je k dispozícii v elektronickej podobe.

Tabuľka č.1 - ZOZNAM ZMLUVNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Označenie výkresu	Popis	Názov el.súboru	Poznámka
	Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava - 3. etapa		
	POLOHOPISNÉ PLÁNY		
	Celková situácia - ortofotomapa	CS.1 - Celková situácia - ortofotomapa.pdf	
	Celková situácia - GD zameranie	CS.2 - Celková situácia - GD zameranie.pdf Polohopisne plany.dgn	
KK1	Káblová komora ULTIMA D400	KK.1 - Káblová komora Ultima.pdf	
	Klad listov a legenda inž.sietí (IS)	Klad listov + legenda IS - L.0.pdf Polohopisne plany.dwg	
	Ochranné pásmo drahy - L.30	Ochranné pásmo drahy - L.30.pdf Polohopisne plany.dwg	
L1	Polohopis L.1	Polohopis L.1.pdf Polohopisne plany.dwg	
L2	Polohopis L.2	Polohopis L.2.pdf Polohopisne plany.dwg	nie je zakreslená šachta B01, B02
L3	Polohopis L.3	Polohopis L.3.pdf Polohopisne plany.dwg	nie je zakreslená šachta B03
L4	Polohopis L.4	Polohopis L.4.pdf Polohopisne plany.dwg	nie je zakreslená šachta B03,B04
L5	Polohopis L.5	Polohopis L.5.pdf Polohopisne plany.dwg	nie je zakreslená šachta B27,B28
L6	Polohopis L.6	Polohopis L.6.pdf Polohopisne plany.dwg	
L7	Polohopis L.7	Polohopis L.7.pdf Polohopisne plany.dwg	nie je zakreslená šachta B05
L8	Polohopis L.8	Polohopis L.8.pdf Polohopisne plany.dwg	
L9	Polohopis L.9	Polohopis L.9.pdf Polohopisne plany.dwg	

Príloha č.2 - Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

Označenie výkresu	Popis	Názov el.súboru	Poznámka
L10	Polohopis L.10	<i>Polohopis L.10.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L11	Polohopis L.11	<i>Polohopis L.11.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L12	Polohopis L.12	<i>Polohopis L.12.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	nie je zakreslená šachta B08 (v celkovej situácii ale je ...)
L13	Polohopis L.13	<i>Polohopis L.13.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L14	Polohopis L.14	<i>Polohopis L.14.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	nie je zakreslená šachta B29
L15	Polohopis L.15	<i>Polohopis L.15.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L16	Polohopis L.16	<i>Polohopis L.16.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L17	Polohopis L.17	<i>Polohopis L.17.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L18	Polohopis L.18	<i>Polohopis L.18.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L19	Polohopis L.19	<i>Polohopis L.19.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L19A	Polohopis L.19A	<i>Polohopis L.19A.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L20	Polohopis L.20	<i>Polohopis L.20.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L21	Polohopis L.21	<i>Polohopis L.21.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	nie je zakreslená šachta B16
L22	Polohopis L.22	<i>Polohopis L.22.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L23	Polohopis L.23	<i>Polohopis L.23.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L24	Polohopis L.24	<i>Polohopis L.24.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	nie je zakreslená šachta B26
L25	Polohopis L.25	<i>Polohopis L.25.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L26	Polohopis L.26	<i>Polohopis L.26.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L27	Polohopis L.27	<i>Polohopis L.27.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	nie je zakreslená šachta B23 ???
L28	Polohopis L.28	<i>Polohopis L.28.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
L29	Polohopis L.29	<i>Polohopis L.29.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	nie je zakreslená šachta B20
Výkr.č.1	Vonkajšie káblové rozvody pre zariadenia LPS SR š.p. na letisku M.R.Štefánika v BA, č. Fáza 2, budova TWR – nová APB L1 – POLOHOPIS L1	<i>ŠACHTA B27.pdf</i>	Pochádza z inej PD (Fáza 2)
R1	Križovanie rolovacej dráhy RWY 22-04 riadeným pretlakom Priečne rezy ryhou	<i>Rezy - R.1.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	
R2	Križovanie rolovacích dráh TWY F a TWY D riadeným pretlakom	<i>Rezy - R.2.pdf</i> <i>Polohopisne plany.dwg</i>	

	GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA		
	Technická správa Zoznam bodov Body a polohopis	<i>Geodetická dokumentáci.zip</i>	
	Trasy káblov a multirúr		
TM.1	Trasy multirúr		
TK.1	Trasy káblov: OKP_TAR (PB-TAR) 24vl. OK_TAR (TWR -TAR) 24 vl.	<i>TK.01 - OKP_TAR - OKT_TAR.pdf</i>	
TK.2	Trasy káblov: OKP_RX (PB - RX) 24vl. OKT_RX (TWR - RX) 24 vl.	<i>TK.02 - OKP_RX - OKT_RX.pdf</i>	
TK.3	Trasy káblov: OKP_RLS (PB - RLS) 24vl. OKT_RLS (TWR - RLS) 24 vl.	<i>TK.03 - OKP_RLS - OKT_RLS.pdf</i>	

Príloha č.2 - Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

Označenie výkresu	Popis	Názov el.súboru	Poznámka
TK.4	Trasy káblov: OKP_TWR (PB - TWR) 96vl. OKT_PB (TWR - PB) 96 vl.	TK.04 - OKP_TWR - OKT_PB.pdf	
TK.5	Trasy káblov: OKP_OTX (PB - OTX) 24vl. OKT_OTX (TWR - OTX) 24 vl.	TK.05 - OKP_OTX - OKT_OTX.pdf	
TK.6	Trasy káblov: OKP_NDBD (PB - NDBD) 24vl. OKT_NDBD (TWR - NDBD) 24 vl.	TK.06 - OKP_NDBD - OKT_NDBD.pdf	
TK.7	Trasy káblov: OKP_NDBB (PB - NDBB) 24vl. OKT_NDBB (TWR - NDBB) 24 vl.	TK.07 - OKP_NDBB - OKT_NDBB.pdf	
TK.8	Trasy káblov: OKL22_MLAT10 (LLZ22 - Mlat10) 24vl. OKR_CGSS (RLS - CGSS) 24 vl.	TK.08 - LLZ22-MLAT10 - RLS - CGSS.pdf	
TK.9	Trasy káblov: OKP_L31 (PB - LLZ31) 24vl. OKT_L31 (TWR - LLZ31) 24 vl.	TK.09 - OKP_L31 - OKT_L31.pdf	
TK.10	Trasy káblov: OKP_L22 (PB - LLZ22) 24vl. OKT_L22 (TWR - LLZ22) 24 vl.	TK.10 - OKP_L22 - OKT_L22.pdf	
TK.11	Trasy káblov: OKP_GP31 (PB - GP31) 24vl.OKT_GP31 (TWR - GP31) 24 vl.	TK.11 - OKP_GP31 - OKT_GP31.pdf	
TK.12	Trasy káblov: OKP_GP22 (PB - GP22) 24vl. OKT_GP22 (TWR - GP22) 24 vl.	TK.12 - OKP_GP22 - OKT_GP22.pdf	
TK.13	Trasy káblov: OKP_METL (PB - MET) 24vl. OKT_METL (TWR - MET) 24 vl.	TK.13 - OKP_METL - OKT_METL.pdf	
TK.14	Trasy hlavných káblov okruhu LMS + odpichy	TK.14 - LMS okruh + odpichy.pdf	
TK.15	Trasy hlavných káblov okruhu LMS	TK.15 - Hlavný LMS okruh.pdf	
TK.16	Trasy odbočných káblov okruhu LMS	TK.16 - Odbočné káble okruhu LMS.pdf	
TK.17	Trasy oznamovacích káblov 25XN0,8 (50 párov)	TK.17 - oznam. kable 25XN.pdf	
TK.18	Trasy NN káblov	TK.18 - NN kable.pdf	
	Umiestnenie ODF a LSA v objektoch		
U.1	Ukončenie kábla 25xN0.8 na LSA pásikoch	U.1 - ukoncenie 25XN0,8.pdf	
U.2	Umiestnenie ODF - BIDI 48 v objekte GP31	U.2 - Umiestnenie ODF a LSA v GP31.pdf	
U.3	Umiestnenie ODF - BIDI 48 v objekte LLZ22 a GP22	U.3 - Umiestnenie ODF a LSA v LLZ22 a GP 22.pdf	
U.4	Umiestnenie ODF - BIDI 48 v objekte NDBB	U.4 - Umiestnenie ODF a LSA v NDBB.pdf	
U.5	Umiestnenie ODF - BIDI 48 v objekte TX	U.5 - Umiestnenie ODF a LSA v TX.pdf	
U.6	Umiestnenie ODF - BIDI 48 v objekte NDBD	U.6 - Umiestnenie ODF a LSA v NDBD.pdf	
U.7	Umiestnenie ODF - BIDI 48 v objekte RX	U.7 - Umiestnenie ODF a LSA v RX.pdf	
U.8	Umiestnenie ODF - BIDI 48 v objekte JSRLP	U.8 - Umiestnenie LSA v JS RLP.pdf	
U.9	Umiestnenie ODF - BIDI 48 v objekte RLS	U.9 - Umiestnenie ODF a LSA v RLS.pdf	
U.10	Umiestnenie ODF v existujúcich rackoch v objekte PB (miestn.1.33 a 1.05)	U.10 - Umiestnenie ODF v PB 1.33 a 1.05.pdf	
U.11	Umiestnenie ODF v existujúcich rackoch v objekte PB (miestn.202 a 203)	U.11 - Umiestnenie ODF v PB 202 a 203.pdf	
U.12	Umiestnenie ODF v existujúcich rackoch v objekte TWR (miestn.W908)	U.12 - Umiestnenie ODF v TWR W908.pdf	
U.13	Umiestnenie ODF v existujúcich racku v objekte TAR	U.13 - Umiestnenie ODF v TAR.pdf	
U.14	Umiestnenie ODF v novom racku v objekte METEO pozorovateľne - 2.poschodie	U.14 - Umiestnenie ODF v METEO pozor.pdf	
U.15	Umiestnenie ODF (BIDI 48) v budove TWR pre objekt ME15	U.15 - Umiestnenie ODF v TWR - ME15.pdf	

Príloha č.2 - Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

Označenie výkresu	Popis	Názov el.súboru	Poznámka
	Vláknový plán - ukončenie OK (opt.kab.) v objektoch		
VP.1	Vláknový plán - ukončenie OKP_TWR a OKT_PB v objektoch PB a TWR	VP.1 - vlak. plan- ukoncenie v PB a TWR - OKP_TWR a OKT_PB.pdf	
VP.2	Vláknový plán - ukončenie OKSZA a OKSZB v objekte PB	VP.2 - vlak. plan- ukoncenie v PB - OKSZA a OKSZB.pdf	
VP.3	Vláknový plán - ukončenie OKSZA a OKSZB v objekte SZA a SZB	VP.3 - vlak. plan- ukoncenie v SZA a SZB - OKSZA a OKSZB.pdf	
VP.4	Vláknový plán - ukončenie OK v objektoch MET a OTX	VP.4 - vlak. plan- ukoncenie v MET a OTX.pdf	
VP.5	Vláknový plán - ukončenie v objektoch LLZ22 a MLAT10	VP.5 - vlak. plan- ukoncenie v LLZ22 a MLAT10.pdf	
VP.6	Vláknový plán - ukončenie v objektoch LLZ22 a CGSS1	VP.6 - vlak. plan- ukoncenie v LLZ22 a CGSS1.pdf	
VP.7	Vláknový plán - ukončenie v objektoch RLS a NDBB	VP.7 - vlak. plan- ukoncenie v RLS a NDBB	
VP.8	Vláknový plán - ukončenie v objektoch GP31 a TAR	VP.8 - vlak. plan- ukoncenie v GP31 a TAR.pdf	
VP.9	Vláknový plán - ukončenie v objektoch RLS a GP22	VP.9 - vlak. plan- ukoncenie v RLS a GP22.pdf	
VP.10	Vláknový plán - ukončenie v objektoch NDBD a RX	VP.10 - vlak. plan- ukoncenie v NDBD a RX.pdf	
VP.11	Vláknový plán - ukončenie v objektoch LLZ31, ME02, ME03 a ME16	VP.11 - vlak. plan- ukoncenie v LLZ31.pdf	
VP.12	Vláknový plán - ukončenie v objektoch ME01, ME02, ME03 a ME16	VP.12 - vlak. plan- ukoncenie v ME01, ME02, ME03 a ME16.pdf	
VP.13	Vláknový plán - ukončenie v objektoch ME04, ME05 a ME06	VP.13 - vlak. plan- ukoncenie v ME04, ME05 a ME06.pdf	
VP.14	Vláknový plán - ukončenie v objektoch ME07a ME08	VP.14 - vlak. plan- ukoncenie v ME07 a ME08.pdf	
VP.15	Vláknový plán - ukončenie v objektoch M09, ME10, ME17 a ME11, ME18	VP.15 - vlak. plan- ukoncenie v ME09, ME10, ME17, ME11 a ME18.pdf	
VP.16	Vláknový plán - ukončenie v objektoch M12, ME13 s ME14	VP.16 - vlak. plan- ukoncenie v ME12, ME13 a ME14.pdf	
VP.17	Vláknový plán - ukončenie v objektoch ME15	VP.17 - ukoncenie v ME15.pdf	
VP.18	Ukoncenie v exist. Rackoch v objekte PB (miestnosti 1.33 1.05)	VP.18 - ukoncenie v PB (1.33 a 1.05).pdf	
VP.19	Ukoncenie v exist. Rackoch v objekte PB (miestnosti 202 a 203)	VP.19 - ukoncenie v PB (202 a 203).pdf	
VP.20	Ukoncenie v nových rackoch v objekte TWR (miestnosť W908)	VP.20 - ukoncenie v TWR (W908).pdf	
VP.21	Ukoncenie v exist. Racku v objekte TAR	VP.21 - ukoncenie v TAR.pdf	
VP.22	Ukoncenie v novom racku v objekte METEO pozorovateľne - 2. poschodie	VP.22 - ukoncenie v METEO pozorovatelni.pdf	
VP.23	Ukoncenie v novom BIDI 48 v budove TWR	VP.23 - ukoncenie v TWR - objekt ME15.pdf	
	Technolog. výkresy - Mikrotr. plan-Sch. plan rur a MK-Sch. plan OK-BIDI48-DB7x12_8		
SP RMK.1	schématický plán rur a metalických káblov	SP RMK.1 - Sch. plan rur a MK.pdf	
SP OK.1	schématický plán optických káblov	SO OK.1 - Schem. plan optických káblov.pdf	
ODF.1	Optický rozvádzač BIDI 48	ODF.1 - optický rozvádzač BIDI 48.pdf	
MP.1	Mikrotrubičkový plán	MP.1 - Mikrotrubickovy plan.pdf	
DB.1	Zväzok trubičiek 7x12/8 mm	DB.1 - 7x12_8.pdf	
	Projekt metalických silových káblov		
	Technická správa	TS-ROZVODY-400V-LETISKO_20180426.doc	
E1	Schématický plán rur a metalických káblov	ELEKTRO Sch.-vykres_07_02_2020.pdf _ELEKTRO Sch.-vykres_01_2020.dwg	
E2	Situácia trasy káblov NN	E2_A3_pasi_lps_180220.pdf pasi_lps_180220.dwg	
	Projektová dokumentácia pre územné konanie a stavebné povolenie.		

Príloha č.2 - Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

Označenie výkresu	Popis	Názov el.súboru	Poznámka
	Technická správa	Projekt pre SP.doc	
K.0	Celková situácia - Klad listov katastrálnych máp	Celkova situacia K.0.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.1	Katastrálna mapa	Situacia K.1.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.2	Katastrálna mapa	Situacia K.2.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.3	Katastrálna mapa	Situacia K.3.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.4	Katastrálna mapa	Situacia K.4.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.5	Katastrálna mapa	Situacia K.5.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.6	Katastrálna mapa	Situacia K.6.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.7	Katastrálna mapa	Situacia K.7.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.8	Katastrálna mapa	Situacia K.8.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.9	Katastrálna mapa	Situacia K.9.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.10	Katastrálna mapa	Situacia K.10.pdf Situacia pre UR.dwg	
K.11	Katastrálna mapa	Situacia K.11.pdf Situacia pre UR.dwg	

Tabuľka č.2 - DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII A VÝKAZU VÝMER

	Označenie šachty	Označenie bodu	Požadované zhmtnenie CBR15-20	Nábehové klíny	Poznámka	Vzdialenosť Š(Bx) po Š(Bx+1) (orientačné vzdialenosti)	Odbočka (orientačné vzdialenosti)	Poznámka
	K1B29 (nie je uvedená v situácii)	B29	nie	nie	NDB D odbočka na NDBD pripojenie ME07 existujúceho vedenia v novej šachte pretlak pod bet.cestou		749,50 m	po B29 výkop rýhy + šachta (odbočka NDB D)
	K1B28	B28	áno do 150m od osi dráhy 31-13	nie	odbočka na ME02, ME03, ME16 pretlak pod TWY F		396,00 m	B28(K1B28) výkop rýhy + šachty (odbočka ME02,03,16)
			nie					B27-B21(K1B21)
	Použiť existujúcu šachtu N2 (N2 = B27) (viď Výkr.č.1) v Polohopis	B27	nie	nie	šachta na existujúcej trase a začiatku novej vetvy (odbočka ME01, MET)	166,80 m	61,50 m	B27-B28(K1B28) výkop rýhy + šachty (odbočka ME01, MET)
	K1B26 (nie je uvedená v situácii)	B26	nie	nie	šachta na existujúcej trase odbočka na ME13 a ME14 (tesne pri ochrannom pásme dráhy 22-04)		33,30 m	B25(K1B25)-B26 bez výkopu rýhy (len šachty) (Prípojka ME13, ME14 výkop)
	K1B25	B25	nie	nie	nová šachta na existujúcich rozvodoch pretlak pod bet.cestou	289,40 m		(K2B24)-B25(K1B25) výkop rýhy + šachty
	K2B24		nie	nie		302,10 m		B24(K1B24)-(K2B24) výkop rýhy + šachty
	K1B24	B24	nie	nie	OLD TX odbočka	207,00 m	30,00 m	B23-B24(K1B24) výkop rýhy + šachty (odbočka old TX)
	K1B23 (nie je uvedená v situácii)	B23	nie	nie	LL222 (búdka s technológiou) pripojenie	257,80 m	5,50 m	B23-(K2B22) výkop rýhy + šachty(odbočka LL222)
	K3B22		nie	nie		392,90 m		(K2B22)-(K3B22) výkop rýhy + šachty
	K2B22		nie	nie		389,30 m		B22(K1B22)-(K2B22) výkop rýhy + šachty


Príloha č.2 - Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

Označenie šachty	Označenie bodu	Požadované zhutnenie CBR15-20	Nábehové klíny	Poznámka	Vzdialenosť Š(Bx) po Š(Bx+1) (orientačné vzdialenosti)	Odbočka (orientačné vzdialenosti)	Poznámka
K1B22	B22	nie	nie	MLAT10 (odbočka)	626,10 m	77,50 m	B19(K1B19)-B22(K1B22) výkop rýhy + šachty (odbočka MLAT10)
K1B21	B21	áno do 150m od osi dráhy 22-04	nie	šachta na prepojení existujúceho rozvodu a novej trasy	515,40 m		B20-B21(K1B21) výkop rýhy + šachty (výmera výkopu zahŕňa trasou riadený pretlak pod RWY 22-04)
K1B20 (nie je uvedená v situácii)	B20	áno do 150m od osi dráhy 22-04	nie	odbočka na ME12 s riadeným pretlakom pod RWY 22-04	48,50 m	10,90 m	B19(K1B19)-B20 výkop rýhy + šachty (odbočka ME12)
K1B19	B19	nie	nie	DOSMB19 odbočka na B20 odbočka na K2B18	140,20 m		(K2B18)-B19(K1B19) výkop rýhy + šachty
K2B18		nie	nie		300,40 m		B18(K1B18)-(K2B18) výkop rýhy + šachty
K1B18	B18	áno do 150m od osi dráhy 31-13	nie	DOSMB18 odbočka na ME11 a ME18 s riadeným pretlakom pod TWY F	294,10 m	214,10 m	(K2B17)-B18(K1B18) výkop rýhy + šachty (odbočka ME11 a 18)
K2B17		nie	nie	pretlak bet.plochy	745,60 m		B17(K1B17)-(K2B17) výkop rýhy + šachty
K1B17	B17	áno do 150m od osi dráhy 31-13	nie	DOSMB17 (OS_OKT_TAR) odbočka na ME9,10,17 s riadeným pretlakom pod TWY F pretlak bet.plochy (bet.cesta)	422,10 m	201,20 m	(K2B15)-B17(K1B17) výkop rýhy + šachty(odbočka ME10,17,09)
K2B15		nie	nie		233,60 m		B15(K1B15)-(K2B15) výkop rýhy + šachty
K1B15	B15	áno do 150m od osi dráhy 31-13	ÁNO	pretlak bet.plochy (bet.cesta)	336,20 m		B14(K1B14)-B15(K1B15) výkop rýhy + šachty
K1B16 (nie je uvedená v situácii)	B16	áno do 150m od prahu dráhy 31-13	nie	NDBB, ME08 (2x) pretlak bet.plochy (bet.cesta) prechod cez most Malý Dunaj		573,90 m	(prípojňý bod) - B16 výkop rýhy + šachty (odbočka NDB B a ME08) 187,3m ide v chráničke v mostnom telese ponad Malý Dunaj (nie je zahrnuté vo výmere vedľa)
K1B14	B14	áno do 150m od osi dráhy 31-13	nie		685,00 m		B13(K1B13)-B14(K1B14) výkop rýhy + šachty
K1B13	B13	nie	nie	odbočka na GP31	155,10 m	48,00 m	(K3B12)-B13(K1B13) výkop rýhy + šachty (odbočka GP31)
K3B12		nie	nie	ide mimo oplateného areálu letiska pretlak pod nespevnenou cestou(je nutný ????)	505,60 m		(K2B12)-(K3B12) výkop rýhy + šachty
K2B12		nie	nie		433,20 m		(K1B12)-(K2B12) výkop rýhy + šachty
K1B12	B12	nie	nie	odbočka na THOMSON 3x pretlak pod bet.plochou a cestou (mimo oplatený areál letiska) 2x pretlak pod bet cestou odbočka na CGSS	740,30 m	945,90 m	B11(K1B11)-B12(K1B12) výkop rýhy + šachty (odbočka CGSS)(odbočka THOMSON)


Príloha č.2 - Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

	Označenie šachty	Označenie bodu	Požadované zhutnenie CBR15-20	Nábehové klíny	Poznámka	Vzdialenosť Š(Bx) po Š(Bx+1) (orientačné vzdialenosti)	Odbočka (orientačné vzdialenosti)	Poznámka
	K1B11	B11	nie	nie	odbočka na RLS do šachty pripojenie existujúcich trás	530,00 m		(K2B10)-B11(K2B11) výkop rýhy + šachty (odbočka B11-Thomson)
	K2B10		nie	nie	pretlak pod poľnou cestou	365,60 m		B10(K1B10)-(K2B10) výkop rýhy + šachty
	K1B10	B10	nie	nie	odbočka na GP22 pretlak pod poľnou cestou	634,50 m	53,00 m	(K2B09)-(K1B10)B10 výkop rýhy + šachty odbočka GP
	K2B09		nie	nie	lomová šachta	389,30 m		B09(K1B09)-(K2B09) výkop rýhy + šachty
	K1B09	B09	nie	nie	lomová šachta	647,40 m		(K1B08)-B09(K1B09) výkop rýhy + šachty
	K1B08	B08	áno do 150m od osi dráhy 22-04	nie	odbočka na ME05 a ME06	329,80 m	104,10 m	(K2B07)-B08(K1B08) výkop rýhy + šachty odbočka ME05 a ME06
	K2B07		nie	nie	pretlak pod TWY D (taxovačka) pretlak pod panelovou cestou	330,80 m		B07(K1B07)-(K2B07) výkop rýhy + šachty
	K1B07	B07	nie	nie	odbočka na RX	43,30 m		B07-RX výkop rýhy + šachta
								B06(K1B06)-B11(K1B11)
	K1B06	B06	nie	nie	koncová šachta (napojenie na existujúce vedenie)	320,00 m		B06-B07 výkop rýhy + šachty
	K1B05 (nie je uvedená v situácii)	B05	nie	ÁNO	nová šachta na existujúcich rozvodoch	967,70 m	548,90 m	B05-B06 bez výkopu rýhy (len šachty) (prípojka LLZ31)
								B04-B27 bez výkopu rýhy (len šachty)
	bez označenia	B04	nie	nie	existujúca šachta na existujúcich rozvodoch	467,22 m		B04-B05 bez výkopu rýhy (len šachty)
	bez šachty	B03	nie	nie	odbočka do TWR (odbočka z energokanála)	43,30 m		B03-B04 bez výkopu rýhy (len šachty)
	bez šachty	B02	nie	nie	odbočka do HRA (odbočka z energokanála)	652,00 m		B02-B03 bez výkopu rýhy (len šachty)
	bez šachty	B01	nie	nie	odbočka do JSRLP (odbočka z energokanála)	29,80 m		B01-B02 bez výkopu rýhy (len šachty)


Tabuľka č.3 – SCHENATICKÉ ZOBRAZENIE ŠACHTY ULTIMA D400 (doplnok k Tabuľke č.2 - stĺpec „Nábehové klíny“)

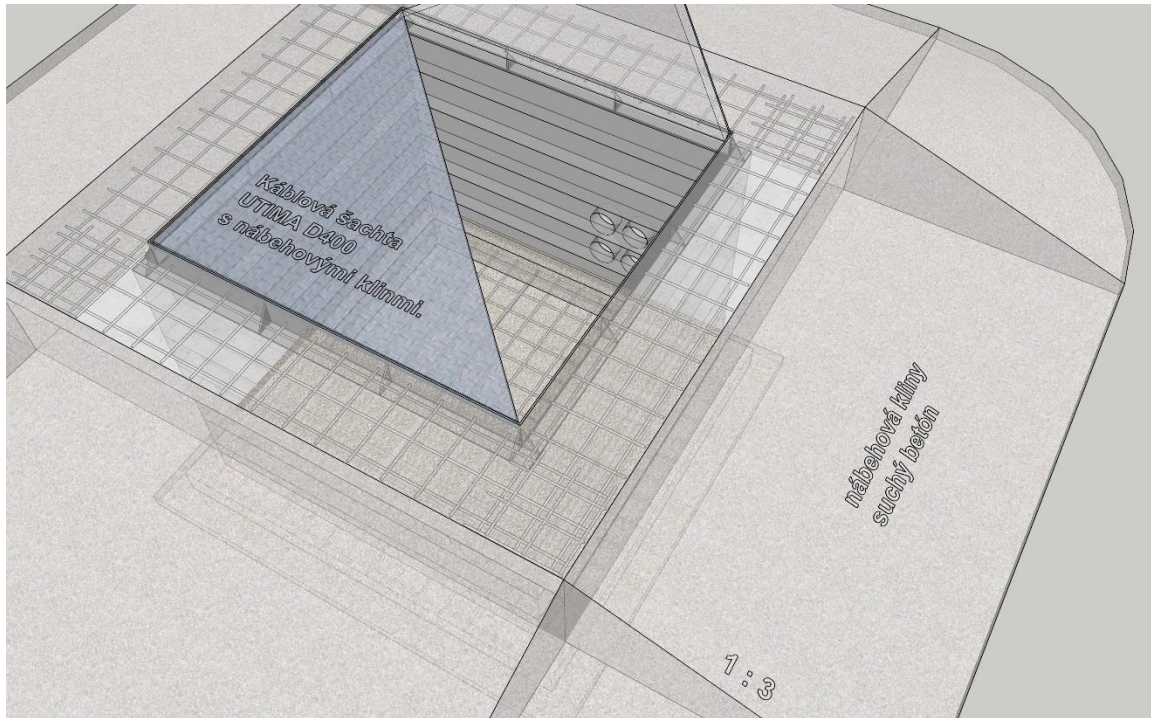


Šachta ULTIMA D400 (schematické zobrazenie bez vyznačeného obsypu tela šachty zhutnenou štrkodrvou 0-32 podľa výkresu KK1)
Verzia s nábehovými klinmi zo suchého betónu tr.B20 (podľa Tabuľky č.2)

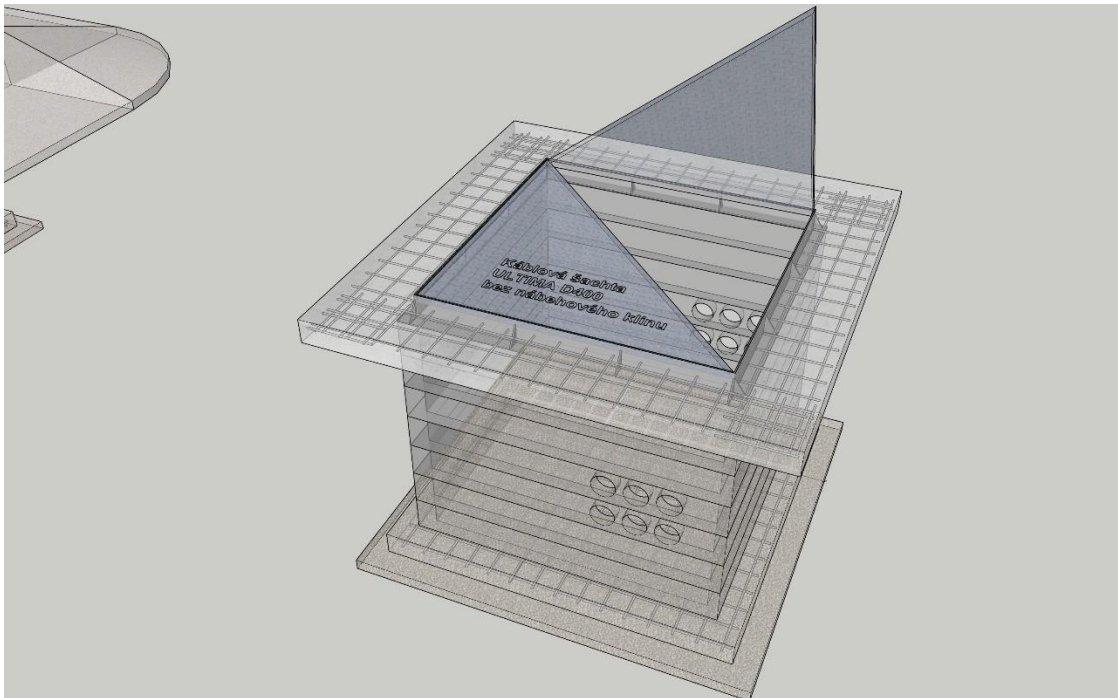

Šachta ULTIMA D400 (schematické zobrazenie bez vyznačeného obsypu tela šachty zhutnenou štrkodrvou 0-32 podľa výkresu KK1)
Verzia bez nábehových klinov (podľa Tabuľky č.2)

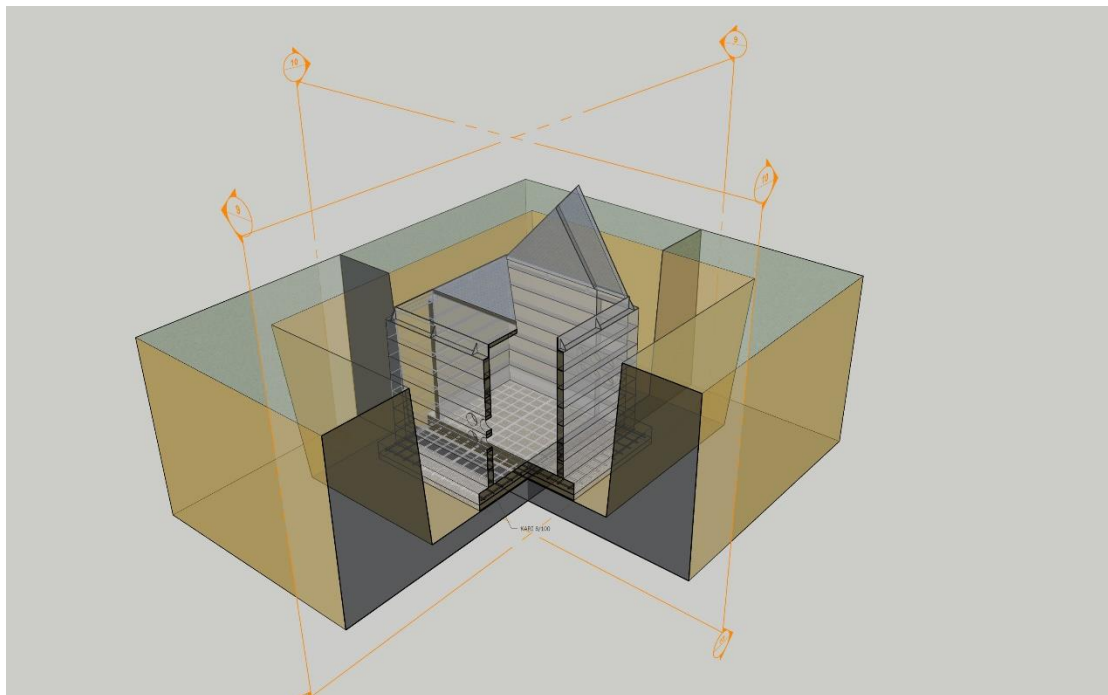

Šachta ULTIMA D400 (schematické zobrazenie bez vyznačeného obsypu tela šachty zhutnenou štrkodrvou 0-32 podľa výkresu KK1)
Rezy v teréne

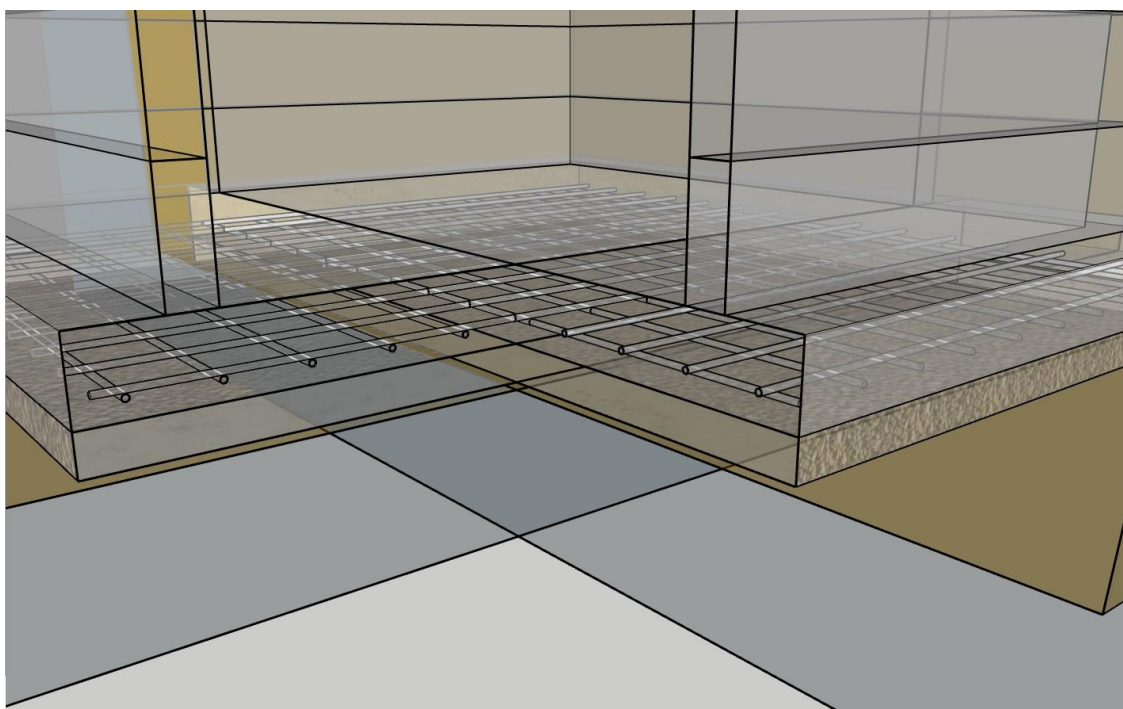


Šachta ULTIMA D400 (schematické zobrazenie)
Rez – detail základu šachty (sieťovina 8/100mm)

Tabuľka č.4


Doplnenie výkresu MP.1 - Mikrotrubičkový plán

OKM19_B26 - nový úsek US3.51

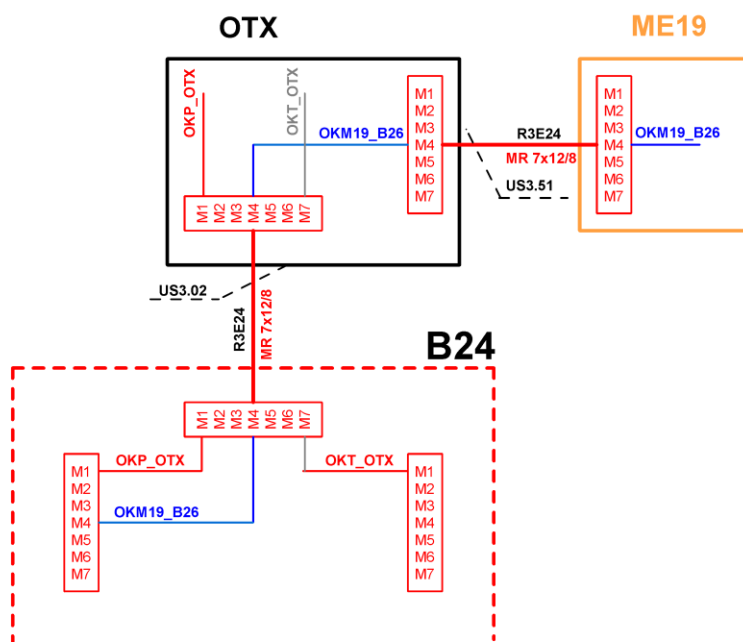

ME19 - CLD LL ILS RWY 04

OKM21_B11 - nové úseky US3.52 a US3.53

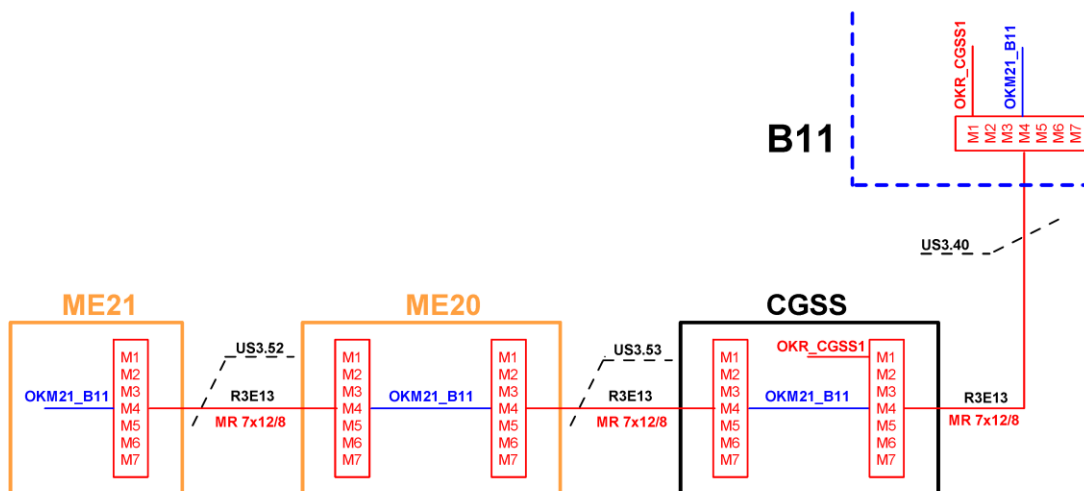

ME20 - RVR RWY 22 MID
ME21 - LIDAR RWY CROSS

LMS – plánované zariadenia

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. CLD LL ILS RWY 04 | označenie v PD – ME19 | pri OTX (B24) |
| 2. RVR RWY 22 MID | označenie v PD – ME20 | pri CGSS1 (B11) |
| 3. LIDAR RWY CROSS | označenie v PD – ME21 | pri CGSS1 (B11) |


LMS – doplnenie OK

- | | |
|--------------|--|
| 1. OKM19_B26 | US3.51 -US3.02-US3.01-US3.02-US3.50-US3.41
US3.51 – nový úsek ME19 – B24 |
| 2. OKM21_B11 | US3.52-US3.53 -US3.40
US3.52 – nový úsek ME21 – ME20
US3.53 – nový úsek ME20 – CGSS |

Tabuľka č.5

Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava - 3. etapa
Konštrukcia uchytenia LSA pásikov - zmena výkresu U.1

1) LSA PLUS wall distribution frame
 Basic kit, š 696 mm, v 930 mm
 4 ks 3x10LSA modulov

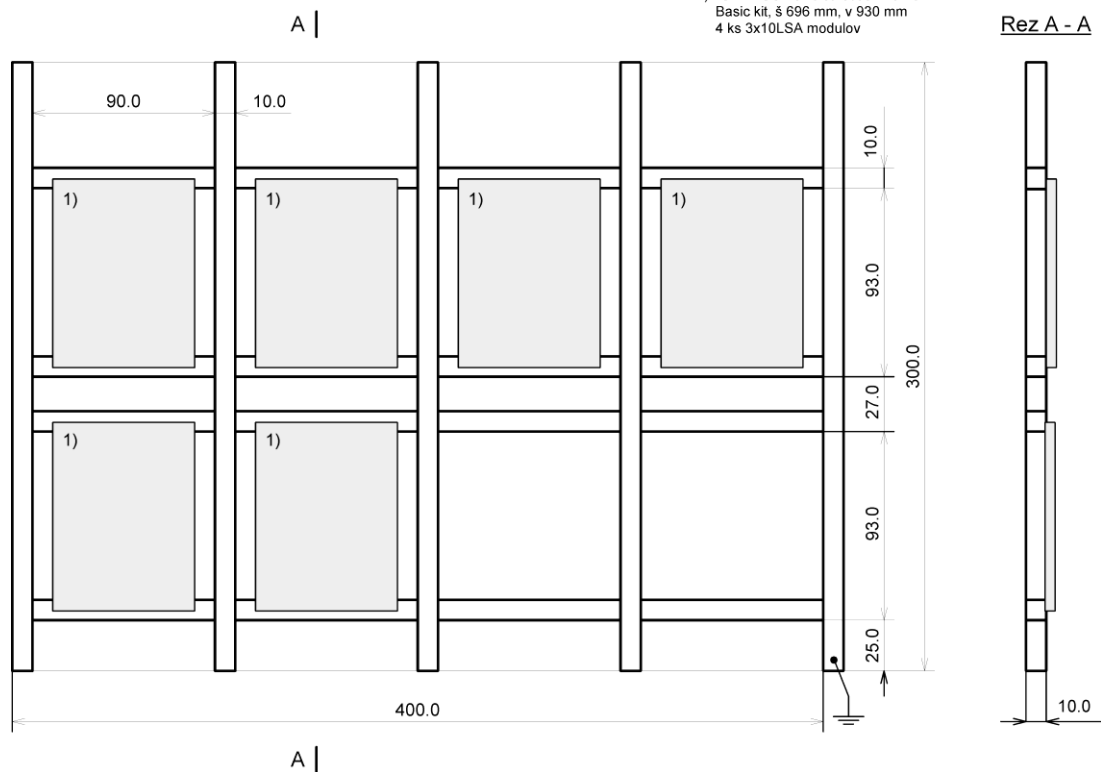

LSA-PLUS® Wall Distribution Frame

11.4

Main Distribution Frame

LSA-PLUS® Wall Distribution Frame

Order No.	LSA-PLUS Wall DistributionFrame	Pack
6577 / 1011-04	LSA-PLUS Wall Distribution Frame Basic kit	1 pc

The LSA-PLUS wall mounted distributor is a quick mounting rack which can accommodate up to 4 self-supporting backmount frames 2/8 and/or 2/10. Each kit has a distribution capacity of up to 2000 pairs (series 2/10) or up to 1600 pairs (series 2/8).

Kits which should be arranged can be combined to form banks and are suitable for wall mounting or mounting in distribution cabinets. The available space may be 60 mm bigger than the frame width.

Dimensions:

Width = 696mm



Height = H + 132 mm

Fixing-distance of the c-rails $H = L + 70$ mm

Hole-distance of the backmount frames $L = (M-1) \times R + 70$ mm

M = Number of modules (30 upto 50 recommended)

R = Pitch (22,5 or 25 mm)

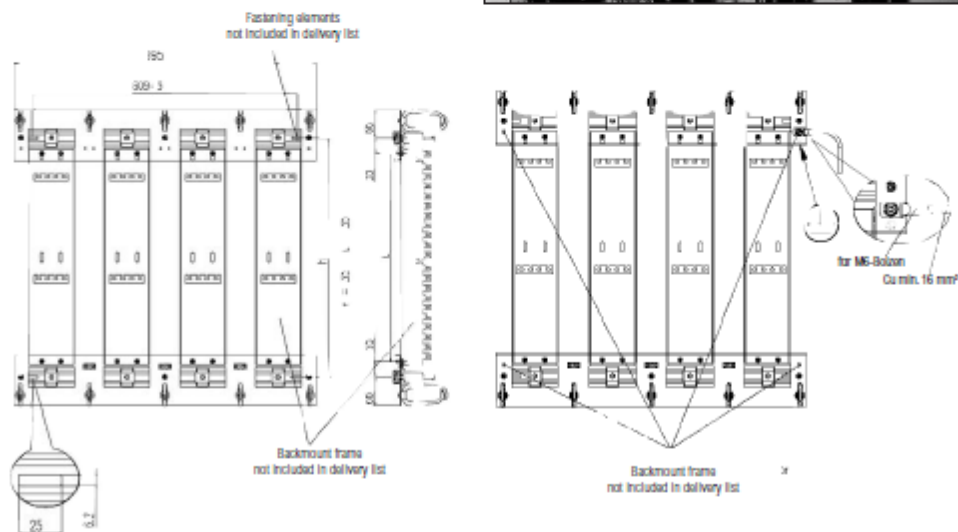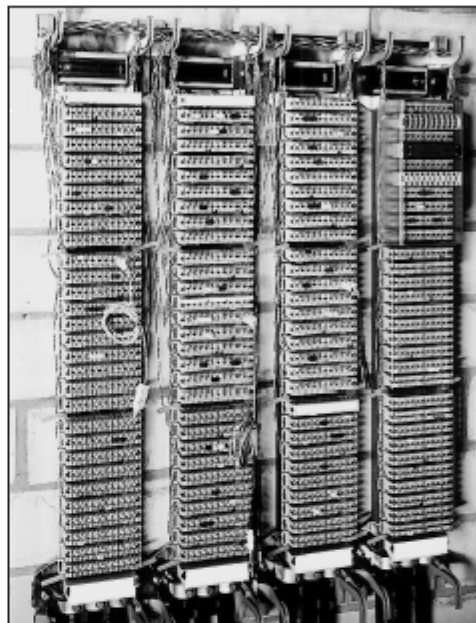

<http://www.krone-gmbh.at>

11 - Page 9

11.5

Main Distribution Frame

LSA-PLUS® Wall Distribution Frame

LSA-PLUS®-Wall Distribution Frame - Accessories

Order No.	LSA Wall Distribution Frame	Pack
5267 3 585-00	LSA Backmount frame 2/10 for 1 x 10+1 Module 2/10	1 pc
5267 3 585-01	LSA Backmount frame 2/10 for 2 x 10+1 Module 2/10	1 pc
5267 3 585-02	LSA Backmount frame 2/10 for 3 x 10+1 Module 2/10	1 pc
5267 3 585-03	LSA Backmount frame 2/10 for 4 x 10+1 Module 2/10	1 pc

For 10 LSA-PLUS modules 2/10 with additional position for one additional LSA-PLUS module 2/10, or one Module Label holder 2/10, or one LSA-PLUS Earth module 2/38. Cable supply from inside the LSA Backmount frame. For indoor usage mounted in wall distribution frames and free-standing distribution frames or for outdoor distribution boxes, cross connection cabinets.


Dimensions: T=50 mm (depth of cable space), R=22,5 mm (Pitch), R1=30 mm (Pitch of additional position)

Modules	L (length)	fixing width
1 x 10+1	263.0 mm	240.0 mm
2 x 10+1	495.5 mm	472.5 mm
3 x 10+1	728.0 mm	705.0 mm
4 x 10+1	960.5 mm	937.5 mm

Material: stainless steel X 5 CrNi 1810n, untreated

5267 3 589-00	Jumper Guide	1 pc
---------------	--------------	------

See detail A in figure.

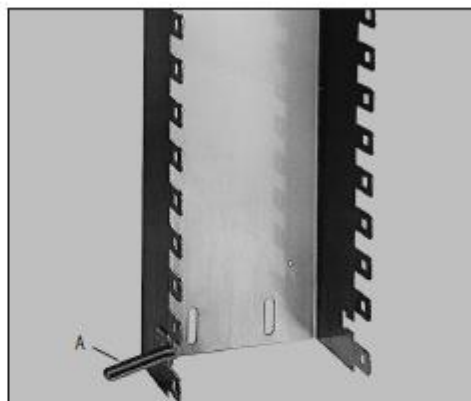

Order No.	LSA Mounting adapter	Pack
6455 3 027-00	LSA Mounting adapter	1 pc


System component for fixing up variable wall distribution frames or frames built in distribution cabinets. Suitable for backmount frames series 2/8 and 2/10. The smallest distributor unit consists of one backmount frame fixed between two LSA mounting adapters equipped with LSA-PLUS modules, or two LSA-PROFIL rods fixed between two LSA mounting adapters equipped with LSA-PROFIL modules.

A clip-on system in the adapters enables further units to be added horizontally and/or vertically as required.

The installation aids needed in distributors are integrated into the adapter:

- 3 cable fixing points,
- 2 switching wire guides,
- 2 mounting holes for vertical or horizontal wall mounting or isolated fixing of backmount frames in cabinets

R=Pitch (22.5mm or 25mm)
M=Modules
L=Fixing length


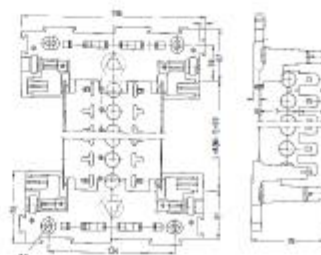


Tabuľka č.6

Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava - 3. etapa

Umiestnenie LSA pásov v objekte JSRLP (C026) - zmena výkresu č. U.8

Rez A - A

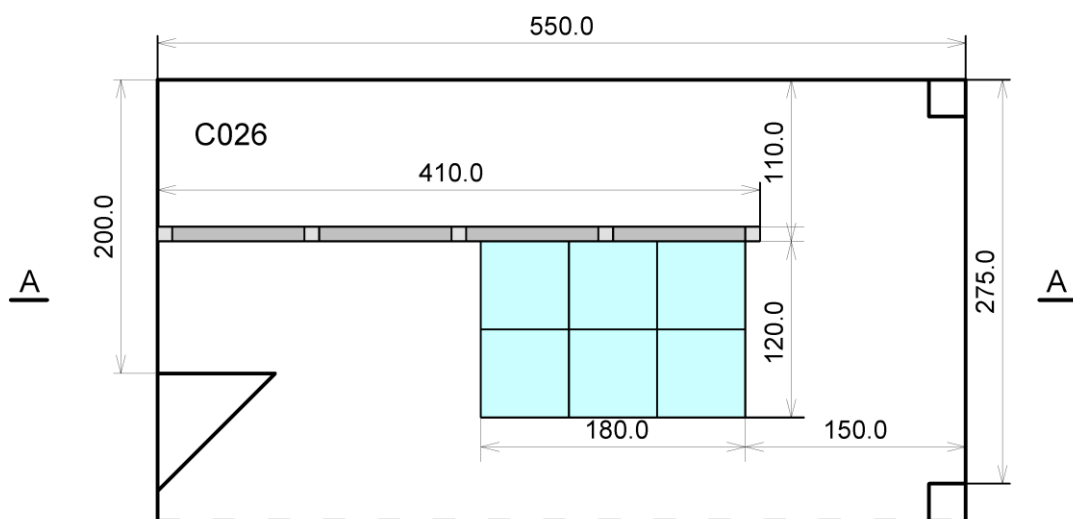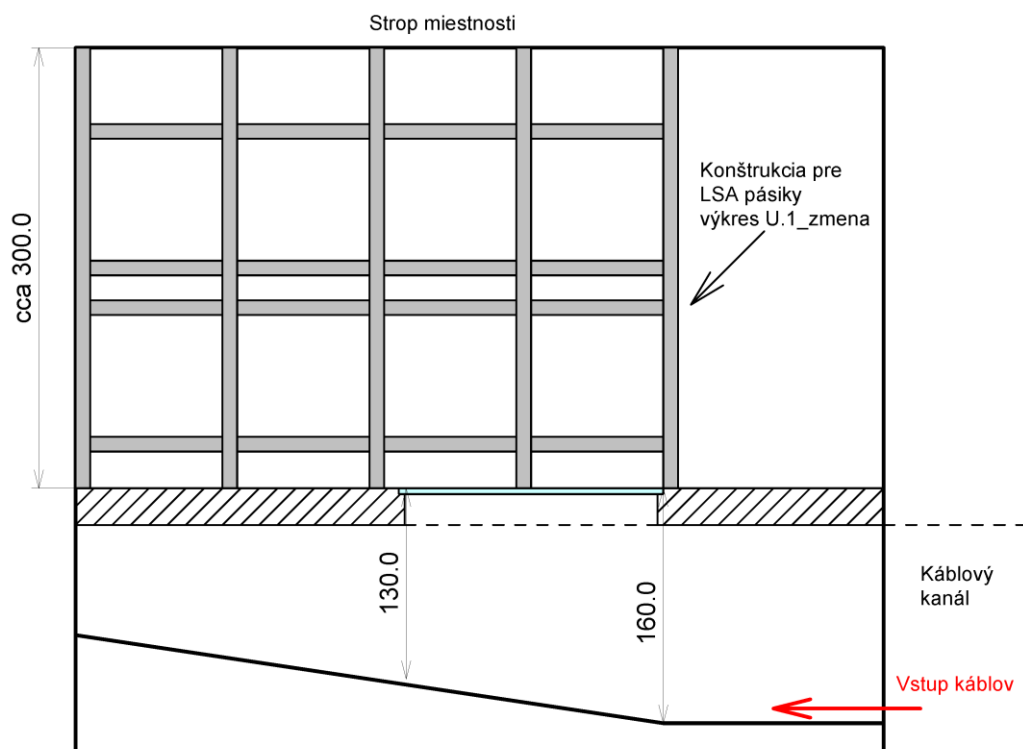

Pozn.:

V miestnosti zrealizovať samostatný uzemňovací bod na meranie káblov so samostatným zemničom mimo objektu JSRLP a káblového kanála.

Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa – význam skratiek

B01 – B28 body odbočenia (modrá farba na výkresoch TK)

CNS	objekty alebo lokality LPS SR, š. p., okruh CNS (červená farba na výkresoch TK), napr. LLZ31
KxByz	káblová komora (šachta) pri bode odbočenia (tyrkysová farba na výkresoch L), napr. K2B17 - káblová komora 2 pri bode odbočenia 17
LMS	letecká meteorologická služba SHMÚ (METEO)
METL	objekty alebo lokality SHMÚ (METEO), označené aj ME01 – ME18, okruh LMS, (oranžová farba na výkresoch TK), napr. ME15
MDK	metalický dátový kábel
MR	multirúra
MT	mikrotrubička
ODF	Optical Distribution Frame (optický rozvádzač)
OK	optická kabeláž (optický kábel)
OKP	optická kabeláž z agregáčného bodu PB (prevádzková budova) do objektu, napr. OKP_TAR - optická kabeláž z objektu PB do objektu TAR
OKT	optická kabeláž z agregáčného bodu TWR (letisková riadiaca veža) do objektu, napr. OKT_TAR - optická kabeláž z objektu TWR do objektu TAR
OMK	optický mini kábel
USx.yz	úsek káblovej trasy (fialová farba na výkresoch TK, napr. US3.24)

Označenie multirúr

R4, R5 MR 7x12/8	multirúra 2. etapa	TWR – JSRLP
R9, E10 MR 7x12/8	multirúra 2. etapa	TWR – PB
RJS2 – RJS5 (modrá)	multirúra 1. etapa	JSRLP – TAR
RJS1 (modrá)	multirúra 1. etapa	JSRLP – ILS LLZ 31
R3Exx MR 7x12/8	multirúra 3. etapa	

Označenie mikrotrubičiek (príklad)

OKP_METL	optická kabeláž PB – METEO, šedá trubička
OKT_OTX	optická kabeláž TWR – OTX, červená trubička
OKM_B17	optická kabeláž METEO – šachta B17, modrá trubička

Harmonogram**Do 18 mesiacov od odovzdania príslušného staveniska (bod 5.1 zmluvy)****Hamonogram****Do 18 mesiacov od odovzdania príslušného staveniska (bod. 5.1 zmluvy)**

Výkon / týždeň resp. mesiac	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	2. až 16. mesiac	1. až 3. týždeň 17. mesiaca	4. týždeň 17. mesiaca	1. až 3. týždeň 18. mesiaca	4. týždeň 18. mesiaca
Prevzatie staveniska									
Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí									
Realizácia prác a dodávok									
Overenie geometrických plánov									
Odovzdanie diela									

Za SITEL s.r.o.:

 Ing. Eduard Nemec
 výkonný riaditeľ
 na základe poverenia

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel + DOPADOVÁ ANALÝZA 6/2019

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel

Objednávateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216

Zhotoviteľ: SITEL s.r.o.
Zemplínska 6
040 01 Košice
zástupca zhotoviteľa: [REDAKOVANÉ] – autorizovaný bezpečnostný technik

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za plnenie úloh ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany verejného zdravia v celom rozsahu za svojich zamestnancov ako aj za pracoviská, na ktorých bude vykonávať svoju činnosť u objednávateľa a zároveň zodpovedá objednávateľovi aj za plnenie týchto ako aj ďalej uvedených podmienok svojimi zamestnancami aj osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo vykonávajú činnosti v priestoroch a objektoch objednávateľa.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za zabudovanie len takých materiálov a zariadení, ktoré zodpovedajú požadovaným požiadavkám projektovej dokumentácie, majú platné všetky požadované doklady o uvádzaní výrobkov na trh, ktorými sa preukazujú vlastnosti stavebných a technických výrobkov ako aj doklady o odbornej spôsobilosti na ich inštaláciu, ak sa vyžadujú, ako aj osvedčenia o požiarnych konštrukciách v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ má právo vyžiadať si tieto doklady ešte pred zabudovaním týchto výrobkov do stavby. V prípade, že zhotoviteľ tieto doklady nepredloží alebo nezabuduje výrobok s požadovanými vlastnosťami alebo ho inštaluje osobami bez odbornej spôsobilosti, objednávateľ má právo neuhradiť náklady až do doby, kedy budú nedostatky odstránené.

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMÍ

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať požiadavky a dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením alebo zanedbaním všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem, určených predpisov objednávateľa alebo zmluvných dojednaní.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej BOZP) a ochrany pred požiarmi (ďalej OPP). V prípade zistenia porušovania predpisov a zásad BOZP a OPP zamestnancami a/alebo inými osobami konajúcimi pre zhotoviteľa, je tento povinný urobiť nápravu podľa pokynov objednávateľa, vrátane

rešpektovania zákazov práce, či vykázania porušovateľov. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru a ostatných kontrolných orgánov v tejto oblasti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Pre zhotoviteľa platia tieto základné bezpečnostné pokyny:

- a) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti činností, ktoré zhotoviteľ alebo jeho zamestnanci a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa vykonávajú a to najmä zabezpečiť, aby stroje, zariadenia, materiály, nástroje a pracovné postupy neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci vlastných zamestnancov, zamestnancov objednávateľa, ako aj ostatných osôb, ktoré sa zdržiavajú v priestoroch objednávateľa alebo v ich blízkosti.
- b) Zhotoviteľ je v prípade zistenia ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a ochrany pred požiarmi povinný informovať o takomto ohrození objednávateľa a pokiaľ je takéto ohrozenie spôsobené okolnosťami súvisiacimi s jeho činnosťou, je povinný zabezpečiť odstránenie takého ohrozenia na vlastné náklady. V ostatných prípadoch je povinný takéto ohrozenie odstrániť objednávateľ na vlastné náklady a zhotoviteľ je v miere nevyhnutnej na odstránenie takého ohrozenia povinný mu poskytnúť súčinnosť.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa a zdržiavajúce sa v priestoroch objednávateľa s jeho súhlasom poučenie, školenie, preškolenie a oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu požadovanom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- d) Zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa sú povinní používať pri práci stanovené osobné ochranné prostriedky a pomôcky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky, a taktiež vyžadovať a kontrolovať ich používanie. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť ochranu zamestnancov objednávateľa, ak vykonáva činnosti, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť alebo zdravie.
- e) Ak budú zhotoviteľom vykonávané práce, ktoré by mohli zasiahnuť do prevádzky objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vopred oznámiť objednávateľovi informáciu o rozsahu práce a miesto výkonu tejto práce. Ak objednávateľ bude súhlasiť s výkonom takýchto prác je zhotoviteľ povinný sa dohodnúť na podmienkach na zaistenie BOZP a OPP svojich zamestnancov ako aj zamestnancov objednávateľa. Cieľom je zaistiť bezpečnosť zamestnancov zhotoviteľa i objednávateľa.
- f) Zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa ako aj iné osoby, zdržujúce sa s vedomím zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa zodpovedajú za poriadok a čistotu v priestoroch objednávateľa, v ktorých vykonávajú pracovné alebo obdobné činnosti pre zhotoviteľa ako aj cez ktoré prechádzajú.
- g) Zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa a osoby zdržujúce sa s jeho vedomím na pracoviskách objednávateľa sa môžu zdržiavať len na určených pracoviskách a v prevádzkach či priestoroch objednávateľa, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli poučení o BOZP, možnostiach vzniku úrazu a OPP. Pri vstupe na tieto pracoviská, do sociálnych zariadení a pod. môžu používať len komunikácie, ktoré sú na tento účel určené. Vstupovať do ostatných priestorov objednávateľa alebo zdržiavať sa v týchto priestoroch môžu len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa a sprevádzaní určeným oprávneným zamestnancom objednávateľa.
- h) Vodiči dopravných prostriedkov zhotoviteľa, ktorí zaistujú dopravu v priestoroch objednávateľa, sú okrem platných všeobecne záväzných predpisov povinní rešpektovať tiež vnútorné značenia a pravidlá prevádzky na komunikáciách objednávateľa a v prípade pohybu v areáli letiska aj predpisy, smernice a pokyny, platné pre areál letiska.
- i) V prípade potreby prechodného vytvorenia skládky alebo drobného ukladania stavebného a podobného materiálu môže zhotoviteľ tieto vytvoriť len v priestoroch

a na miestach, ktoré k tomu budú určené určeným zamestnancom objednávateľa, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.

- j) Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa skladovať látky, tovar alebo materiál, pre ktorého dopravu, skladovanie a manipuláciu platia osobitné predpisy. Jedná sa hlavne o výbušniny, zbrane a strelivo, jedy a podobné látky, horľaviny, látky ohrozujúce život alebo zdravie osôb alebo ohrozujúce životné prostredie a pod. O prípadnom skladovaní takýchto látok musí byť medzi objednávateľom a zhotoviteľom vopred uzavretá písomná dohoda, ktorá musí obsahovať všetky podmienky stanovené v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch, osobitných predpisoch a normách, ako aj predpisoch a smerniciach objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a zabezpečovať po celý čas pracovných činností u objednávateľa pri skladovaní, ukladaní, pri manipulácii a používaní horľavých látok a horenie podporujúcich látok, chemických látok, jedov a pod. požiadavky OPP a BOZP ustanovené v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Taktiež je povinný predložiť objednávateľovi doklad o vlastnostiach používaných látok na jeho požiadanie (napr. karty bezpečnostných údajov a pod.). Súčasťou písomnej dohody musia byť aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru pre príslušnú oblasť. Tieto vyjadrenia a stanoviská vopred obstaráva a na vlastné náklady zabezpečuje zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia platných všeobecne záväzných právnych predpisov BOZP o evidencii, registrácii a nahlásovaní pracovných úrazov ako aj celý určený postup pri pracovnom úraze.
 5. Zhotoviteľ pri vykonávaní stavebných činností je povinný si zabezpečiť koordinátora BOZP na vlastné náklady, jeho meno, priezvisko, oprávnenie a pod. je povinný nahlásiť 3 dni vopred pred začatím prác, pričom objednávateľ mu vystaví poverenie na činnosť.
 6. Ak by zhotoviteľ vykonával stavebné činnosti je povinný dodať ku všetkým požiarnym konštrukciám, ktoré zhotovil on alebo jeho subdodávateľa – osvedčenie o konštrukciách v zmysle § 8 ods. 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, ako aj osvedčenia o všetkých dodaných výrobkoch, ktoré inštaloval zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľa v požadovanom rozsahu podľa ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov (vrátane vyhlásenia o parametroch, o zhode a pod.).
 7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky úlohy vyplývajúce z vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a to najmä:
 - a) zabezpečiť úlohy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v zmysle prílohy č.1 tejto vyhlášky,
 - b) zabezpečiť úlohy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach v zmysle prílohy č.6 tejto vyhlášky,
 - c) a ďalšie.
 8. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiadaviek pri používaní pracovných prostriedkov v zmysle ustanovení NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 9. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiadaviek pri ručnej manipulácii s bremenami v zmysle ustanovení NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
 10. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky používané pracovné prostriedky a zariadenia boli kontrolované v určených lehotách a bez nedostatkov. Osoby, ktoré ich budú používať musia

byť preukázateľne oboznámené s pokynmi od ich výrobcu. Zhotoviteľ je povinný tieto skutočnosti na požiadanie preukázať objednávateľovi.

11. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne vykonávať kontroly dodržiavania požiadaviek BOZP a OPP na jemu zverených pracoviskách, priestoroch, zariadeniach a na miestach, kde vykonáva svoju činnosť, a vyžadovať plnenie povinností v oblasti BOZP a OPP od svojich zamestnancov, dodávateľov, osôb, ktoré sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú na týchto pracoviskách.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie povinností vyplývajúcich z predpisov o OPP, je povinný plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a to svojimi zamestnancami, ako aj osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo vykonávajú činnosti v priestoroch podľa zmluvy pre objednávateľa a je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov o OPP a BOZP v priestoroch a na pracoviskách, kde vykonáva činnosť zhotoviteľ alebo sa zdržujú zamestnanci alebo ďalšie osoby vykonávajúce činnosť pre zhotoviteľa. V prípade podozrenia zo vzniku požiaru môže objednávateľ vykonať mimoriadnu protipožiarnu prehliadku týchto priestorov aj bez prítomnosti zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť pri vykonávaní kontrol plnú súčinnosť zamestnancom a v mimopracovnom čase osobám SBS objednávateľa. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor vykonávať kontroly v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
13. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za škody, ktoré vzniknú nedodržaním požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem a ustanovení tejto zmluvy o OPP a BOZP alebo, ktoré vzniknú zhotoviteľovou činnosťou, nečinnosťou alebo nedbanlivosťou v tejto oblasti.
14. Zhotoviteľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa inštalovať alebo používať v priestoroch objednávateľa technické alebo technologické stroje, prístroje a zariadenia, vrátane ručného prenosného zariadenia, predlžovacie šnúry a drobné elektrické spotrebiče a zariadenia (ďalej zariadenie), ktoré by mohli preťažiť sieť a spôsobiť poruchu alebo požiar na zariadení alebo elektrických rozvodoch. Všetky technické a technologické zariadenia vrátane vyhradených technických zariadení (ďalej zariadenia) môže zhotoviteľ pripojiť a používať len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
 - a) Zhotoviteľ písomne požiada prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa o pripojenie elektrických zariadení do siete v časovom predstihu minimálne 3 týždne, pričom žiadosť musí obsahovať druh zariadenia, technické parametre výrobku, návod na použitie, príkon elektrického spotrebiča a zariadenia podľa údajov na štítku a označenie, resp. popis miestností a priestorov, v ktorých má byť spotrebič alebo zariadenie inštalované, prípadne ďalšie požiadavky spojené s jeho prevádzkou.
 - b) Zhotoviteľ bude pripájať do elektrickej siete objednávateľa len tie elektrické spotrebiče a zariadenia, ktoré mu objednávateľ písomne odsúhlasil a len na miestach pripojenia, ktoré mu objednávateľ určil pri dodržaní všetkých podmienok a obmedzení uvedených v súhlase s pripojením elektrických spotrebičov a zariadení zhotoviteľa do elektrickej siete objednávateľa.
 - c) Povolené elektrické spotrebiče a zariadenia môže zhotoviteľ používať len v stanovenom pracovnom čase. Zhotoviteľ musí určiť zodpovednú osobu a zabezpečiť vypnutie elektrických zariadení v mimopracovnom čase alebo v čase neprítomnosti osôb v priestore objednávateľa; vypínanie sa netýka spotrebičov a zariadení, u ktorých je schválená alebo obvyklá trvalá prevádzka pri dodržaní bezpečnostných predpisov a pokynov výrobcu, ak takúto prevádzku výrobca umožnil.
 - d) V priestoroch objednávateľa budú používané len zariadenia a spotrebiče, ktoré majú platný doklad o uvádzaní na trh napr. vyhlásenie o parametroch, certifikát, resp. osvedčenie o zhode výrobku, osvedčenie o výrobku podľa požiadaviek platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Príloha č.4 - Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel + DOPADOVÁ ANALÝZA 06/2019

- e) Pri inštalovaní, umiestnení a zabezpečení spotrebičov a zariadení budú zhotoviteľom dodržané všetky požiadavky platných všeobecne záväzných právnych predpisov, technické normy a pokyny výrobcu.
 - f) Súčet príkonu elektrických zariadení a spotrebičov pripojených na jednotlivé obvody elektrickej siete v objekte nepresiahne predpísané hodnoty zaťaženia elektrickej siete podľa príslušných predpisov a noriem.
 - g) Výnimočne je možné pripojiť elektrický spotrebič a zariadenie zhotoviteľa do elektrickej inštalácie objednávateľa na základe ústneho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu a to len z dôvodu bezprostrednej likvidácie havárie alebo nevyhnutnej likvidácie jej následkov.
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu všetkých technických a technologických zariadení vrátane vyhradených technických zariadení z hľadiska OPP a BOZP, ktoré sú v jeho vlastníctve a užívaní v priestoroch objednávateľa. Táto povinnosť sa týka všetkých aj prenosných a obdobných elektrických, plynových, tlakových a iných zariadení. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť písomný doklad o vykonaných kontrolách a odborných prehliadkach a skúškach uvedených zariadení. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa zasahovať žiadnym spôsobom do prevádzky uvedených zariadení a najmä zariadení objednávateľa.
16. Zhotoviteľ je povinný vykonať podľa predpisov o OPP opatrenia na zabezpečenie OPP na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. O takýchto činnostiach je povinný informovať objednávateľa, ako aj osoby, ktorých by sa takáto činnosť dotýkala, v dostatočnom predstihu (minimálne 24 hodín vopred). Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru musí vždy vopred oznamovať objednávateľovi resp. určeným zamestnancom objednávateľa (referátu BOZP OPP minimálne 24 hodín vopred). Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za zabezpečenie všetkých požiadaviek pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov o OPP a je povinný zabezpečiť aj ďalšie požiadavky určené objednávateľom. V prípade zistenia nedostatkov pri vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určenými zamestnancami objednávateľa, majú títo právo túto činnosť okamžite ukončiť a vyzvať zhotoviteľa na zmenu technologického postupu, príp. odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ až po zabezpečení týchto opatrení odsúhlasených objednávateľom, môže v ďalšej činnosti pokračovať.
17. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov a osoby, zdržiavajúce sa v priestoroch objednávateľa s vedomím zhotoviteľa, o spôsobe a mieste oznámenia požiaru ako aj spôsobe postupu pri požiari podľa požiarnych poplachových smerníc.
18. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť každý požiar objednávateľovi, ktorý vznikol v priestoroch objednávateľa a následne písomne oznámiť bezodkladne (do 3 pracovných dní) aj údaje o príčine vzniku požiaru, správu o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku OPP a BOZP osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť, preškolenie alebo osobitné oprávnenie.
20. Zhotoviteľ nesmie zakladať oheň, ani spaľovať horľavé látky v priestoroch objednávateľa ani v ich blízkosti; nesmie používať požiarne zariadenia, vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebolo vydané vyhlásenie o parametroch, certifikát, ak sa tieto doklady podľa osobitných predpisov vyžadujú a tiež na činnosti, na ktoré nie sú určené alebo spôsobom, ktorý ich môže porušiť alebo ktoré môžu viesť k ich neakcieschopnosti.
21. Zhotoviteľ je povinný vopred zabezpečiť účasť na školení a oboznámení, informovaní všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa budú zdržovať s jeho vedomím na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby osoby a zamestnanci, ktorí toto školenie a oboznámenie, informovanie o OPP a BOZP neabsolvovali, nemali prístup do priestorov

objednávateľa. Termín školenia, oboznámenia a informovania si dohodne so zamestnancom referátu BOZP OPP vopred na tel.č. [REDAKOVANÉ] alebo [REDAKOVANÉ].

III. REŽIM VSTUPU ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A/ ALEBO INÝCH OSÔB KONAJÚCICH PRE ZHOTOVITEĽA DO VYHRADENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PRIESTOROV A NEVEREJNÝCH PRIESTOROV LETISKA

1. Vstup zamestnancov zhotoviteľa a/alebo iných osôb konajúcich pre zhotoviteľa do vyhradených bezpečnostných priestorov a verejných priestorov letiska (ďalej len areálu letiska) je možný za týchto podmienok:
 - a) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa vstupujú do areálu letiska na základe dočasného povolenia na vstup (identifikačný prvok pre externých zamestnancov), vydaného prevádzkovateľom letiska, vždy len v sprievode určeného zamestnanca objednávateľa,
 - b) dočasné povolenia na vstup sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú sa prevádzkovateľom letiska,
 - c) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa sú povinní absolvovať poučenie o ustanoveniach organizačnej normy letiska vzťahujúcej sa k vstupnému režimu letiska a postupu na vydávanie oprávnení k vstupu osôb, vjazdu motorových vozidiel a mobilnej techniky do areálu letiska, ktoré je vykonané sprevádzajúcim zamestnancom objednávateľa,
 - d) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa osobnej detekčnej kontrole a detekčnej kontrole vnášaných vecí pri vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich kontrolu,
 - e) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa vstupujúci a pohybujúci sa v areáli letiska, sú povinní dodržiavať príkazy a pokyny sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa, ako aj prevádzkovateľa letiska a na požiadanie preukázať jeho zástupcom svoju totožnosť,
 - f) po vstupe do areálu letiska sa zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa nesmú vzdávať od sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa,
 - g) je zakázané pohybovať sa mimo určených priestorov, najmä po plochách pre pohyb leteckej a zvláštnej techniky.
 - h) zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:
 - boli bezodkladne odobraté dočasné povolenia na vstup jeho zamestnancom pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo dodávateľského zmluvného vzťahu s objednávateľom a následne boli vrátené určenému zamestnancovi objednávateľa,
 - boli včas vydavateľovi dočasného povolenia na vstup oznámené všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na pôvodné vstupné povolenie, najmä pokiaľ ide o účel, platnosť a priestor vstupu a pohybu,
 - i) pre zamestnancov zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa platí prísny zákaz vnášania zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska s výnimkou zakázaných predmetov nevyhnutných pre výkon prác stanovených touto zmluvou a v rozsahu povolení sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa a to len na základe dočasného povolenia na vnesenie zakázaných predmetov vydaného prevádzkovateľom letiska. Povolenie na vnesenie zakázaných predmetov sa vyznačuje na dočasnom povolení na vstup,
 - j) dočasné povolenie na vnesenie zakázaných predmetov sa vybavuje prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľuje sa prevádzkovateľom letiska,
 - k) v prípade vydania povolenia na vnesenie zakázaných predmetov sú zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa povinní absolvovať poučenie

o pravidlách vzťahujúcich sa na zakázané predmety vo väzbe k areálu letiska, ktoré je vykonané sprevádzajúcim zamestnancom objednávateľa.

IV. REŽIM VSTUPU ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A/ALEBO INÝCH OSÔB KONAJÚCICH PRE ZHOTOVITEĽA DO PRIESTOROV OBJEDNÁVATEĽA

1. Vstup zamestnancov zhotoviteľa a/alebo iných osôb konajúcich pre zhotoviteľa do priestorov objednávateľa je možný za týchto podmienok:
 - a) pred začiatkom prác je zhotoviteľ povinný poskytnúť určenému zamestnancovi objednávateľa alebo sprevádzajúcemu zamestnancovi objednávateľa nasledovné údaje:
 - termín začatia prác,
 - predpokladaný termín ukončenia prác,
 - menný zoznam zamestnancov zhotoviteľa a/alebo iných osôb konajúcich pre zhotoviteľa,
 - b) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa vstupujú do priestorov objednávateľa vždy len v sprievode určeného zamestnanca objednávateľa,
 - c) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa vstupujúci do priestorov objednávateľa, sú povinní dodržiavať príkazy a pokyny sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa, ako aj zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len SBS) a na požiadanie preukázať pri vstupe zamestnancovi SBS svoju totožnosť,
 - d) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa sú povinní absolvovať poučenie o režime vstupu do priestorov objednávateľa, ktoré je vykonané sprevádzajúcim zamestnancom objednávateľa,
 - e) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa osobnej detekčnej kontrole a detekčnej kontrole vnášaných vecí pri vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich kontrolu,
 - f) pre zamestnancov zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa platí prísny zákaz vnášania zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa s výnimkou zakázaných predmetov nevyhnutných pre výkon prác stanovených touto zmluvou,
 - g) po vstupe do priestorov objednávateľa sa zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa nesmú vzdávať od sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa bez jeho súhlasu,
 - h) je zakázané pohybovať sa mimo určených priestorov výkonu práce vyplývajúcich zo zmluvy,
 - i) do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa vstupujú zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa na základe dočasného povolenia vstupu (návštevný identifikačný prvok),
 - j) dočasné povolenia vstupu sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa, schvaľujú sa zodpovedným zamestnancom LPS SR, š. p. a fyzicky vydávajú zamestnancami SBS.

V. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ REŽIMU VSTUPU ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A/ALEBO INÝCH OSÔB KONAJÚCICH PRE ZHOTOVITEĽA

- a) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím alebo zneužitím dočasných povolení na vstup jeho zamestnancami a/alebo inými osobami

konajúcimi pre neho, ako aj za škody, ktoré vzniknú osobám alebo na majetku objednávateľa alebo prevádzkovateľovi letiska alebo ostatným osobám alebo obchodným spoločnostiam v priestoroch objednávateľa alebo v priestore areálu letiska v dôsledku neoprávneného vstupu svojich zamestnancov a/alebo osôb pre neho konajúcich,

- b) držiteľ dočasného povolenia na vstup je zodpovedný za jeho ochranu pred odcudzením, zneužitím, stratou alebo poškodením,
- c) stratu alebo odcudzenie dočasného povolenia na vstup je držiteľ bezodkladne povinný oznámiť sprevádzajúcemu zamestnancovi objednávateľa alebo v prípade dočasného povolenia na vstup do areálu letiska aj prevádzkovateľovi letiska,
- d) v priestoroch objednávateľa a v areáloch letísk je zakázané fotografovanie a vytváranie audio alebo video záznamov, vrátane použitia iných technických prostriedkov na tento účel,
- e) zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s bezpečnostnou ochranou objednávateľa alebo letiska.

VI. PRAVIDLÁ VJAZDU A POHYBU VOZIDIEL ZHOTOVITEĽA V PRIESTOROCH LETISKA A V PRIESTOROCH OBJEDNÁVATEĽA

- a) Vjazd vozidiel zhotoviteľa do areálu letiska je možný len na povolenie vydávané prevádzkovateľom letiska podľa osobitných predpisov, povolenia na vjazd vozidiel sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú sa prevádzkovateľom letiska, parkovanie v areáli letiska je za úhradu v zmysle cenníka prevádzkovateľa letiska,
- b) vjazd a parkovanie vozidiel zhotoviteľa v objektoch objednávateľa je možné len z dôvodu vyloženia/naloženia tovaru alebo výkonu práce vyžadujúcej si parkovanie motorového vozidla na parkovisku objednávateľa, a to len počas výkonu prác súvisiacich so zmluvou,
- c) na vjazd vozidiel do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa je potrebné povolenie na vjazd, ktoré sa vybavuje prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa, schvaľuje sa zodpovedným zamestnancom LPS SR, š. p.
- d) V priestoroch objednávateľa sú vodiči povinní:
 - dodržiavať ustanovenia pravidiel cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia miestnych dopravných prevádzkových poriadkov a stanovené obmedzenie rýchlosti,
 - venovať zvlášť zvýšenú pozornosť pohybu chodcov v areáli a na komunikáciách,
 - parkovať a stáť s motorovým vozidlom len na určených parkovacích miestach v rozsahu plochy parkovacieho miesta,
 - pohybovať sa s vozidlom len po určených komunikáciách.

V Košiciach, dňa

Za zhotoviteľa: Ing. Eduard Nemec
výkonný riaditeľ,
na základe poverenia



DOPADOVÁ ANALÝZA 6/2019

Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3.etapa
realizácia v Oblastiach ZO22 a ZO10

UPOZORNENIE

Tento dokument je duševným majetkom spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS). Rozširovanie, použitie alebo kopírovanie treťou stranou je povolené iba na základe písomného súhlasu manažmentu spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS).

Dátum spracovania	16.01.2020		
Verzia	1.0		
Nahrádza			
Počet strán celkom	24		
Počet príloh	7		
Spracoval		Podpis	Dátum
Posúdil		Podpis	Dátum
Schválil		Podpis	Dátum

**ZÁMERNE NEPOUŽITÉ
INTENTIONALLY LEFT BLANK**

Vyhlásenie k subdodávkam

Identifikačné údaje navrhovateľa

Obchodné meno: SITEL s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Zemplínska 6, 040 01 Košice

IČO: 31668305

Čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky „**Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3.etapa**“,

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky budeme realizovať vlastnými kapacitami.

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne a v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria cena

P.č.	Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: meno a priezvisko	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zabezpečovaný subdodávateľom z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %
1.	AD DRILL s.r.o.. Juh 865/23, 95144 Výčapy - Opatovce IČO: 53425405	██████████	Riadené podvrty	4,24 %
2.	NLB trade, s.r.o.. Bratislavská 235, 908 01 Kúty IČO:44393911	██████████	Zemné a výkopové práce, pokládka HDPE rúr	3,33 %
3.	MODEZ JR, s. r. o, Národná trieda 5, 040 01 Košice IČO: 52 567 001	██████████	Koordinátor BOZP	3,04%
4.	GEOFO spol. s r.o.. Na vyhliadke 34, 84107 Bratislava, IČO: 31331076	██████████	Geodetická činnosť	0,97 %
5.	TomaNet, s.r.o. Športová 160/9, 930 02 Vieska IČO: 47 491 205	██████████	Zemné a výkopové práce, pokládka HDPE rúr	17,80 %

Vyjadrujem svoj súhlas s tým, že v prípade pochybností je obstarávateľ oprávnený požadovať vyhlásenia subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov o ich detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami plnenia, s ktorými bezvýhradne súhlasia.

V Košiciach, dňa


.....
Ing. Eduard Nemec, výkonný riaditeľ,
na základe poverenia


Poznámka:

– ☐ uchádzač vyplní len v prípade, ak je to relevantné

Poučenie tretích strán

POUČENIE TRETÍCH STRÁN
o ich právach, povinnostiach a ich zodpovednosti za toto porušenie

Meno, priezvisko : 

Číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby : 

Názov právnickej osoby : SITEL s.r.o.


IČO právnickej osoby : IČO: 31668305

bol/a v zmysle interných predpisov LPS SR, §. p. (ďalej LPS) týkajúcich sa prístupu tretích strán k informačným systémom LPS (Politika informačnej bezpečnosti v LPS SR, §. p.) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený/á o nasledovných povinnostiach:

- zákaz pripájať svoje technologické prostriedky (napr. notebook, meracie prístroje) k IS LPS, resp. do LAN LPS
- zákaz vynášať zariadenia a iné materiály patriace LPS z priestorov LPS bez písomného súhlasu oprávneného zamestnanca LPS
- zachovávať mlčanlivosť o údajoch spracúvaných v LPS, s ktorými príde do styku počas výkonu prác pre LPS ako aj po zániku funkcie oprávnenej osoby, alebo po skončení jej pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku. Tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu, zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní.


Poučeniu o mojich právach a povinnostiach, ako aj zodpovednosti za ich porušenie som porozumel/a v plnom rozsahu a svojím podpisom to potvrdzujem.

V Bratislave, dňa 1.12.2023



Poučenie tretích strán

POUČENIE TRETÍCH STRÁN
o ich právach, povinnostiach a ich zodpovednosti za toto porušenie

Meno, priezvisko : 
Číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby : 
Názov právnickej osoby : AD DRILL s.r.o.
IČO právnickej osoby : 53425405

bol/a v zmysle interných predpisov LPS SR, §. p. (ďalej LPS) týkajúcich sa prístupu tretích strán k informačným systémom LPS (Politika informačnej bezpečnosti v LPS SR, §. p.) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený/á o nasledovných povinnostiach:

- zákaz pripájať svoje technologické prostriedky (napr. notebook, meracie prístroje) k IS LPS, resp. do LAN LPS
- zákaz vynášať zariadenia a iné materiály patriace LPS z priestorov LPS bez písomného súhlasu oprávneného zamestnanca LPS
- zachovávať mlčanlivosť o údajoch spracúvaných v LPS, s ktorými príde do styku počas výkonu prác pre LPS ako aj po zániku funkcie oprávnenej osoby, alebo po skončení jej pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku. Tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu, zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní.

Poučeniu o mojich právach a povinnostiach, ako aj zodpovednosti za ich porušenie som porozumel/a v plnom rozsahu a svojím podpisom to potvrdzujem.


V Bratislave, dňa 1.12.2023



Príloha č.6 - Poučenie tretích strán

Poučenie tretích strán

POUČENIE TRETÍCH STRÁN
o ich právach, povinnostiach a ich zodpovednosti za toto porušenie

Meno, priezvisko : 

Číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby : 

Názov právnickej osoby : NLB trade, s.r.o.


IČO právnickej osoby : 44393911

bol/a v zmysle interných predpisov LPS SR, š. p. (ďalej LPS) týkajúcich sa prístupu tretích strán k informačným systémom LPS (Politika informačnej bezpečnosti v LPS SR, š. p.) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený/á o nasledovných povinnostiach:

- zákaz pripájať svoje technologické prostriedky (napr. notebook, meracie prístroje) k IS LPS, resp. do LAN LPS
- zákaz vynášať zariadenia a iné materiály patriace LPS z priestorov LPS bez písomného súhlasu oprávneného zamestnanca LPS
- zachovávať mlčanlivosť o údajoch spracúvaných v LPS, s ktorými príde do styku počas výkonu prác pre LPS ako aj po zániku funkcie oprávnenej osoby, alebo po skončení jej pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku. Tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu, zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní.

Poučeniu o mojich právach a povinnostiach, ako aj zodpovednosti za ich porušenie som porozumel/a v plnom rozsahu a svojím podpisom to potvrdzujem.


V Bratislave, dňa 1.12.2023




Príloha č.6 - Poučenie tretích strán

Poučenie tretích strán

POUČENIE TRETÍCH STRÁN
o ich právach, povinnostiach a ich zodpovednosti za toto porušenie

Meno, priezvisko : 

Číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby : 

Názov právnickej osoby : MODEZ JR, s. r. o,


IČO právnickej osoby : IČO: 52 567 001

bol/a v zmysle interných predpisov LPS SR, š. p. (ďalej LPS) týkajúcich sa prístupu tretích strán k informačným systémom LPS (Politika informačnej bezpečnosti v LPS SR, š. p.) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený/á o nasledovných povinnostiach:

- zákaz pripájať svoje technologické prostriedky (napr. notebook, meracie prístroje) k IS LPS, resp. do LAN LPS
- zákaz vynášať zariadenia a iné materiály patriace LPS z priestorov LPS bez písomného súhlasu oprávneného zamestnanca LPS
- zachovávať mlčanlivosť o údajoch spracúvaných v LPS, s ktorými príde do styku počas výkonu prác pre LPS ako aj po zániku funkcie oprávnenej osoby, alebo po skončení jej pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku. Tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu, zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní.


Poučeniu o mojich právach a povinnostiach, ako aj zodpovednosti za ich porušenie som porozumel/a v plnom rozsahu a svojím podpisom to potvrdzujem.


V. Bratislave, dňa 1.12.2023



Poučenie tretích strán

POUČENIE TRETÍCH STRÁN
o ich právach, povinnostiach a ich zodpovednosti za toto porušenie

Meno, priezvisko : 

Číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby : 

Názov právnickej osoby : GEOFO spol. s r.o.


IČO právnickej osoby : 31331076

bol/a v zmysle interných predpisov LPS SR, §. p. (ďalej LPS) týkajúcich sa prístupu tretích strán k informačným systémom LPS (Politika informačnej bezpečnosti v LPS SR, §. p.) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený/á o nasledovných povinnostiach:

- zákaz pripájať svoje technologické prostriedky (napr. notebook, meracie prístroje) k IS LPS, resp. do LAN LPS
- zákaz vynášať zariadenia a iné materiály patriace LPS z priestorov LPS bez písomného súhlasu oprávneného zamestnanca LPS
- zachovávať mlčanlivosť o údajoch spracúvaných v LPS, s ktorými príde do styku počas výkonu prác pre LPS ako aj po zániku funkcie oprávnenej osoby, alebo po skončení jej pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku. Tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu, zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní.


Poučeniu o mojích právach a povinnostiach, ako aj zodpovednosti za ich porušenie som porozumel/a v plnom rozsahu a svojím podpisom to potvrdzujem.


V Bratislave, dňa 1.12.2023



Poučenie tretích strán

POUČENIE TRETÍCH STRÁN
o ich právach, povinnostiach a ich zodpovednosti za toto porušenie

Meno, priezvisko : 

Číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby : 

Názov právnickej osoby : TomaNet, s.r.o.

IČO právnickej osoby : 47491205

bol/a v zmysle interných predpisov LPS SR, š. p. (ďalej LPS) týkajúcich sa prístupu tretích strán k informačným systémom LPS (Politika informačnej bezpečnosti v LPS SR, š. p.) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený/á o nasledovných povinnostiach:

- zákaz pripájať svoje technologické prostriedky (napr. notebook, meracie prístroje) k IS LPS, resp. do LAN LPS
- zákaz vynášať zariadenia a iné materiály patriace LPS z priestorov LPS bez písomného súhlasu oprávneného zamestnanca LPS
- zachovávať mlčanlivosť o údajoch spracúvaných v LPS, s ktorými príde do styku počas výkonu prác pre LPS ako aj po zániku funkcie oprávnenej osoby, alebo po skončení jej pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku. Tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu, zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní.

Poučeniu o mojich právach a povinnostiach, ako aj zodpovednosti za ich porušenie som porozumel/a v plnom rozsahu a svojím podpisom to potvrdzujem.

V Bratislave, dňa 1.12.2023

