

ZMLUVA O DIELO Č. 04/2024
UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov Obec Vydrná
Sídlo Vydrná 51, 020 53 Vydrná
Osoba oprávnená konať Milan Gášek, starosta obce
IČO 00692379
DIČ 2020616950
Bankové spojenie VÚB banka, a. s.
IBAN SK27 0200 0000 0047 0370 1151

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov Ing. Marián Sahul STAVEKO
Sídlo Benkova 13, 949 11 Nitra
Osoba oprávnená konať Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy
IČO 14410923
DIČ 1020396982
IČ DPH SK1020396982
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK85 5600 0000 0008 0415 3002
Zapísaný v: Živnostenskom registri Oú Nitra, číslo registra 403-3112

Článok I
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je „**Dokončenie kanalizácie v obci Vydrná**“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- 1.2 Realizácia predmetu tejto zmluvy, definovaného v Článku II tejto zmluvy, bude financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu, a to na základe výzvy č. „B-1/2022“.

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „**Vydrná-kanalizácia**“

Miesto stavby : obec Vydrná, okres: Púchov, Trenčiansky kraj

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- b) Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „Dokumentácia“),
- c) Výkaz výmer,
- d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať objednávatelovi.

- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámi s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarat' Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
- 2.6 Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzдание diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii:
- Vytýčenie stavby, geodetické práce
 - Dopravné značenie počas výstavby
 - Informačná tabuľa
 - Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
 - Prevádzkový poriadok
 - Zriadenie aj odstránenie staveniska
 - Revízne správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute a odpadov vzniknutej počas realizácie výstavby, energetický certifikát (ak ho právne predpisy vyžadujú)

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo najneskôr **do 6 mesiacov** od prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie Diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od objednávatela prevziať do 7 dní odo dňa schválenia verejného obstarávania Environmentálnym fondom. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska po schválení verejného obstarávania Environmentálnym fondom. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní, hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy, uplynutím tejto lehoty.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní).
- 3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávatela;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškaní Objednávatela s odovzdaním staveniska;
 - f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.
- 3.4 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Zmena termínu zhotovenia diela sa vykoná formou písomného dodatku tejto zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).

- 3.5 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.
- 3.6 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky financovania realizácie predmetu tejto zmluvy z prostriedkov mechanizmu Environmentálneho fondu celkové ukončenie realizácie predmetu tejto zmluvy nesmie presiahnuť termín 31. 10. 2025. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť k úspešnému dokončeniu predmetu tejto zmluvy (Diela) do vyššie uvedeného termínu a v súlade s podmienkami mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Objednávateľovi hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) financovania predmetu tejto zmluvy (Diela), čo predstavuje priamu škodu Objednávateľa, za ktorú Zhotoviteľ preberá zodpovednosť a zaväzuje sa ju uhradiť. Vzhľadom k ukončeniu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nie je možné predĺžiť dobu realizácie predmetu tejto zmluvy (Diela).

Článok IV Cena diela

- 4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 696 460,90EUR |
| DPH 23 %: | 160 186,01EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 856 646,91EUR. |
- 4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo. Výkaz výmer bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).
- 4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
- 4.4 Vysúťažená cena je konečná, k zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a to formou dodatku v súlade s § 18 ZVO:
- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
 - b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
 - c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 - d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.
- 4.6 Zmluvná cena dohodnutá v bode 4.1. čl. IV. sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán aj v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk.
- 4.7 Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v

stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%, a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

- 4.8 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.
- 4.9 Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela nasledovne:
Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr: prvá faktúra môže byť realizovaná po vykonaní 50 % z ceny diela a ďalších 50 % z ceny diela bude fakturované po ukončení stavebných prác na základe vopred odsúhlasených vykonaných prác a dodávok.
Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude tiež:
- predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
- Splatnosť faktúry zhotoviteľa bude 60 dní odo dňa doručenia súhlasného stanoviska Enviromentálneho fondu s použitím finančných prostriedkov na úhradu faktúry.
- 5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
- označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
 - názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
 - číslo zmluvy a označenie diela;
 - označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - dátum dodania plnenia;
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 - výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 - pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
 - prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
- 5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

- 5.5 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.
- 5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- 6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehladol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť :
- a) Objednávateľovi,
 - b) stavebnému dozoru,
 - c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.
- 6.6 Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:
1. projektovú dokumentáciu,
 2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
 3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.
- 6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.
- 6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým:
- a) ich časový postup,
 - b) údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
 - c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
 - d) rozsah a kvalita prác,

- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.
- 6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- 6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
- 6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat zo stavby.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:
 - poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH,

- poistenie proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH,
- poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 200 000,- EUR,
- poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,- EUR.

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení predložením poistky alebo poistnej zmluvy najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.

- 6.20 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.
- 6.21 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakryvaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
- 6.25 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.
- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje,

že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

- 6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
- 7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
- 7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.2 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % zo zmluvnej ceny diela.
- 7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela a to aj opakovane.
- 7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé takéto porušenie povinností.
- 7.8 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.
- 7.9 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo v prípade, ak nebude verejné obstarávanie a táto zmluva o dielo odsúhlasená Environmentálnym fondom po vykonaní administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania a nebude odsúhlasený rozpočet a tiež súlad opisu činností a prác realizovaných podľa tejto zmluvy s Projektom a nebude uzatvorený písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenej dňa 20.12.2022 medzi objednávatelom a Environmentálnym fondom č. zmluvy 220089 08U01 za účelom zapracovania predložených dokumentov – zmluvy o dielo do Zmluvy s Environmentálnym fondom.
- 8.2 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo

odobrat' Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa:

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozorení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo;
 - d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.
- 8.3 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.2 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.
- 8.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.
- 8.5 Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,
- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
 - b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
 - c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.
- 8.6 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 8.7 Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.
- 9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií;
 - b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy);
 - c) kópiu Stavebného denníka;
 - d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti;
 - e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi;
 - f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán;
 - g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
 - h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.
- 9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.
- 9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov, ktoré by

znemožňovali či obmedzovali užívanie stavby a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

- 9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.
- 9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
- a) základné údaje o diele,
 - b) zoznam odovzdaných dokladov,
 - c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.8 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdanú časť diela osobitne.
- 9.11 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 9.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vadu diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 9.14 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X. Využitie subdodávateľov

- 10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov vrátane ich identifikačných údajov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO a zároveň uvedie jeho identifikačné údaje, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj povinnosť

predložiť zápis do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Uvedené je nutné vykonať najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo po uzavretí zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr). Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

- 10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
- 10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1 Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ing. Marián Sahul. Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.
- 11.2 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.3 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.
- 11.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávatelom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.
- 11.5 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručenie za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 11.6 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 11.7 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.
- 11.8 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.
- 11.9 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej

úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

- 11.10 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
- 11.11 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
- 11.12 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a) zverejnenie zmluvy v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
b) dňom nasledujúcim po dni schválenia výsledku kontroly verejného obstarávania - zadávania podlimitnej zákazky s názvom „Dokončenie kanalizácie v obci Vydrná,“ vykonanou Environmentálnym fondom (o výsledku kontroly verejného obstarávania bude Objednávateľ informovať bezodkladne Zhotoviteľa).
- 11.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávatelom a to oprávnenými osobami, najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Za Objednávateľa:

V Vydrnej, dňa 8.1. 2025

Za Zhotoviteľa:

V Nitre, dňa 20.12.2024



Milan Gášek - starosta obce

S7
Ing. Mar
BENKOV
IČO: 14 47
ŽR SR

Ing. Marián Sahul – riaditeľ

Harmonogram stavby "Výdrná - kanalizácia"

		Týždne																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		Množstvo	MJ	Počet pracovníkov	Popis																								
HMG	Výdymá - kanalizácia																												
1	Kanalizačné odbočenia																												
1	Zemné práce																												
115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l, vr. pohotovosti čerpacej súpravy	160,000	hod	1																									
132201202R	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3, vr. skývky ornice, vr. prípl. za lepiivosť, vr. m+ d paženia, vr. vodor. premiestnenia prebyť. zeminy na skládku, jej uskladnenia a poplatku za uskladnenie, vr. ručného odkopu v mieste inž. sieti	894,960	m3	5																									
132201202RR	Výkop šachty horn.3 od 100 do 1000 m3, vr. skývky ornice, vr. prípl. za lepiivosť, vr. m+ d paženia, vr. vodor. premiestnenia prebyť. zeminy na skládku, jej uskladnenia a poplatku za uskladnenie, vr. ručného odkopu v mieste inž. sieti	279,675	m3	2																									
174101002R	Zásyp sypaninou a kamenivom so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, vr. dodávky kameniva fr. 16-32 mm	703,430	m3	3																									
175101010R	Obsyp potrubia kamenivom z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia , vr. dodávky kameniva 8-32 mm	189,840	m3	2																									
4	Vodorovné konštrukcie																												
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	81,360	m3	2																									
5	Komunikácie																												
564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	73,500	m2	3																									
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	73,500	m2	3																									
577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm, vr. spoj. postreku a preplátovania	73,500	m2	4																									
577141312	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení III.tr., strednozrnný AC 11 O hr. 50mm, vr. spoj. postreku a preplátovania	73,500	m2	4																									
8	Rúrové vedenie																												
871353121R	Montáž a dodávka potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 160, vr. tesnenia, tvaroviek, v prípade potreby obetňovania potrubia, vr. skúšky tesnosti potrubia	684,000	m	3																									
8944312pc.1	Zhotovenie revíznej šachty z PVC, DN 400, vr. dodávky materiálu - dno, šacht. rúra, PVC teleskopu, prstenca a poklopu, tesnenia, v prípade potreby debnenie a obetňovanie potrubia	114,000	ks	3																									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																												
111307131	Odstánenie podkladu alebo krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm , vr. odvozu na skládku, uloženia a poplatku za skladovanie	73,500	m2	3																									
1113307124R	Odstánenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, vr. odvozu na skládku	73,500	m2	2																									
919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	500,000	m	1																									
99	Presun hmôt HSV																												
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	228,195	t	2																									
2	Vetva A - DN 250 366 m, šachta 93-110 vrátane, 17 šacht																												
1	Zemné práce																												
115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l, vr. pohotovosti čerpacej súpravy	105,000	hod	1																									

	Týždeň																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Počet pracovníkov																								
	Množstvo MJ																								
	Popis																								
132201202R	Výkop ryhy šířky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3, vr. skřivky ornice, vr. přípl. za lepiš, vr. m+ d paženia, vr. vodor. premiestnenia prebyť zeminy na skládku, jej uskladnenia a poplatku za uskladnenie, vr. ručného odkopu v mieste inž. sieti																								
174101002R	Zásyp sypaninou a kamenivom so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, vr. dodávky kameniva fr. 16-32 mm																								
175101010R	Obrys potrubia kamenivom z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia, vr. dodávky kameniva 8-32 mm																								
181101102R	Uprava plánu vyrovnanim výškových rozdielov, dosypanie zeminy do pôvodného stavu.																								
4	Vodorovné konštrukcie																								
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm																								
452311141R	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20, vr. vystuženia podkl. dosiek																								
5	Komunikácie																								
564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm																								
577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm, vr. spoj, postreku a preplátovania																								
577141312	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení III.tr., strednozrnný OK hr. 100mm, vr. spoj, postreku a preplátovania																								
8	Rúrové vedenie																								
871353121RR	Montáž a dodávka potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PP DN 250 SN 8, vr. tesnenia, tvaroviek, v prípade potreby obetónovania potrubia, vr. skúšky tesnosti potrubia																								
8944312pc.1	Zhotovenie kanalizačnej šachty z PP DN 1000, vr. dodávky materiálu - dno, šacht. nádstavec a kónus, vr. prstenca a poklopu D, tesnenia, v prípade potreby debnenie a obetónovanie potrubia																								
99	Presun hmôt HSV																								
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope																								

K – kritická cesta
Práce realizujeme vlastnými pracovníkmi

STAVEKO
Ing. Marián Sahuľ STAVEKO
BENKOVA 13, 94
IČO: 14 10 923 IČ DI
ŽR SR-Nitra, rep. Č

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Vydrná - kanalizácia

JKSO:
Miesto: Vydrná

Objednávateľ:
Obec Vydrná

Zhotoviteľ:
Ing. Marián Sahuľ STAVEKO - Nitra

Projektant:

Spracovateľ:
Kmeťo

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.12.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 14410923
IČ DPH: SK1020396982

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	696 460,90
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	696 460,90
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	696 460,90	160 186,01

Cena s DPH	v	EUR	856 646,91
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVEKO
Ing. Marián Sahuľ STAVEKO

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Stavba: **VYDRNÁ – KANALIZÁCIA**
Stavebný objekt: **KANALIZAČNÉ ODBOČENIA**
Investor: **Obec Vydrná, okres Púchov**
Projektant: **Anna KORENÍKOVÁ, aut.ing Tatranská 294/11-1 POV. BYSTRICA**
Dátum : **2015-09-14**

Špeciálny stavebný úrad
overuje
projektovú dokumentáciu k rozhodnutiu
č. 00-PV-052P-2015/00.11.84/EB4
zo dňa 26.11.2015,
ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Podpis: _____



SPRIEVODNÁ a TECHNICKÁ SPRÁVA



1

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. identifikačné údaje stavby
2. základné údaje charakterizujúce stavbu
3. prehľad východiskových podkladov
4. členenie stavby
5. vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu
6. prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
7. termíny začatia a dokončenia
8. predpokladaný celkový náklad stavby

Identifikačné údaje stavby

Názov stavby : **VYDRNÁ - KANALIZÁCIA**
Časť : **KANALIZAČNÉ ODBOČENIA**
Miesto stavby : **k. ú. Vydrná**
Okres : **Púchov**
Kraj : **Trenčiansky**
Charakter stavby : **Novostavba**
Investor : **Obec Vydrná**
Orgán udeľujúci súhlas na výstavbu : **OÚ ŽP Pov. Bystrica**
Projektant : **Anna Koreníková Tatranská 294/11-1 Pov. Bystrica**

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Jedná sa o kanalizačné odbočenia na splaškovej kanalizácii, ktoré budú slúžiť pre napojenie objektov priľahlých ku kanalizácii. Odbočenia budú pripojené na kanalizáciu PVC DN300 sedlovými odbočkami DN 150 v celkovom počte **114 ks**. Odbočenia budú prevedené z rúr PVC DN 150 v celkovej dĺžke **684 m**. Na hranici odkanaizovávanej nehnuteľnosti bude odbočenie ukončené kanalizačnou šachtou **D425 mm** v celkovom počte **114 ks**.

Prehľad východiskových podkladov

- Projekt stavby pre realizáciu kanalizácie a jej zmeny
- P+V zameranie splaškovej kanalizácie v záujmovom území
- Obhliadka staveniska, kontrolné premeranie
- Požiadavky a údaje obecného úradu.

Členenie stavby

Jedná sa o jeden stavebný objekt.

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Stavba navrhovaného úseku vodovodu v obci nie je vecne aj časovo naviazaná na inú stavbu.

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom stavby – celej splaškovej kanalizácie bude organizácia oprávnená k takýmto činnostiam.

Termín začatia a dokončenia

V zmysle údajov investora bude táto časť stavby zrealizovaná cca v roku 2016.

Celkový náklad stavby

Predpokladaný investičný náklad bude : 270 000 €

TECHNICKÁ SPRÁVA

V zmysle objednávky sa navrhuje vybudovanie **kanalizačných odbočení** na jestvujúcej splaškovej kanalizácii v obci Vydrná, okres Púchov. Jedná sa o výstavbu 114 ks odbočení pre rodinné domy a okolité objekty príslušné ku kanalizácii.

Východiskové podklady:

- Projekt stavby pre realizáciu kanalizácie a jej zmeny
- P+V zameranie splaškovej kanalizácie v záujmovom území
- Obhliadka staveniska, kontrolné premeranie
- Požiadavky a údaje obecného úradu.

Tieto podklady boli záväzné pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie.

KANALIZAČNÉ ODBOČENIA

Návrh je prevedený v súlade s STN 75 6101. Do jestvujúcej kanalizácie vybudovanej z rúr PVC – U hrdlovaných kanalizačných DN300 budú zhotovené odbočenia pomocou sedlovej odbočky DN 150.

Sedlová odbočka bude odborne osadená na vyvrtaný otvor v hornej polovici priemeru potrubia.

Odbočenia ako aj prípojné potrubia z hlavnej stoky k jednotlivým objektom sú navrhnuté s dimenziou DN 150 v počte **114 kusov**.

Napojenie na stoku bude realizované pomocou kolien 45°. Smerové vedenie prípojok je vždy navrhnuté pod uhlom 90° na zberač, v priamom smere s nemeniacim sa sklonom a prierezom. Odbočenie pre každý objekt bude ukončené revíznou – domovou PP šachtou D 425mm – vid' PD. Pokiaľ nebude prípojka pred zásypom prepojená na domovú kanalizáciu bude prítok do tejto revíznej šachty zaslepený zátkou DN 150. Umiestnenie kanalizačnej prípojky šachty ne navrhované vždy k hranici súkromných pozemkov. Poloha bude spresnená počas realizácie stavby s majiteľom parcely. V návrhu je počítané s priemernou dĺžkou prípojky – 6,0m. Do kanalizácie môžu byť z nehnuteľností napojované výlučne splaškové odpadové vody nakoľko sa jedná iba o splaškovú kanalizáciu.

V zmysle STN sa navrhuje minimálny sklon potrubia DN150 2% (tj. 2cm na 1 m). Prípojky musia byť do zberača zaústené vždy do hornej polovice profilu a majú byť do hlavnej stoky napojené mimo revíznych šachiet na hlavnej stoke.

Minimálny dovolený sklon potrubia DN 150 - 2 %, maximálny sklon 20,0%.

Kapacitné údaje pri kapacitnom plnení $h/d=0,7 D$, hydraulickej drsnosti $k=0,05$, prírážkou $p=15\%$, koncentráciou NL $c = 5 \text{ kg/m}^3$ pri minimálnom sklone sú :

$Q = 28,80 \text{ l/s}$

$V = 1,59 \text{ m/s}$

Materiál kanalizácie

Navrhujeme rúry PVC – kanalizačný systém z rúr hrdlovaných hladkých SN8 DN150/D160/5m . Celková dĺžka potrubia PVC DN150 – 684,0 m.

Kanalizačné šachty

Navrhujeme plastové kanalizačné šachty z PP typ Tegra D425mm s priemernou hĺbkou 1,5m. Táto šachta bude vždy postavená na zhutnenom štrkopieskovom odklade, hr. 150 mm. Šachta bude kompletovaná z korugovanej šachtovej rúry D425, prietochým priamym dnom DN150, plastovým poklopom v zelenej ploche, liatinovým na bet. roznášacom prstenci v spevnenej ploche. Celkový počet – 114 ks.

Požiadavky na stavebné práce – zemné a montážne práce

Kanalizačné potrubie bude ukladané do výkopu s kolmými zapaženými a rozopretými stenami, šírky 800 mm s projektom predpísaným spádom. Postup prác od najnižšieho miesta ryhy. Pri pokládke potrubia je potrebné výkop zbaviť vody. Potrubie bude ukladané na štrkopieskové lôžko hrúbky 150 mm (zrná 4mm). Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej šírke výkopu. Potrubie nebude ukladané pod úrovňou hladiny podzemnej vody. Lôžko musí byť v mieste hrdla rúr vždy vybraté pre uloženie hrdla. Na obsyp potrubia bude použitý dolomitický piesok, zhutnenie na 96% Proctorovej skúšky. Obsyp bude robený po vrstvách max. 300mm a zhutňovaný súmerne po oboch stranách potrubia. Len po stranách potrubia sa zhutňuje až do výšky 300mm nad povrchom rúry. Zhutňovanie nad rúrou je do tejto výšky neprípustné. Zásyp bude v spevnených plochách prevedený prehodenou vytáženou zeminou (v prípade jej možného zhutnenia) alebo recyklátom či štrkopieskom (zo zrnom do 63mm) - v prípade nevhodnosti použitia vytáženej zeminy na spätný zásyp (ily, navážka). Zásyp pod cestou bude rovnako hutnený na 96% Proctorovej skúšky. Vzorové priečne rezy sú súčasťou projektovej dokumentácie.

Odchýlka osi potrubia v zvislom smere nesmie presiahnuť :

pri sklone do 10‰.....+ -10 mm

pri sklone nad 10‰.....+ -30 mm

Špeciálne úseky

Kanalizačné odbočenie č. I 14 na parcelu č. 124 bude prevedené pretlačením pod štátnou cestou v obci Vydrná, č.III/049.Pod teleso cesty bude pretlačená oc. chránička D219/6,3mm v dĺžke 6,0 m a do nej vtiahnuté kanalizačné potrubie PVC DN150. Potrubie bude uložené pomocou objímok „RACT“. Konce chráničky budú utesnené na potrubí tesniacimi manžetami príslušného profilu.

Križovanie s podzemnými a nadzemnými vedeniami

Pred započatím zemných prác bude nutné všetky podzemné vedenia vytýčiť a ručne obnažiť za prítomnosti správcu Zvislé vzdialenosti medzi potrubím a iným podzemným vedením dodržať v zmysle STN 73 6005. Bez vytýčenia všetkých podzemných sietí nie je možné so započatím výkopových prác. V miestach križovania sa odporúča ručný výkop – pri použití mechanizmov zodpovedá za vzniknuté škody dodávateľ stavby. Dodávateľ stavebných prác je povinný rešpektovať aj existenciu a podmienky práce v ochranných pásmach všetkých podzemných a nadzemných telekomunikačných a silových vedení.

Merný objekt

Pred zaústením kanalizácie z obce Vydrná do ČOV Lúky bude na potrubí vybudovaný merný objekt pre stanovenie množstva pretečených odpadových vôd.

Do betónovej šachty 1,3 x 1,0 m bude osadený Parshallov žľab veľkosti „P1“ s rozsahom merania 0,26 – 5,38 l/s. Súprava na meranie prietoku odpadovej vody v gravitačných kanáloch sa skladá z Parshallovho žlabu a z ultrazvukového systému merania hladiny **SenSonar-NIVOSONAR.**


Zúženie Parshallovho žlabu tvorí merný profil, v ktorom dochádza k matematicky definovateľnej zmene prúdenia, v dôsledku čoho sa vzduje hladina. Sondou SenSonar nameraná hladina je vo vyhodnocovacej jednotke NIVOSONAR preprepočítaná na okamžitý prietok a pretečené množstvo s následnou archiváciou údajov do pamäte. Prenos nameraných hodnôt môže byť realizovaný cez unifikovaný analógový prúdový výstup 4 – 20 mA, impulzný reléový výstup.


Presnosť merania v Parshallových žlaboch je závislá na presnosti montáže žlabu a prísnom dodržaní montážnych a prevádzkových predpisov. Parshallov žlab je schválený ako pracovné meradlo s maximálnou chybou merania okamžitého prietoku 1,5%.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci -všeobecné požiadavky

- zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri dotyku s ochrannými pásmami ostatných inžinierskych sietí:
- práce v ochranných pásmach podzemných sietí musia byť vykonávané po presnom vytýčení týchto sietí ich správcami
- práce v ochranných pásmach nadzemných sietí musia byť vykonávané za dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov dodávateľa, s maximálnou opatrnosťou. Dodávateľ musí zohľadniť výšku vedenia a manipulačnú výšku používaných mechanizmov, v prípade potreby dohodnúť so správcami doknutých sietí ich odpojenie počas realizácie daného úseku kanalizácie.
- musia byť výkopy ohradené a v nočných hodinách osvetlené, aby sa predišlo pádom do nich
- pri práci v blízkosti cudzích vedení je potrebné riadiť sa predpismi STN 34 3083 a požiadavkami správcov týchto vedení
- výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu a plynovodných prípojok, vodovodu a vodovodných prípojok vykonávať ručne
- pri výkopoch v blízkosti zelene je potrebné v maximálnej možnej miere chrániť kmene (pomocou debnenia) a koreňový systém (ručným výkopom)
- je stavebník povinný zabezpečiť pred začatím prác splnenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády č.510/2001 z 21. novembra 2001

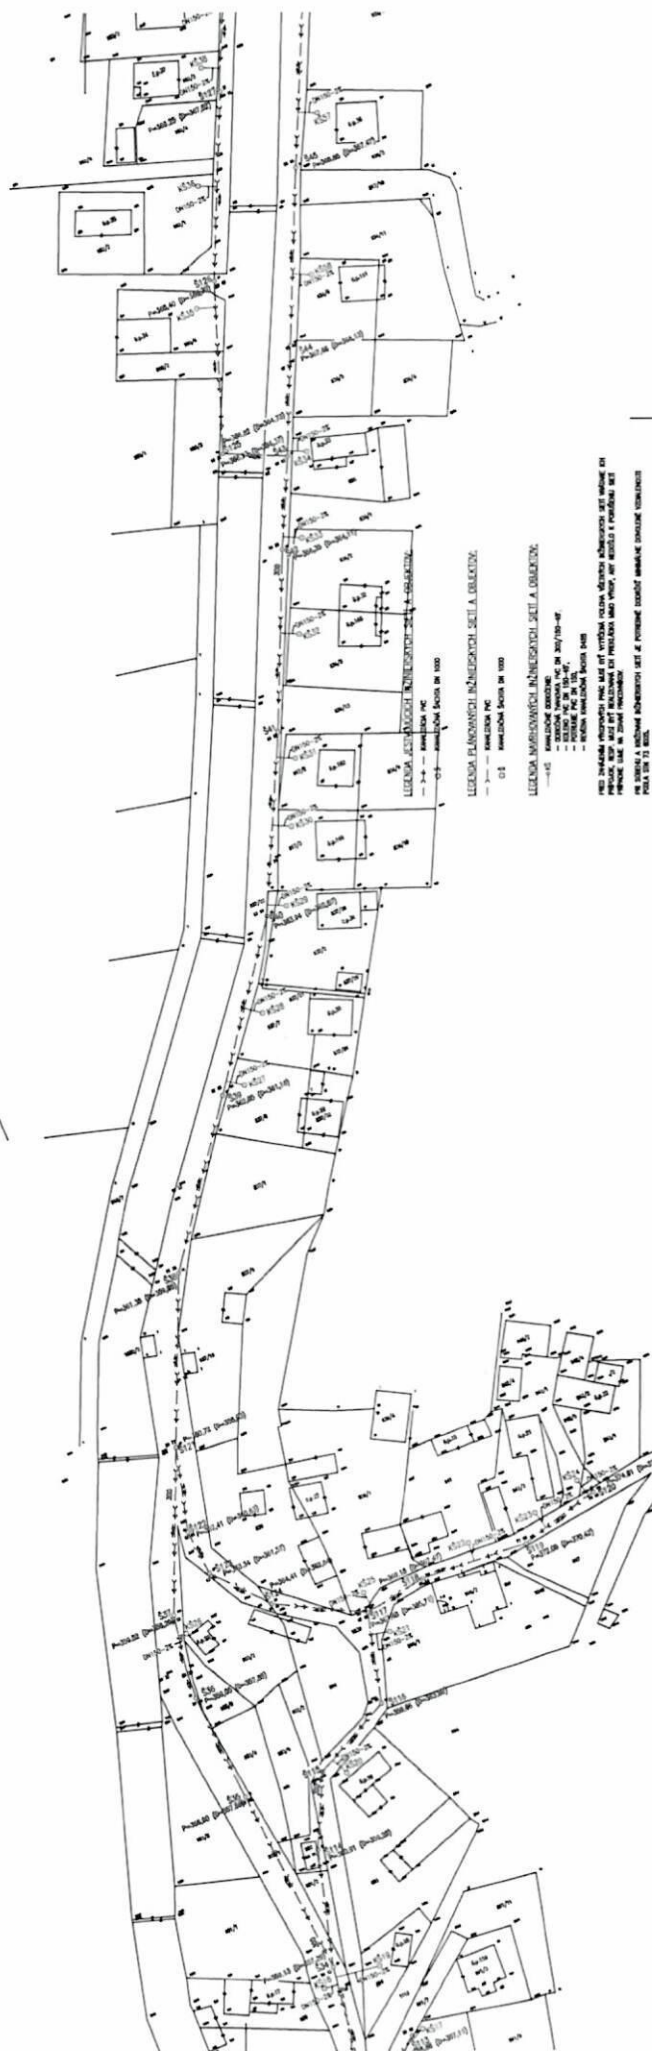


[illegible]

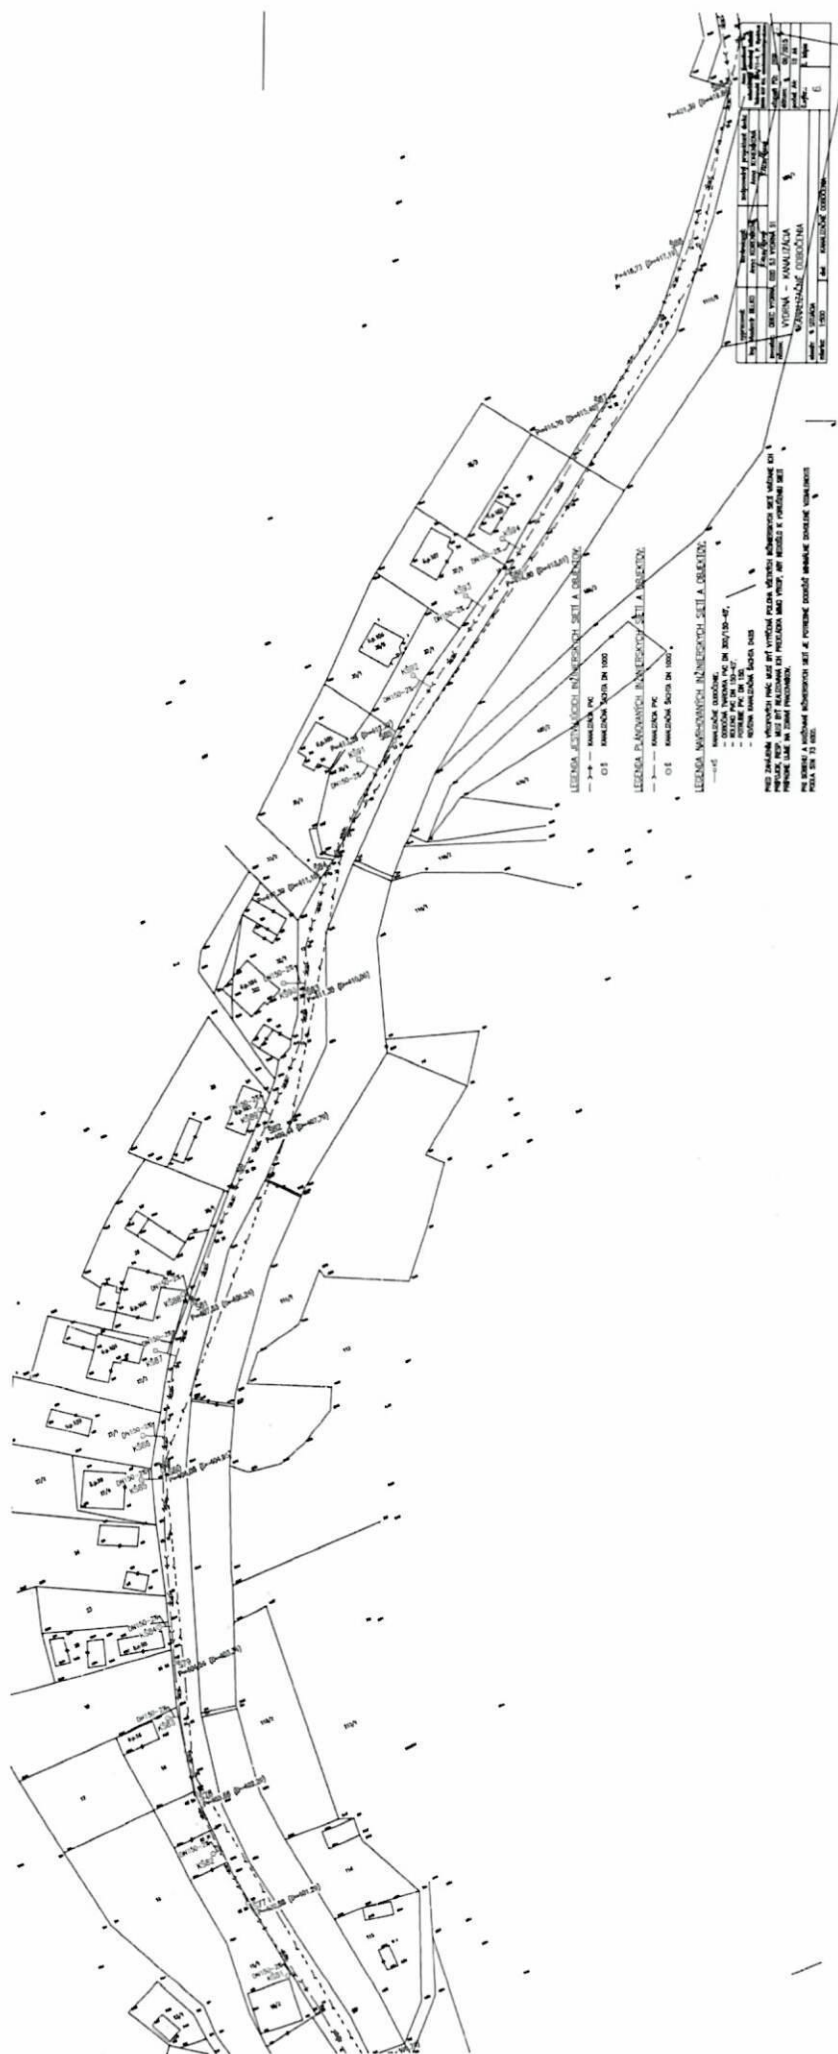


Approved	Reviewed	Reviewed project date	Reviewed by	Reviewed date
By: [Signature]	By: [Signature]	By: [Signature]	By: [Signature]	By: [Signature]
Date: [Date]	Date: [Date]	Date: [Date]	Date: [Date]	Date: [Date]

VITRINA - KANALIZACJA
 WZMAGNIENIE ORODZINA

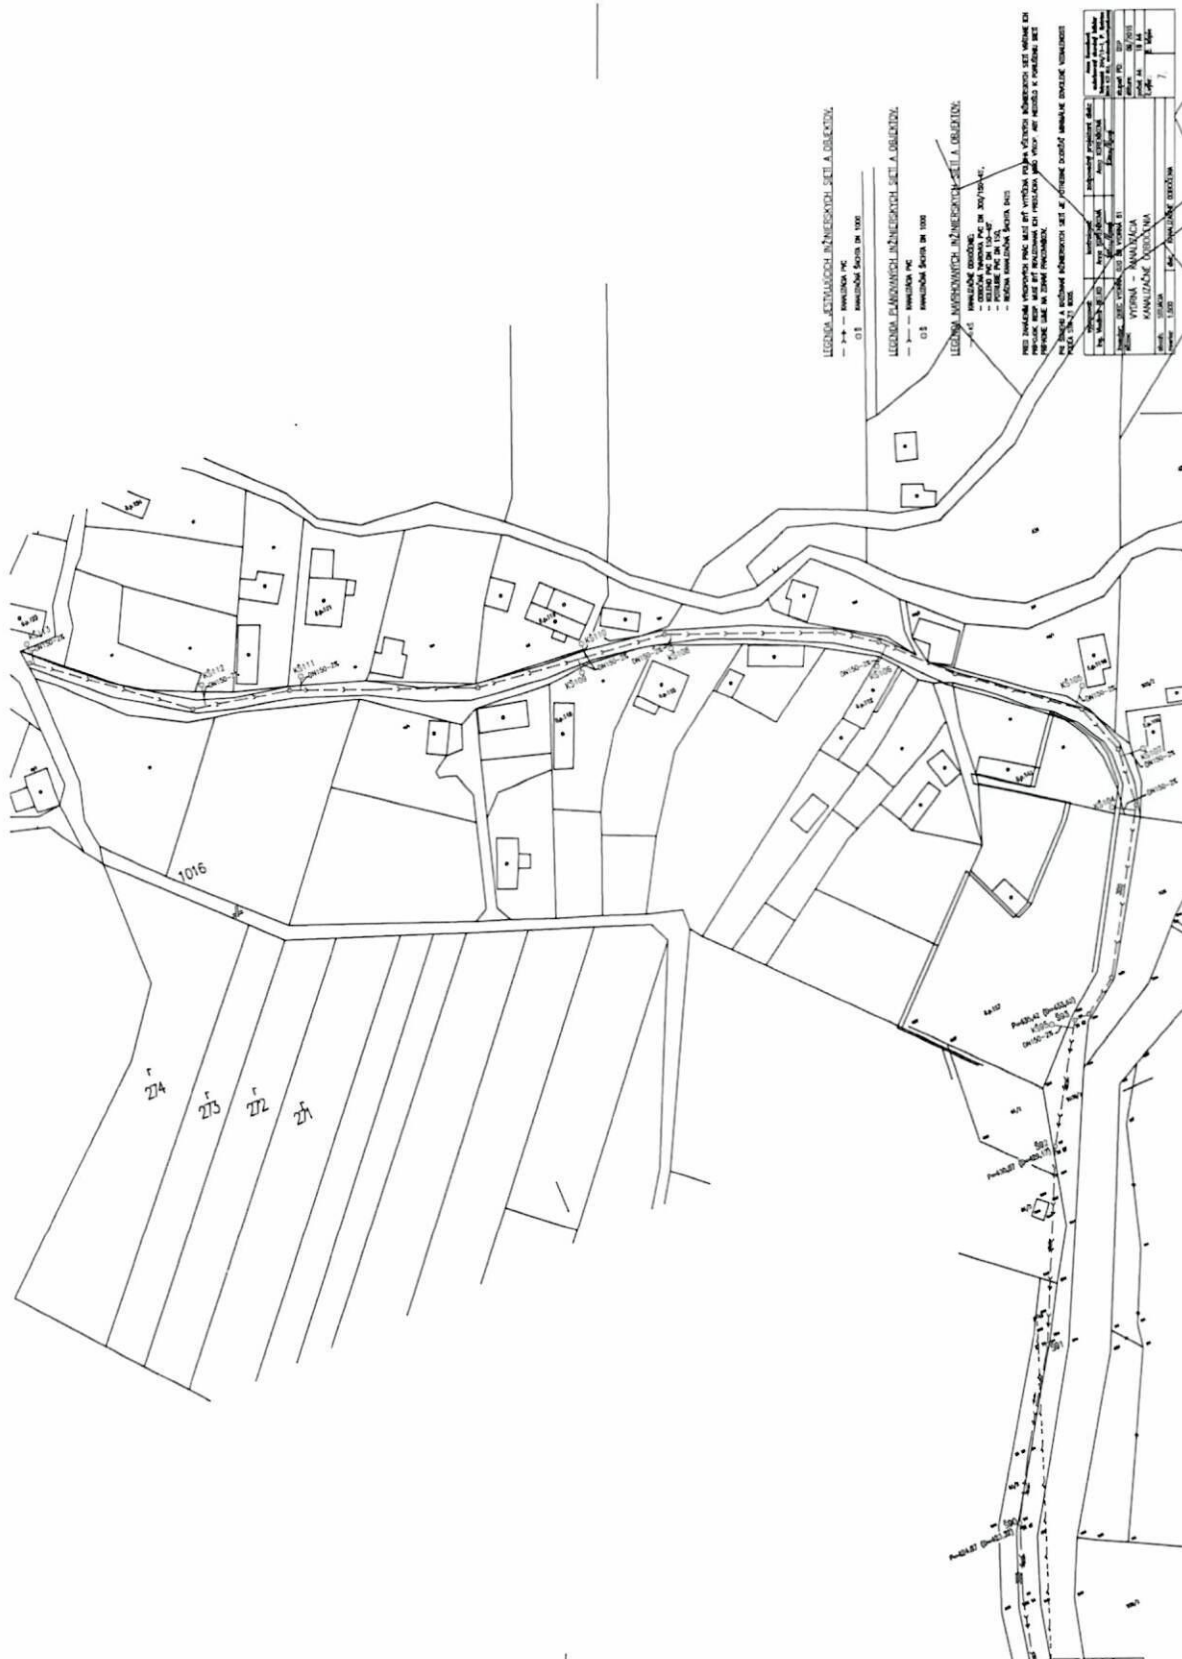



www.ingenta.com
 0950-0804/05/0000-0000
 © 2005 Taylor & Francis Ltd.



LITTELA MÄNTYVAARAN NÄMÄKUNTA KUTSUII KOKOUKSEN 11.12.2014

[illegible]

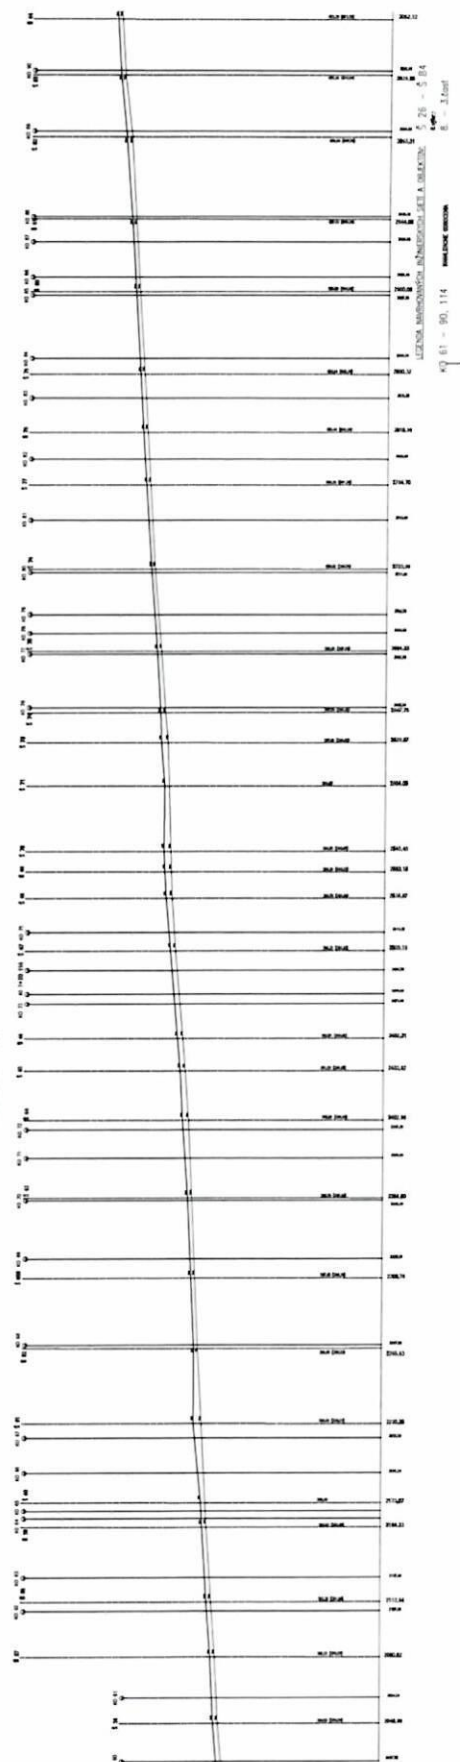


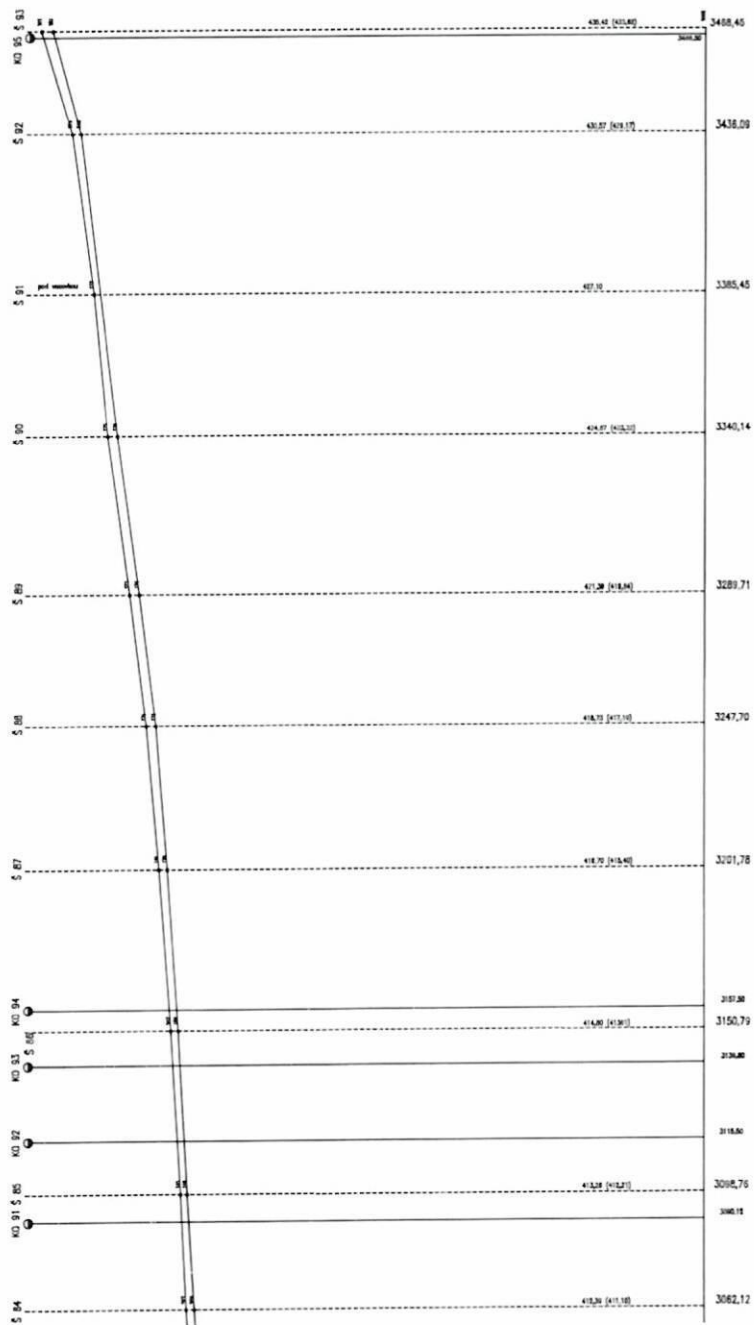


LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽINERSKÝCH SÍŤÍ A OBJEKTŮV:
 § 85 - § 93
 8. - 4.051

KO 91 - 95 KANALIZACE ODSOČNA

KANALIZAČNÁ ŠACHTA TEGRA 425 S TELESKOPISKOU RÚROU
A LIATINOVÝM POKLOPOM 12,5t

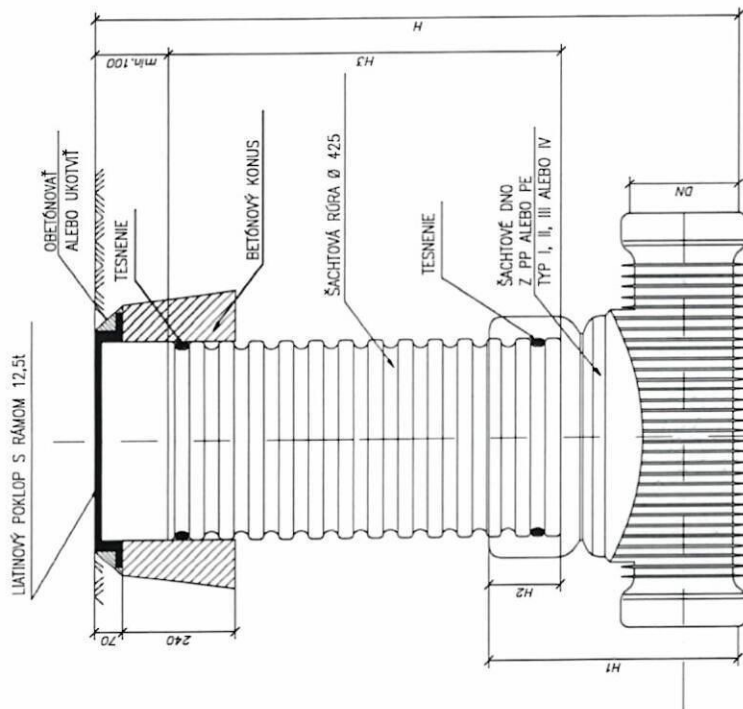

KANALIZAČNÁ ŠACHTA TEGRA 425 S PLASTOVÝM POKLOPOM 1,5t
uprava pre domovú prípojku sachtu

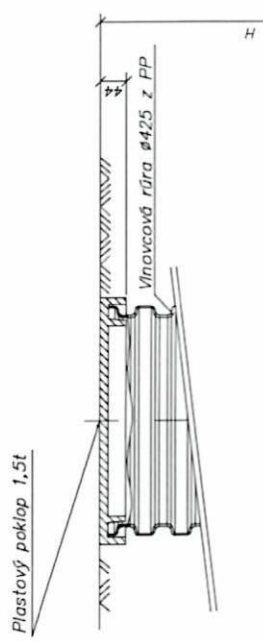

číslo	S	niveleta dna	H	H3	tvorovka "IN SITU"	typ dna
S1-S113			1,50			prietočné 425 DN150

REVÍZNA ŠACHTA PP D425mm – skladba
 DN0 – PRIAME prietočné TEGRA 425 DN150
 RÚRA ŠACHTOVA KORUG.PP D425mm 1,50m
 PE VEKO ŠACHTY
 PRSTENEC+BETONOVÝ POKLOP
 ZÁTKA HRDLA DN 150

DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220


vypracoval:	Ing. Vladimír BELKO	kontroloval:	Anna KORENÍKOVÁ	zodpovedný projektant dielu:	Anna KORENÍKOVÁ
investor:	OBEC VYDRNÁ, 020 53 VYDRNÁ 51	investor:	OBEC VYDRNÁ, 020 53 VYDRNÁ 51	stupeň PD:	DSP
názov:	VYDRNÁ – KANALIZÁCIA	názov:	KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	dátum:	09/2015
obsah:	KANALIZAČNÁ ŠACHTA na ODBOČENÍ z VK	obsah:	KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	počet A4:	5 A4
mierka:	1:30	mierka:	1:30	č. výk.:	č. kópie
					11.

UJÍŤNĚ KANALIZAČNÉHO POTRUBIA PVC-U. PP

M 1:25

Typ "A" - mimo komunikácie
Typ "B" - komunikácia

TYP "B" - KOMUNIKÁCIA

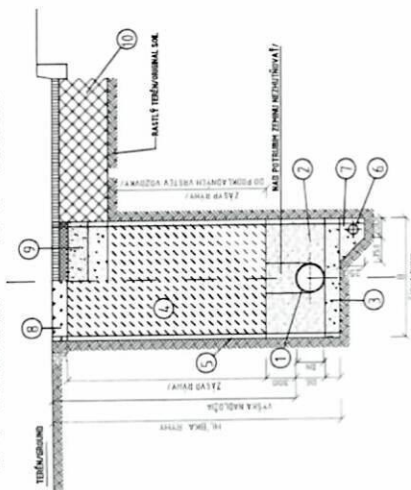

DN	200	300	400	500
DE(mm)	215	330	440	554
DB(mm)	800	920/900	1300	1800
DB(mm)	150	150	150	200

EGENDA



- [illegible]

POZNÁMKY

[illegible]

RENOVA KONSTRUKCE CESTY

- | | |
|------|----|
| 80 | OK |
| 150 | B |
| 200 | OK |
| 250 | B |
| 300 | OK |
| 350 | B |
| 400 | OK |
| 450 | B |
| 500 | OK |
| 550 | B |
| 600 | OK |
| 650 | B |
| 700 | OK |
| 750 | B |
| 800 | OK |
| 850 | B |
| 900 | OK |
| 950 | B |
| 1000 | OK |

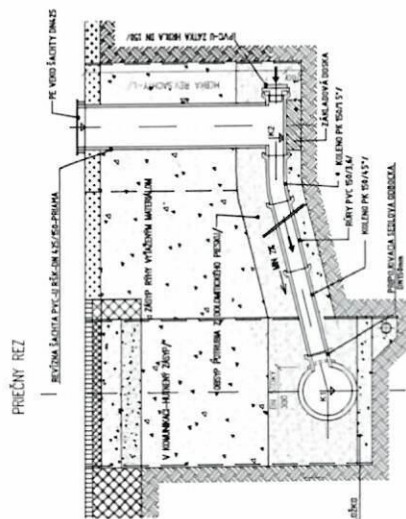

ÚPIS MATERIÁLU PRE KANAL ODOBŔENÉ


—	2004 MEIN IN 150 - 14	—
2	POSTING+REVENUE POLICY - 14	2
2	PE VISA EXEMPT - 14	2
—	PP 250-40-42/15/10-70000	—
—	REVENUE EXEMPT - 14	—
2	RELIGION PK 150/15 - 14	2
2	ROCK PK 150/2 - 14	2
—	RELIGION PK 150/45 - 14	—
—	RELIGION PK 150/45 - 14	—

POSTULADA / MOTIV:

[illegible]


S MAJITELŤOM NEHODUJTE! NIČ JE NIČNE PRO STAVE. PUTOVNÍK MÍSTO NAPLENA DOMOVU KAPALNICE
A JEJÍ MÍSTO V KAPALNICE. (AČTĚ) MÍSTO V MÍSTO PROBY JE 2% (M 1%)

[illegible]

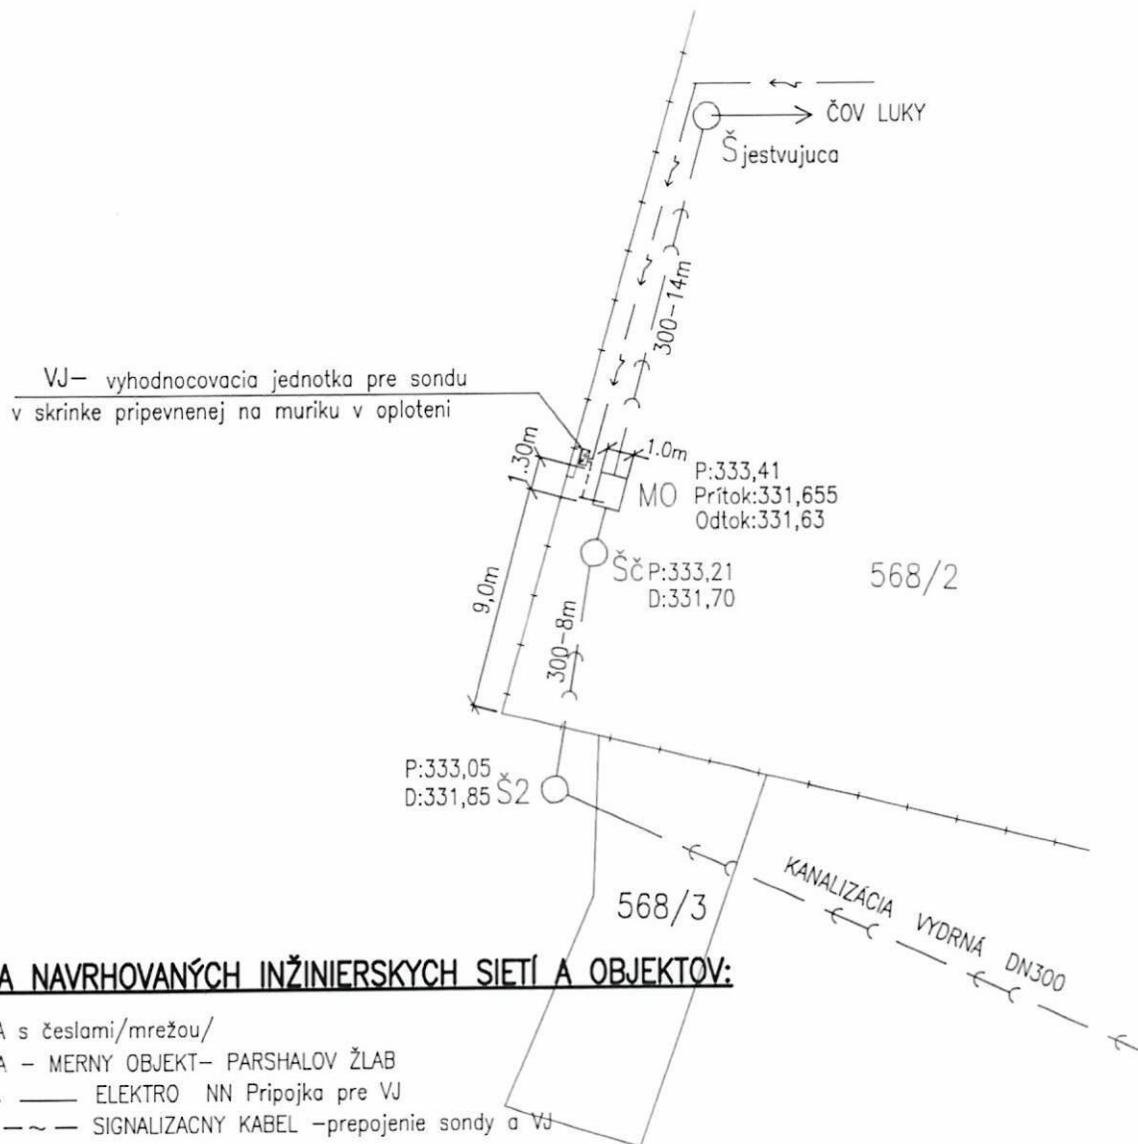


vypracoval:	kontroloval:	zodpovedný projektant dielu:	Anna Koreníková autorizovaný stavebný inžinier Tatranská 294/11-1, P. Bystrica 0904 637 052, annakorenikova@gmail.com	
Ing. Vladimír BELKO	Anna KORENÍKOVÁ <i>Kaučková</i>	Anna KORENÍKOVÁ <i>Kaučková</i>		
investor:	OBEC VYDRNÁ, 020 53 VYDRNÁ 51		stupeň PD:	DSP
názov:	VYDRNÁ – KANALIZÁCIA KANALIZAČNÉ ODBOČENIA		dátum:	09/2015
obsah:	SITUÁCIA OSADENIA MERNEHO OBJEKTU		počet A4:	18 A4
mierka:	1:250	diel:	KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	č.výkr.: 13
			č. kópie	

REZ A-A

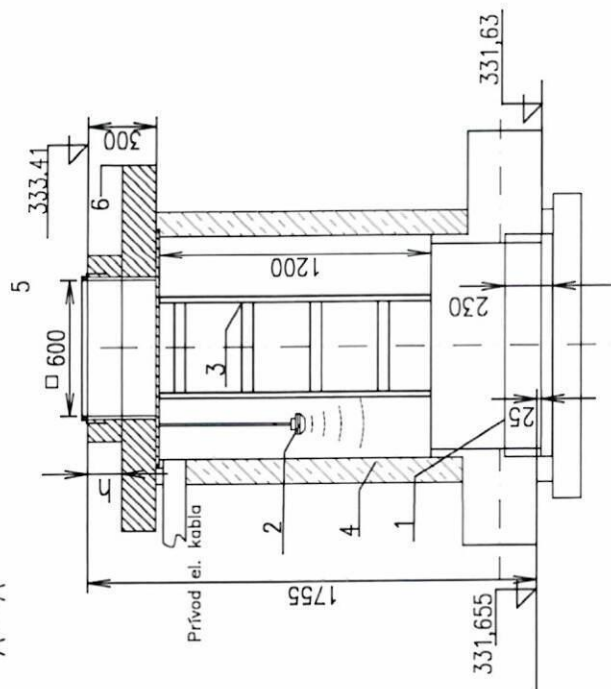

PODORYS

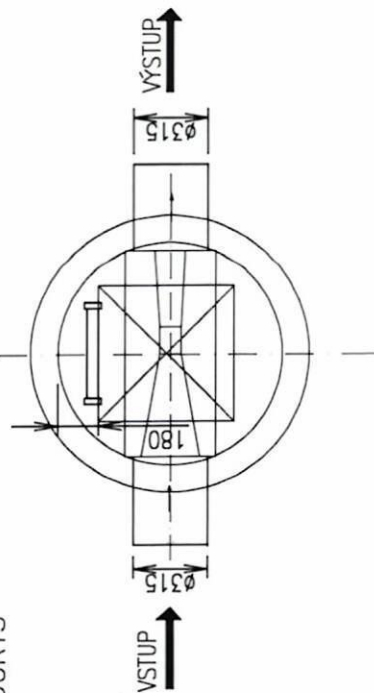

LEGENDA

1	PARSHALLOV ŽLAB (P1)
2	ULTRAZVUK.SONDA
3	VSTUPNÝ REBRIK
4	NÁDRŽ PRE PZ
5	POKLOP 600x600
6	ROZNAŠACIA DOSKA

POZNÁMKA

H=	CELKOVÁ HĺBK A OSADENIA
h=	PODLA HĺBK Y OSADENIA
	PRIETOK 0,26 l/s – 5,38 l/s

Suprava na meranie prietoku odpadovej vody v gravitačných kanáloch so skladá z Parshallovo žlabu a z ultrazvukového systému merania hladiny SenSonar-NIVOSONAR.

vypracoval:	Ing. Vladimír BELKO	kontroloval:	Anna KORENKOVÁ	zodpovedný projektant dielu:	Anna KORENKOVÁ
investor:	DBEC VYDRNÁ, 020 53 VYDRNÁ 51	kontroloval:	Kana, Bory	stupeň PD:	DSP
názov:	VYDRNÁ – KANALIZÁCIA			dátum:	09/2015
oblast:	MERNÝ OBJEKT-Parshallov žlab v šachte			počet A4:	2 A4
mierka:	1:30	diel:	KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	č. výkr.:	č. kópie
					14

E. TECHNICKÁ SPRÁVA

„VYDRNÁ - KANALIZÁCIA“

Investor: **OBEČNÝ ÚRAD**
Stupeň: **PROJEKT STAVBY**
Dátum: **05/2002**
Vypracoval: **Ing.Špiaková EKOPRO Pov.Bystrica**
Zákazka číslo : **E-27-2001**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE TOTOTÁ
S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU ULOŽENOU
V OBEČNOM ARCHÍVE, NA KTORÝ BOL
VYDANÝ STAVEBNÝ ROZKAZ Č. 27-
2001/06205/EO1 ZO DŇA 28.12.2001,
A KTORÁ JE TÁTO ULOŽENÁ
PŮDĚLNĚ.



Ekopro
Projektová činnosť
Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica



4

Objekt SO 01–Kanalizácia

Úvod:

Diel kanalizácia je vypracovaný na základe objednávky investora.

Predmetom projektu je odkalizovanie splaškových odpadových vôd z obce Vydrná.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

- Mapový podklad v mierke 1 : 500
- Štúdia Vydrná-kanalizácia 2001
- Urbanistická štúdia zóny Vydrná 1995

1. Splašková kanalizácia

Kanalizačné zberače v obci sú navrhnuté na základe potreby zástavby v obci. Napojenie kanalizácie navrhujeme na stávajúcu kanalizačnú šachtu Šo pred objektom ČOV Lúky, kanalizácia z obce Vydrná bude napojená na túto ČOV.

Základné údaje kanalizácie:

Dĺžka celkom: 5133 m

Materiál : PVC kanalizačné korugované

Dimenzia : DN 300 a DN 250 mm

Kapacita potrubia : pri spáde 5‰...DN 250 ...50,6 l/s

Rýchlosť..... : 1,03 m/s

Trasa kanalizácie je zvolená tak, aby bola prevažne vo verejných priestranstvách a v krajnici miestnych komunikácií, a tiež v krajnici štátnej cesty.

Materiál kanalizácie –bude z rúr PVC-U kanalizačných korugovaných DN 300 a 250 mm. Sklon kanalizácie je min.5 ‰ , a je daný min. hĺbkou uličnej siete v zmysle STN 736701 , priemerná hĺbka kanalizácie je - 1,80 m.

Napojenie jednotlivých prípojok navrhujeme tvarovkami odbočnými šikmé odbočky DN 300ú150, prípadne 250/150.

VÝKAZ MATERIÁLU :

ZBERAČ.....	MATERIÁL.....	PROFIL..... m m	DĹŽKA..... m	ŠACHTY ks
A	PVC	300	3832	110
A-1	PVC	250	65	2
A-2	PVC	250	22	1
A-3	PVC	250	163	7
A-4	PVC	250	73	5
A-5	PVC	250	519	15
A-6	PVC	250	316	11
A-7	PVC	250	143	8
SPOLU:			5 133	159

2. Šachty

Revízne a lomové šachty sú navrhnuté typové, typ VODEKO budované so šachtovým dnom a komínom z betónových skruží, tieto šachty sú vodotesné, spájané gumovými krúžkami. Priemer šachty je 1000 mm. Vstup do šachty bude cez liatinový poklop po vidlicových stúpadlách, ktoré sú zabudované v jednotlivých skružiach.

3. Výstavba kanalizácie

Kanalizácia bude kladená na pieskové lôžko hrúbky 150 mm, obsyp potrubia nad vrchol je 150 mm, ostatný zásyp triedenou zeminou. Kanalizačné šachty budú vybudované z betónových skruží s dnom z monolitického betónu. Všetky objekty na kanalizácii sú typové, v časti komunikácie osadené do úrovne cesty, respektíve spevnenej plochy.

4. Križovanie kanalizácie s inžinierskymi siet'ami

je riešené v zmysle STN 736005, prípadne podľa špeciálnych požiadaviek správcov inžinierskych sietí:
požadované vzdialenosti v zmysle STN:

	vodorovná m	zvislá m
Kanalizácia-vodovod:	0,6	0,10

Pozn.: Všetky inžinierske siete je potrebné pred zahájením výkopových prác dať vytýčiť!

Pri všetkých stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných STN a predpisov SÚBP !

ZEMNÉ PRÁCE

Kanakizačné potrubie bude uložené v ryhe šírky 1,25 a 1,15 m. Ryha bude chránená pažením príložným. Zemné práce budú vykonané v zmysle STN 733050. Uloženie potrubia sa vykoná podľa priloženého výkresu ,v zemine ťažiteľnosti 3 a 4. Pod spevnenou plochou a komunikáciou musí byť spätný zásyp zrealizovaný zhutneným štrkopieskom v stupni relatívnej uľahlosti $Id = 0,7$.

Pri práci v blízkosti podzemných vedení je treba dodržať zvýšenú bezpečnosť pri práci a zemné práce vykonávať ručne. Výška hladiny spodnej vody je 5,0 až 6,0 m od terénu.

TLAKOVÉ SKÚŠKY

Po ukončení montáže potrubia je potrebné previesť tlakové skúšky a skúšky tesnosti potrubia v zmysle STN 736716.

Montáž kanalizácie môže vykonávať iba organizácia k tomu oprávnená v zmysle STN 736701.

Križovanie kanalizácie s vodným tokom

Je riešené prekopáním vodného toku po častiach, ktoré sa navzájom oddelia ohrádzkou. Uloženie kanalizačného potrubia v časti pod tokom bude riešené obetónovaním do betón. bloku rozmeru 900 x 900 mm. Hĺbka pod dnom toku je 800 mm . Po ukončení prác na kanalizácii sa vybuduje úprava toku v dĺžke 5,0 m kameňom lomovým . Úprava sa buduje na dne a brehu, čo bude slúžiť na zabezpečenie kanalizácie proti vymieľaniu. Spád kanalizácie pod tokom je 5 – 10 ‰.



Ku križovaniu toku Vydrňanka s kanalizáciou dôjde na

vetve A v km 0,749-0,764

v km 2,618-2,636


vetve A-5 v km 0,005- 0,015

vetva A-1 v km 0,007-0,016..Uloženie na moste

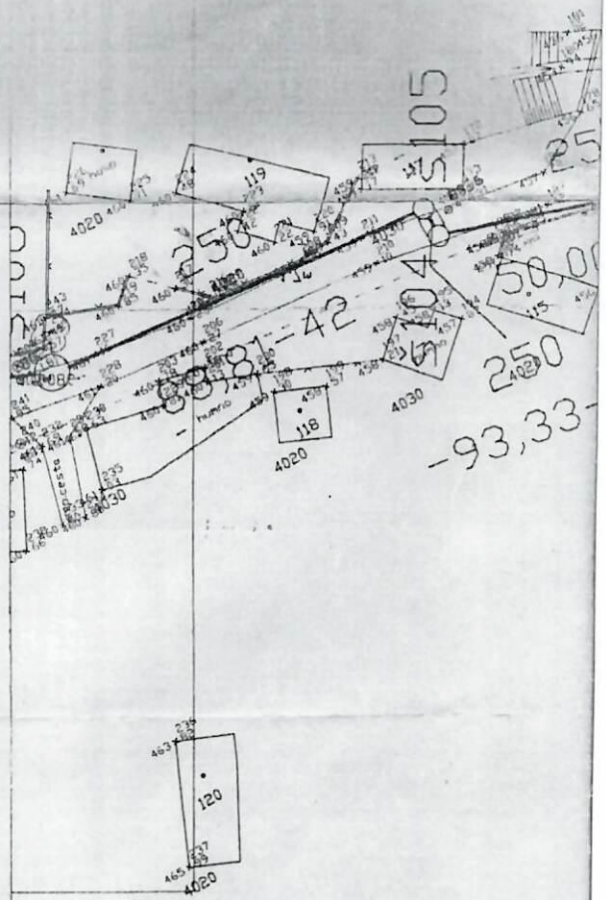


- 1- zvislá stena ryhy
- 2- rúra z PVC DN 300, DN400
- 3- obsyp potrubia –triedená zemina
- 4- zásyp netriedená zemina
- 5- ložko-piesok, štrkopiesok

POZN.: MIERA ZHUTNENIA ZEMINY OBSYPU
A LÔŽKA PODĽA ID-STN 721018 BY
MALA DOSIAHNUŤ HODNOTU 0,8

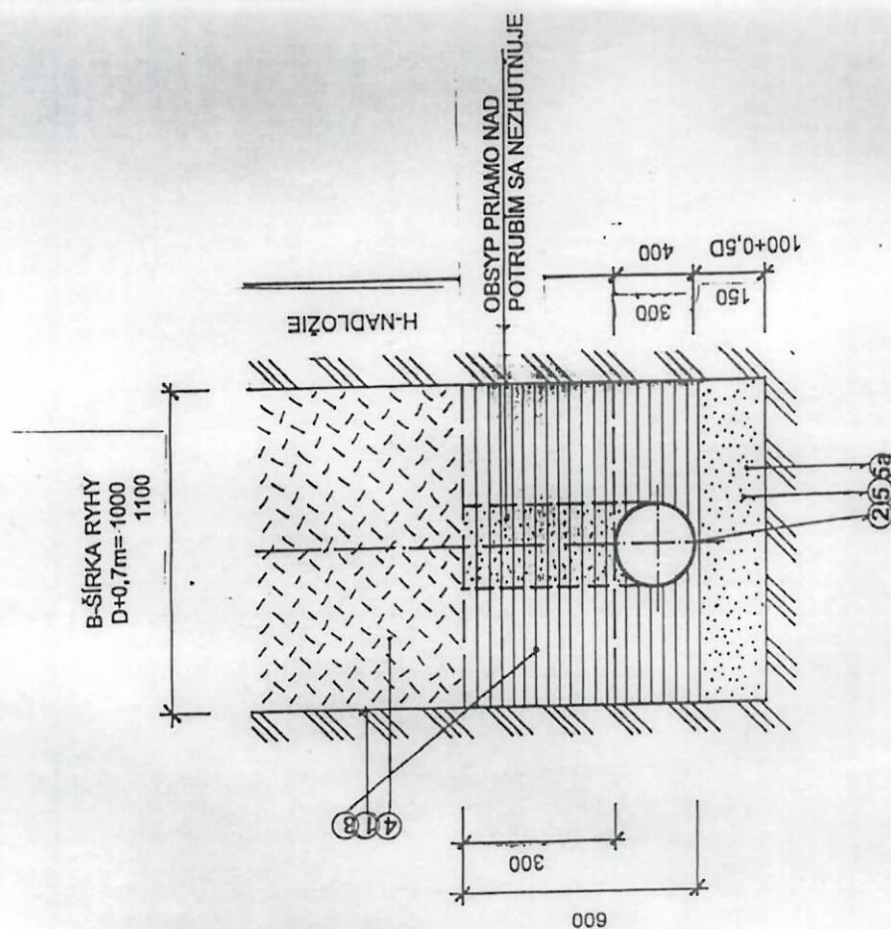

ARCHIV.Č.	ZODP. PROJEKT DIELU	ZODP. PROJEKT AKCIE	Projektová činnosť Nám. A Hlinku 25/30 017 01 Považská Bystrica
	Ing. Spiaková		
SCHVALIL			
INVESTOR: OBEC VYDRNA	Akcia: VYDRNA - KANALIZÁCIA		STUPEŇ: PS
			DATUM: 05/2002
			Mierka: 1:25
			Č. ZÁKAZKY: E-11-2002*
			Č. výk.: E. 1-22
Obsah: ULOŽENIE POTRUBIA PVC			

45.00	51.00	409.00	418.41	416.61	1.95
50.25					
40.00	91.00		420.42	418.62	-1.95
86.60	3.3				
50.00	41.00		424.75	422.95	1.95
40.67					
45.00	86.00	417.00	426.58	424.78	-1.95
65.60	3.4				
50.00	36.00		429.86	428.06	-1.95
3					
	66.00	425.00	434.50	432.70	-1.95
71.00	4		435.72	433.92	-1.95
25.00 - PVC - 676 mm					
5					
	1.00	431.00	441.12	439.32	1.95
3.5					
6	19.00		443.40	441.60	-1.95
7	41.00		445.69	443.89	1.95
	45.00		446.24	444.44	-1.95
8	61.00	439.00	448.42	446.62	-1.95
9	86.00		451.20	449.40	-1.95
10	88.00		451.46	449.66	1.95
11	90.00		451.46	449.66	-1.95
12	96.00		451.46	449.75	-1.86
3.6					
	7.00		452.85	451.05	1.95
13	19.00		453.17	451.37	-1.95

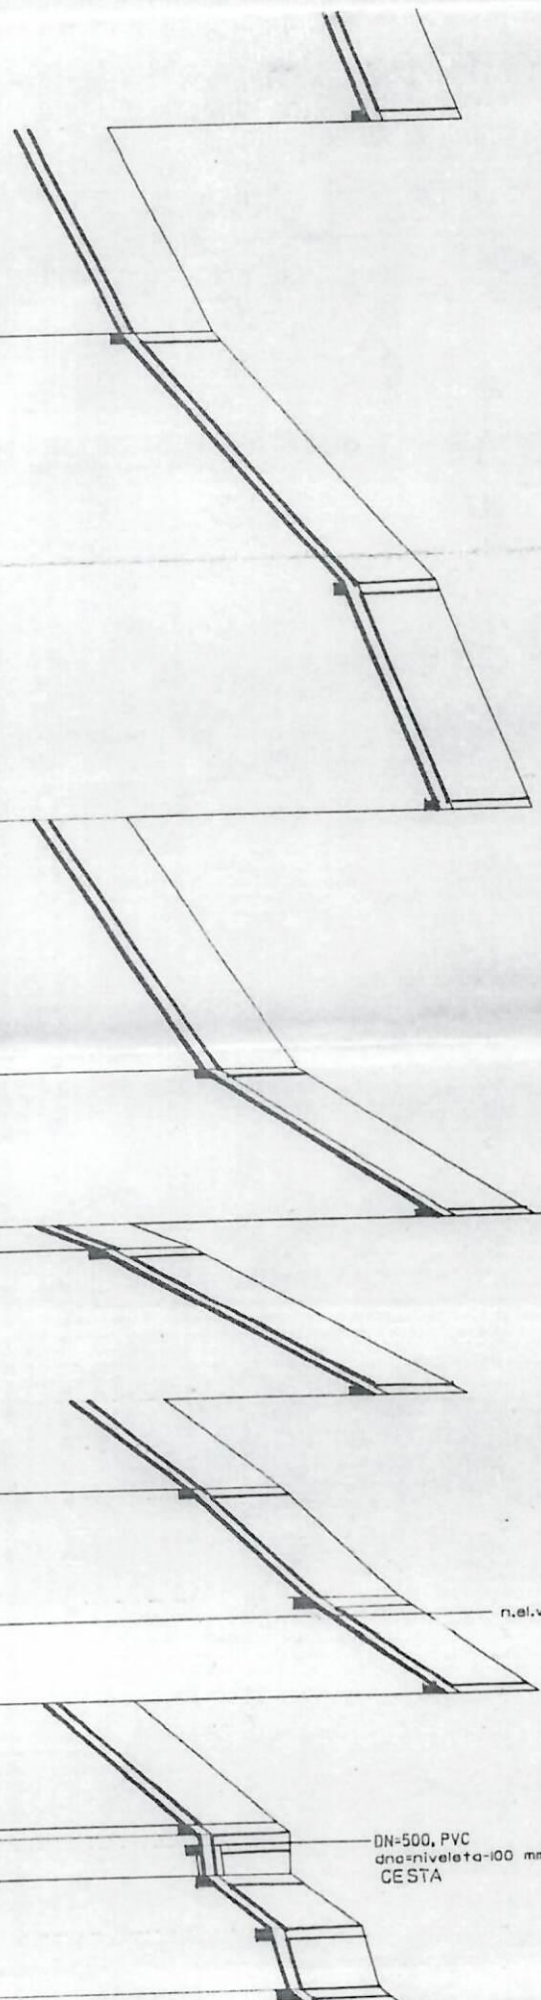

DN=500, PVC
dno=niveleta-100 mm

n.el.ved.do 300 V

DN=500, PVC
dno=niveleta-100 mm
CESTA


- S88
- S89
- S90
- S91
- S92
- S93
- S94
- S95
- S96
- S97
- S98
- S99
- S100
- S101
- S102

UZEMIE
POVRCH UZEMIA
PARCELE ČÍSLO
ROZSAH PLATNOSTI SOND

POZDĽŽNÝ PROFIL RADU vet. A

MIERKA:
1:1000/1:100

Hĺbka výkopu
Kóta dna potrubia
Kóta terénu
Zrovnávací rovina
Stančenie [km], [m]
Sklon [promile], dĺžka [m]
DN [mm], materiál, dĺžka [m]

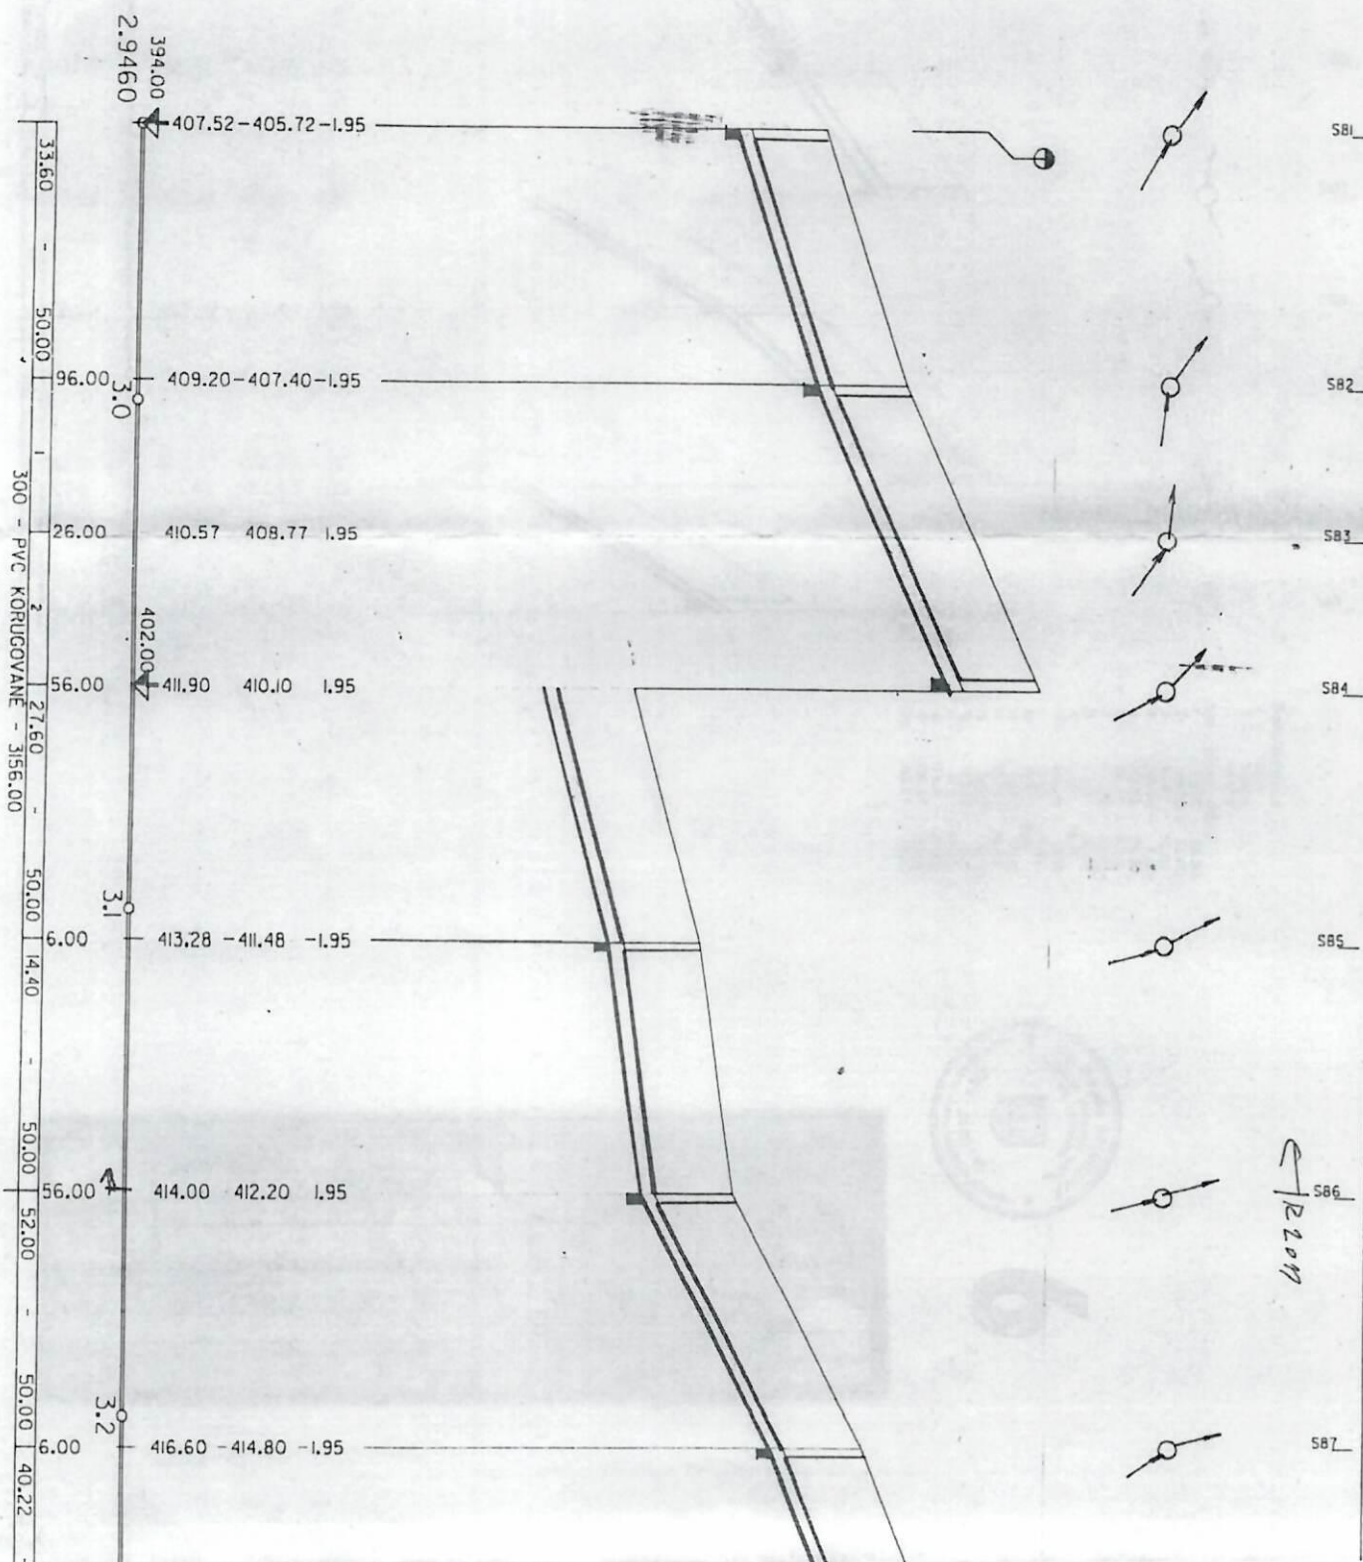

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

<i>Práca určená pre subdodávateľa</i>	<i>Objekty stavby (SO)</i>	<i>Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby</i>

Čestné vyhlásenie uchádzača

Ja, Ing. Marián Sahul, konateľ firmy Ing. Marián Sahul STAVEKO čestne vyhlasujem, že predmet zákazky máme v úmysle realizovať vlastnými kapacitami, a v prípade subdodávateľov (nie sú známy v tomto štádiu prípravy) každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

V Nitre dňa 20.12.2024

Ing.
BEN
IČO
Za

Ing. Marián Sahul – riaditeľ
