**ZMLUVA O DIELO č. .....**

*uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ") medzi zmluvnými stranami*

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Obec Bohúňovo** |
| Sídlo: | Bohúňovo 72, 049 12 Bohúňovo |
| IČO: | 00 328 111 |
| DIČ: | 2020961195 |
| Zastúpený: | Ing. Ágnes Takács, starostka obce |

(ďalej ako „objednávateľ")

a

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | **STAVAB s.r.o.** |
| Sídlo/ | |
| Miesto podnikania: | Magnezitárska 5, 040 13 Košice |
| IČO: | 36 193 976 |
| DIČ: | 2021500492 |
| IČ DPH: | SK2021500492 |
| Zápis: | OR MS Košice, oddiel: Sro, vl.č.:11194/V |
| Bankové spojenie: | VÚB banka a.s. |
| Číslo účtu: | SK80 0200 0000 0041 9350 7454 |
| Zastúpený: | Lydia Bordásová |
| Osoba oprávnená konať | |
| vo veciach obchodných: | Bc. Patrik Bordás |
| technických: | Bc. Patrik Bordás |

(ďalej ako „zhotoviteľ")

## Preambula

Táto Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zadávaného postupom podľa § 108 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: **„Dom ľudových tradícií"**.

## I.
## Úvodné ustanovenie

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: **„Dom ľudových tradícií"** s oceneným rozpočtom (Príloha č. 1), spracovaná na základe požadovaných špecifikácií určených objednávateľom ako verejného obstarávateľom v súťažných podkladoch.
2. Východiskové údaje:
   Názov diela: **Dom ľudových tradícií** (ďalej len „dielo")
   Miesto realizácie: ***intravilán obce Bohúňovo***

Ukončenie realizácie: *do 4 mesiacov od prevzatia staveniska*

## II.
## Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa dielo podľa čl. III. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy.

## III.
## Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pre objednávateľa v súlade s:
    a. Projektovou dokumentáciou stavby: „**Dom ľudových tradícií**“, vypracovanou D-ATELIER s.r.o., Šafrárikova 471/97, Rožňava, zodp. projektant: Ing. Darina Kohuláková, ktorá tvorí prílohu výzvy na predloženie ponuky.
    b. Oznámením vydaným príslušným stavebným úradom Obec Plešivec, sp. zn. D2023/2269-1 zo dňa 04.12.2023, ako aj ostatnými vyjadreniami orgánov verejnej moci a organizácií, ktoré tvoria prílohu výzvy na predkladanie ponúk;
    c. Ponukou zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predloženou v rámci verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva – časť ponuky – ocenený rozpočet;
    d. Touto zmluvou o dielo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas zhotovené dielo cenu spôsobom a za podmienok ustanovených v tejto zmluve.

## IV.
## Zhotovenie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotoviť dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohách.
2. Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, avšak v prípade potreby je viazaný pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutie podmieňujú prevzatie diela. Deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
4. Vlastnícke právo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanému dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním diela.

## V.
## Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie a stavebného povolenia v závislosti od poveternostných podmienok, najneskôr však do 45 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v písomnej podobe, ak nebola odovzdaná skôr.
2. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené dielo, ktoré je bez akýchkoľvek vád, prevziať.

## VI.
## Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia a povolenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

## VII.
## Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela zhotoviteľom je určená na základe záväzného, úplného a oceneného rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. Je to cena pevná, maximálna a nemenná.
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:
   Cena za predmet diela bez DPH: 80 328,21 EUR
   (slovom:osemdesiattisíctristodvadsaťosem,21)
   DPH 23 %: 18 475,49 EUR
   **Celková cena za predmet diela: 98 803,70 EUR**
   **(slovomdeväťdesiatosemtisícosemstotri,70)**
3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie, zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute, vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie

a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky a pod.

5. Objednávateľ neposkytuje preddavok na realizované práce.
6. Cena diela bude zaplatená na základe faktúry – daňového dokladu. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom odovzdaní zhotoveného diela.
7. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
8. Faktúra bude predložená v štyroch vyhotoveniach.
9. Súčasťou faktúry podľa ods. 6 tohto článku bude Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

## VIII.
## Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vrátane zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na predmetných poradách sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje, resp. je držiteľom všetkých povolení a oprávnení súvisiacich s realizáciou činností, potreba ktorých vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a to v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
4. Podstatným porušením zmluvy je:
   - prekročenie dohodnutých termínov o viac ako 30 dní,
   - prekročenie termínu riadneho dokončenia diela o viac ako 30 dní,
   - zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne a technické ukazovatele podľa príslušných STN,
   - vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
   - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
   a) zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu,
   b) nedôjde k schváleniu verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy bez výhrad.
6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu vôle zhotoviteľovi. Odstúpením od zmluvy sú zmluvné pokuty okamžite vymáhateľné.
7. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.

8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba pre neho nevykonáva nelegálnu prácu v zmysle ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní"). V prípade, že sa preukáže opak výlučne zhotoviteľ je zodpovedný za všetky následky a škody s tým súvisiace, ktoré by mohli vzniknúť objednávateľovi a zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje uhradiť sankcie mu uložené v zmysle ustanovení zákona o nelegálnom zamestnávaní.

## IX.
## Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe výzvy objednávateľa diela.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním diela alebo poškodením diela objednávateľom.
5. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezplatne a bezodkladne najneskôr v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

## X.
## Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zhotovenia a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV. ods. 1 zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku VII. za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa čl. VII. za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za zhotovenie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.

## XI.
## Osobitné podmienky plnenia zmluvy- sociálny aspekt

1. Objednávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO stanovil sociálne požiadavky na realizáciu diela ako osobitné podmienky plnenia zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa počas realizácie diela zaväzuje dodržiavať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní, a to nasledovným spôsobom:
    a. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre činnosti zhotovovania diela podľa tejto zmluvy zamestná aspoň 1 osobu, ktorá patrí medzi dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    b. Povinnosť podľa predchádzajúceho bodu sa vzťahuje na celé obdobie zhotovovania diela za predpokladu, že v rámci tohto obdobia sú realizované činnosti, ktorých vykonaním možno poveriť osoby uvedené v predchádzajúcom bode a to s prihliadnutím na ich kvalifikáciu.

3. Zhotoviteľ za účelom preukázania tejto podmienky predloží objednávateľovi v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných a vyhlásenia a čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite spolu s dokladom preukazujúcim vznik pracovnoprávneho vzťahu.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie požadovaného sociálneho aspektu a je povinný objednávateľovi na jeho žiadosť podať písomnú správu o zamestnávaní osoby dlhodobo nezamestnanej.
5. Objednávateľ priebežne kontroluje a monitoruje plnenie tejto osobitnej podmienky zmluvy zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosti pri realizácii kontroly alebo monitorovania plnenia tejto osobitnej podmienky zmluvy.
6. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu v sume vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny diela v EUR bez DPH a to až do súhrnnej výšky 10 000 EUR.

## XII.
## Záverečné ustanovenia

1. Vzhľadom na to, že predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z rozpočtu EÚ, zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky zo strany akýchkoľvek oprávnených osôb a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť; oprávnenými osobami sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
    c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a
    h. Akékoľvek osoby, ktoré sú na to oprávnené/poverené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí/poverení poskytovateľa a/alebo iných oprávnených orgánov/osôb.

2. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú vec.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, právny úkon bol urobený určite a vážne.
5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, 4 rovnopisy pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu týkajúcu sa údajov o subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na činnostiach súvisiacich so zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy a to najneskôr do 3 pracovných dní po tejto zmene; rovnako je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa o nastúpení alebo odstúpení akéhokoľvek subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov a to najneskôr 2 pracovné dni pred nastúpením nového subdodávateľa; v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní po inej zmene.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8. Prílohami tejto zmluvy sú:
   **Príloha č. 1** – Rozpočet diela
   **Príloha č. 2** – Zoznam subdodávateľov

Objednávateľ:

V Bohúňove, dňa 25.03.2025

Zhotoviteľ:

V Košiciach,dňa 17.3.2025

**Obec Bohúňovo**

.....

**In**

**STAVAB s.r.o.**

# Zoznam subdodávateľov

NÁZOV ZÁKAZKY:

**Dom ľudových tradícií**

ZHOTOVITEĽ:

**STAVAB s.r.o.**

Magnezitárska 5, 040 13 Košice

vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s vyššie uvedeným názvom sa v súlade so zmluvou o dielo budú podieľať nasledovní subdodávatelia

| Obchodné meno a sídlo subdodávateľa | IČO subdodávateľa | osoby oprávnené konať za subdodávateľa | Predmet subdodávok | Podiel subdodávok |
|---|---|---|---|---|
| [●]<br>[●] | [●] | meno:[●]<br>nar. [●]<br>adr. [●] | [●] | |
| [●]<br>[●] | [●] | meno: [●]<br>nar. [●]<br>adr. [●] | [●] | |

V Košiciach, dňa 17.03.2025



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO
**Stavba:** **Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO**

JKSO:
Miesto: Bohúňovo

KS:
Dátum: 17.3.2025

Objednávateľ:
Obec Bohúňovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

IČO: 36193976
IČ DPH: SK2021500492

Projektant:
Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **80 328,21** |

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH | 23,00% | 80 328,21 | 18 475,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **98 803,70** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátu

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO

**Stavba:** **Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO**

Miesto: **Bohúňovo**

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo

Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **80 328,21** | **98 803,70** |
| **01** | **Exteriérové úpravy** | 6 239,73 | 7 674,87 |
| **02** | **Fotovoltické zariadenie** | 6 758,73 | 8 313,24 |
| **03** | **Hlavný objekt** | 48 061,10 | 59 115,15 |
| **04** | **Odberné elektrické zariadenie** | 1 679,41 | 2 065,67 |
| **05** | **Sklad rekvizít** | 17 589,24 | 21 634,77 |

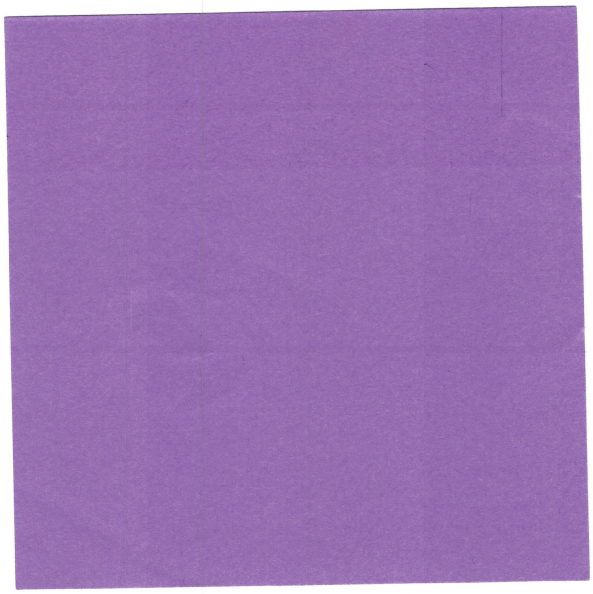

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**01 - Exteriérové úpravy**

JKSO:
Miesto: Bohúňovo

KS:
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:
Obec Bohúňovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

IČO: 36193976
IČ DPH: SK2021500492

Projektant:
Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **6 239,73** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 6 239,73 | 23,00% | 1 435,14 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **7 674,87** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátu

**Objednávateľ** **Zhoto**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**01 - Exteriérové úpravy**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025
Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **6 239,73** |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 2 070,91 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | 1 408,63 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 2 760,19 |



# ROZPOČET

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**01 - Exteriérové úpravy**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady z rozpočtu

**6 239,73**

D 1 ZEMNE PRÁCE — 2 070,91

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 122301101 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 | m3 | 6,920 | 14,24 | 98,54 |
| 2 | K | 122301109 | Príplatok za lepivosť horn. 4 | m3 | 6,920 | 1,56 | 10,80 |
| 3 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 | m3 | 6,920 | 1,67 | 11,56 |
| 4 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 6,920 | 5,94 | 41,10 |
| 5 | K | 167101101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 6,920 | 9,50 | 65,74 |
| 6 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 6,920 | 0,80 | 5,54 |
| 7 | K | 183101314 | Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine | kus | 43,000 | 9,41 | 404,63 |
| 8 | K | 183101315 | Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine | kus | 20,000 | 34,08 | 681,60 |
| 9 | K | 183204112 | Vysadenie trvaliek a všetky práce s tým súvisiace | kus | 43,000 | 1,18 | 50,74 |
| *10* | *M* | *026512099* | *Trvalky podľa PD - kosatec, ľaliovka, cesnak, echinacea....* | *kus* | *43,000* | *5,82* | *250,26* |
| 11 | K | 183207105 | Vysadenie kríkov a všetky práce s tým súvisiace | kus | 20,000 | 9,68 | 193,60 |
| *12* | *M* | *026527130* | *Rohovník - podľa PD* | *kus* | *20,000* | *12,84* | *256,80* |

D 5 KOMUNIKÁCIE — 1 408,63

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 564201100 | Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm hr. 30 mm | m2 | 24,700 | 2,02 | 49,89 |
| 14 | K | 564851111 | Podklad z vibrovaného štrku hr. 150 mm | m2 | 24,700 | 8,50 | 209,95 |
| 15 | K | 564941155 | Podklad z geotextílie | m2 | 24,700 | 4,97 | 122,76 |
| 16 | K | 596211130 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2, vrátane vyškárovania | m2 | 24,700 | 19,89 | 491,28 |
| *17* | *M* | *592450120* | *Dlažba zámková hr. 60 mm, vrátane vyškárovania* | *m2* | *27,200* | *19,66* | *534,75* |

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE — 2 760,19

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 917862111 | Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 | m | 93,900 | 11,67 | 1 095,81 |
| *19* | *M* | *592172100* | *Obrubník záhradný 100x5x20* | *kus* | | | |
| 20 | K | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 | m3 | | | |
| 21 | K | 979131415 | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy | m3 | | | |
| 22 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | t | | | |
| 23 | K | 998223091 | Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený | t | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**02 - Fotovoltické zariadenie**

JKSO:
Miesto: Bohúňovo

KS:
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:
Obec Bohúňovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

IČO: 36193976
IČ DPH: SK2021500492

Projektant:
Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **6 758,73** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 6 758,73 | 23,00% | 1 554,51 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **8 313,24** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

**Objednávateľ** **Zhoto**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátu

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**02 - Fotovoltické zariadenie**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **6 758,73** |
| 91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení | 3 500,22 |
| 9101 - Úložný materiál | 111,60 |
| 9108 - Káble Cu | 179,60 |
| 9110 - Káblové súbory, ukončenie vodičov | 111,84 |
| 9129 - Fotovoltaické zariadenia | 3 097,18 |
| HS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 911,76 |
| HS00 - Stavebno montážne práce | 911,76 |
| M - Práce a dodávky M | 2 346,75 |
| 21-M - Elektromontáže | 2 346,75 |

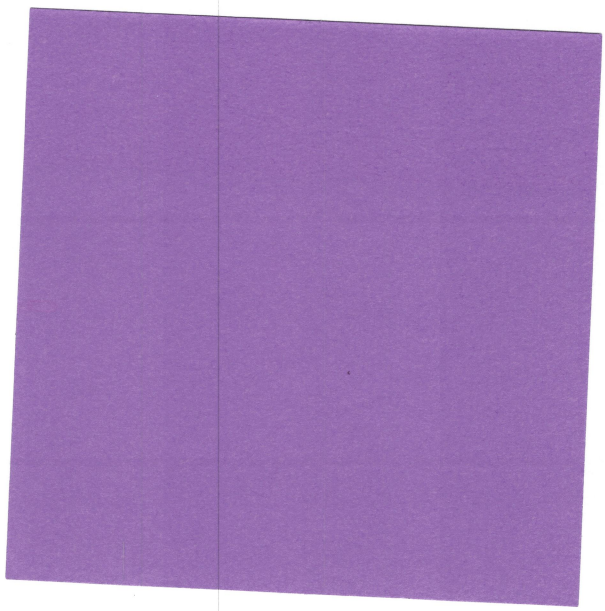

# ROZPOČET

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**02 - Fotovoltické zariadenie**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **6 758,73** |
| | D | 91 | Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení | | | | 3 500,22 |
| | D | 9101 | Úložný materiál | | | | 111,60 |
| 1 | K | 91010101010712.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 20 uložená pevne | m | 20,000 | 1,69 | 33,80 |
| 2 | M | 345710011425.S | *Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 21,2 mm* | m | 20,000 | 3,89 | 77,80 |
| | D | 9108 | Káble Cu | | | | 179,60 |
| 3 | K | 91080101080073.S | Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 40,000 | 0,54 | 21,60 |
| 4 | M | 341310009100.SE | *Solar kábel 6mm* | m | 40,000 | 1,49 | 59,60 |
| 5 | K | 91080101080075.S | Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 30,000 | 0,95 | 28,50 |
| 6 | M | 341310009300.S | *Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2* | m | 30,000 | 2,33 | 69,90 |
| | D | 9110 | Káblové súbory, ukončenie vodičov | | | | 111,84 |
| 7 | K | 91100107030030.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 20,000 | 2,56 | 51,20 |
| 8 | M | 354310019400.S | *Káblové oko lisovacie 16x6* | ks | 20,000 | 0,60 | 12,00 |
| 9 | K | 91100107030030.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 19,000 | 2,56 | 48,64 |
| | D | 9129 | Fotovoltaické zariadenia | | | | 3 097,18 |
| 10 | K | 91290102011050.SE | Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu | kpl | 10,000 | 30,70 | 307,00 |
| 11 | M | 346510004120.SE | *Fotovoltická konštrukcia pre šikmé strechy* | kpl | 10,000 | 33,53 | 335,30 |
| 12 | K | 91290301021103.S | Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového | ks | 10,000 | 14,50 | 145,00 |
| 13 | M | 346510000120.S | *Fotovoltický modul pre pozemné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp* | ks | 10,000 | 212,75 | 2 127,50 |
| 14 | K | 91290401011233.S | Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A | súb. | 1,000 | 182,38 | 182,38 |
| | D | HS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | 911,76 |
| | D | HS00 | Stavebno montážne práce | | | | 911,76 |
| 15 | K | HS000000001110.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 16,000 | 17,53 | 280,48 |
| 16 | K | HS000000001130.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 24,11 | 192,88 |
| 17 | K | HS000000001140.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 16,000 | 27,40 | 438,40 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 2 346,75 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 2 346,75 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *18* | *M* | *999000000100* | *Ostatný materiál* | *eur* | *62,000* | *1,00* | *62,00* |
| 19 | K | 210501211.S | Montáž rozvádzača pre malý fotovoltický zdroj | ks | 1,000 | 36,32 | 36,32 |
| *20* | *M* | *346510002110.S* | *Fotovoltický rozvádzač pre On-Grid malý fotovoltický zdroj do výkonu 16A/3F, sieťová ochrana (U,F,T)* | *ks* | *1,000* | *797,51* | *797,51* |
| 21 | K | 210501263.S | Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie | ks | 1,000 | 60,72 | 60,72 |
| *22* | *M* | *346510000720.S* | *Fotovoltický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F* | *ks* | *1,000* | *1 343,80* | *1 343,80* |
| 23 | K | 210800160.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 10,000 | 1,55 | 15,50 |
| *24* | *M* | *341110002100.S* | *Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2* | *m* | *10,000* | *3,09* | *30,90* |

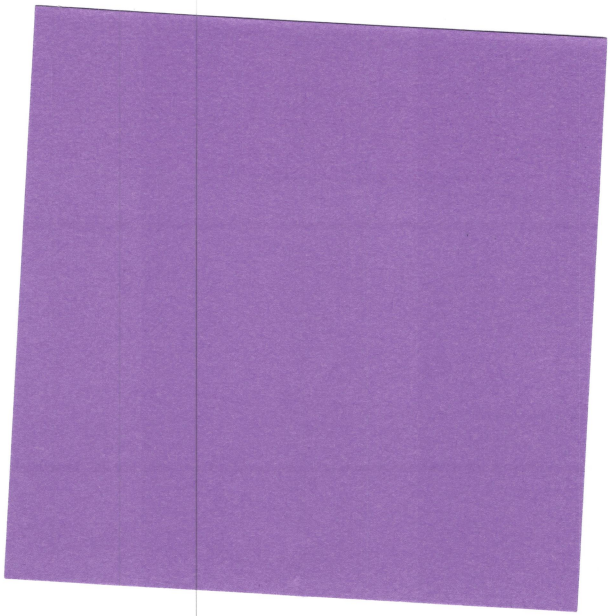

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**03 - Hlavný objekt**

JKSO:
Miesto: Bohúňovo

KS:
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:
Obec Bohúňovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

IČO: 36193976
IČ DPH: SK2021500492

Projektant:
Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **48 061,10** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 48 061,10 | 23,00% | 11 054,05 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **59 115,15** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**03 - Hlavný objekt**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025
Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **48 061,10** |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV | 28 428,70 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 423,67 |
| 2 - ZÁKLADY | 1 076,04 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 1 969,91 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 14 871,19 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 10 087,89 |
| D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV | 19 632,40 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 156,40 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 3 882,23 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 1 521,86 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 1 679,58 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 142,77 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 1 155,80 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 7 176,43 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 755,81 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 1 203,25 |
| 783 - Nátery | 681,82 |
| 784 - Maľby | 1 276,45 |



# ROZPOČET

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**03 - Hlavný objekt**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **48 061,10** |
| | D | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | 28 428,70 |
| | D | 1 | ZEMNE PRÁCE | | | | 423,67 |
| 1 | K | 131301201 | Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 | m3 | 0,960 | 66,55 | 63,89 |
| 2 | K | 131301209 | Príplatok za lepivosť horn. tr. 4 | m3 | 0,960 | 3,03 | 2,91 |
| 3 | K | 132301101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 | m3 | 4,180 | 57,58 | 240,68 |
| 4 | K | 132301109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm | m3 | 4,180 | 8,65 | 36,16 |
| 5 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 | m3 | 5,140 | 1,67 | 8,58 |
| 6 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 1,220 | 5,37 | 6,55 |
| 7 | K | 167101101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 5,140 | 9,50 | 48,83 |
| 8 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 1,220 | 0,80 | 0,98 |
| 9 | K | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 3,920 | 3,85 | 15,09 |
| | D | 2 | ZÁKLADY | | | | 1 076,04 |
| 10 | K | 271571111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 0,800 | 48,07 | 38,46 |
| 11 | K | 274313611 | Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25 | m3 | 3,100 | 113,37 | 351,45 |
| 12 | K | 274351215 | Debnenie základových pásov zhotovenie | m2 | 20,670 | 18,98 | 392,32 |
| 13 | K | 274351216 | Debnenie základových pásov odstránenie | m2 | 20,670 | 3,76 | 77,72 |
| 14 | K | 275313612 | Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25 | m3 | 0,710 | 121,79 | 86,47 |
| 15 | K | 275351215 | Debnenie základových pätiek zhotovenie | m2 | 5,700 | 18,98 | 108,19 |
| 16 | K | 275351216 | Debnenie základových pätiek odstránenie | m2 | 5,700 | 3,76 | 21,43 |
| | D | 3 | ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | 1 969,91 |
| 17 | K | 317143420 | Preklady nosné dĺ. do 1,5 m | kus | 1,000 | 75,68 | 75,68 |
| 18 | K | 349234831 | Vyspravenie okolo otvorov | m | 90,720 | 20,88 | 1 894,23 |
| | D | 6 | ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | 14 871,19 |
| 19 | K | 611421133 | Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková, vrátane všetkých podkladov | m2 | 30,000 | 17,45 | 523,50 |
| 20 | K | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, stropov štukových 10-30%, vrátane všetkých podkladov | m2 | 225,400 | 6,11 | 1 377,19 |
| 21 | K | 622401204 | Príprava podkladu pre vonkajšie nátery - penetrácia | m2 | 247,930 | 2,59 | 642,14 |
| 22 | K | 622410155 | Náter fasádny akrylátový dvojnásobný, vrátane penetrácie | m2 | 247,930 | 10,64 | 2 637,98 |
| 23 | K | 622421143 | Omietka vonk. stien bezcementová jadrová vápenná, vrátane všetkých podkladov | m2 | 247,930 | 22,39 | 5 551,15 |
| 24 | K | 622422621 | Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 50-65%, vrátane všetkých podkladov | m2 | 247,930 | 7,46 | 1 849,56 |
| 25 | K | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm | m3 | 1,850 | 144,07 | 266,53 |
| 26 | K | 631319761 | Príplatok prehladenie povrchu oceľou | m3 | 1,850 | 21,60 | 39,96 |
| 27 | K | 631319771 | Príplatok strhnutie povrchu | m3 | 1,850 | 6,62 | 12,25 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 4,100 | 10,35 | 42,44 |
| 29 | K | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 4,100 | 5,21 | 21,36 |
| 30 | K | 631362161 | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | m2 | 13,100 | 7,48 | 97,99 |
| 31 | K | 631571001 | Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho | m3 | 1,970 | 73,32 | 144,44 |
| 32 | K | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 8-16 spevňujúceho | m3 | 3,480 | 65,68 | 228,57 |
| 33 | K | 642952110 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených | kus | 2,000 | 47,31 | 94,62 |
| *34* | *M* | *611810520* | *Zárubne drevené obložkové skl. 80x197* | *kus* | *1,000* | *80,23* | *80,23* |
| *35* | *M* | *611810534* | *Zárubne drevené ( replika pôvodnej ) 940/2175* | *kus* | *1,000* | *222,93* | *222,93* |
| 36 | K | 648991111 | Osadenie parapetných dosák | m | 31,000 | 7,04 | 218,24 |
| *37* | *M* | *6119A0104* | *Parapet vnútorný* | *m* | *15,500* | *23,96* | *371,38* |
| *38* | *M* | *6119A0105* | *Parapet vonkajší* | *m* | *15,500* | *28,95* | *448,73* |
| | D | 9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | 10 087,89 |
| 39 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 368,020 | 3,37 | 1 240,23 |
| 40 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | m2 | 1 474,480 | 1,73 | 2 550,85 |
| 41 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 368,020 | 2,27 | 835,41 |
| 42 | K | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | m2 | 58,740 | 5,36 | 314,85 |
| 43 | K | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | m2 | 78,000 | 5,55 | 432,90 |
| 44 | K | 962032241 | Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov | m3 | 0,150 | 34,16 | 5,12 |
| 45 | K | 963053937-R | Búranie schodisk. ramien železbet. monolit. na schodniciach | m | 0,500 | 286,75 | 143,38 |
| 46 | K | 964011198 | Demontáž prekladu | kus | 1,000 | 13,41 | 13,41 |
| 47 | K | 965082923 | Odstránenie násypov, betónov pod podlahy - komplet | m3 | 4,350 | 51,38 | 223,50 |
| 48 | K | 968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien | kus | 13,000 | 1,08 | 14,04 |
| 49 | K | 968061126 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier | kus | 4,000 | 1,57 | 6,28 |
| 50 | K | 968062355 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. , vrátane parapetov vnútorných, vonkajších | m2 | 26,430 | 9,92 | 262,19 |
| 51 | K | 968062455 | Vybúranie dverových zárubní | m2 | 7,680 | 21,24 | 163,12 |
| 52 | K | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | t | 8,889 | 13,14 | 116,80 |
| 53 | K | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 12,465 | 15,51 | 193,33 |
| 54 | K | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | t | 124,650 | 0,46 | 57,34 |
| 55 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | t | 12,465 | 13,26 | 165,29 |
| 56 | K | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | t | 124,650 | 1,49 | 185,73 |
| 57 | K | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 12,465 | 95,00 | 1 184,18 |
| 58 | K | 979131415 | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy | m3 | 1,220 | 13,60 | 16,59 |
| 59 | K | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | t | 67,224 | 18,59 | 1 249,69 |
| 60 | K | 998991193 | Príplatok za zväčšený presun do 1000 m | t | 67,224 | 2,03 | 136,46 |
| 61 | K | 999990006 | Renovácia fasádnych dekoračných prvkov | hod | 24,000 | 24,05 | 577,20 |
| | D | D2 | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | 19 632,40 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 156,40 |
| 62 | K | 711107320 | Stierková pružná hydroizolácia | m2 | 14,000 | 10,45 | 146,30 |
| 63 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. | m2 | 0,820 | 4,63 | 3,80 |
| *64* | *M* | *628111500* | *Pás asfaltovaný* | *m2* | *0,943* | *1,84* | *1,74* |
| 65 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 1,565 | 2,41 | 3,76 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 998711292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m | % | 1,565 | 0,51 | 0,80 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 3 882,23 |
| 67 | K | 762341210 | Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz | m2 | 30,000 | 6,09 | 182,70 |
| 68 | K | 762342204 | Montáž kontralatí | m2 | 20,000 | 1,49 | 29,80 |
| 69 | K | 762342213 | Montáž latovania do 60° | m2 | 30,000 | 2,71 | 81,30 |
| 70 | K | 762521811 | Demontáž podláh drevených hrúbky do 32 mm | m2 | 17,410 | 2,58 | 44,92 |
| 71 | K | 762526110 | Položenie vankúšov pod podlahy, impregnované vankúše, vrátane dodávky, povrch. úpravy | m2 | 17,140 | 6,19 | 106,10 |
| 72 | K | 762712120 | Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2 | m | 109,200 | 13,70 | 1 496,04 |
| 73 | K | 762795000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | m3 | 2,325 | 24,11 | 56,06 |
| *74* | *M* | *605120280* | *Rezivo* | *m3* | *2,600* | *296,00* | *769,60* |
| 75 | K | 762795048 | Príplatok za hobľovanie | m3 | 2,325 | 9,53 | 22,16 |
| 76 | K | 762812240 | Montáž + dodávka záklopu z dosiek jednostranne hobľovaných, vrchný na zraz, spoj. prostriedky, náter | m2 | 17,140 | 51,65 | 885,28 |
| 77 | K | 998762202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | % | 38,821 | 4,16 | 161,59 |
| 78 | K | 998762294 | Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr. | % | 38,821 | 1,20 | 46,68 |
| | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 1 521,86 |
| 79 | K | 763132260 | Podhľady sadr. zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. | m2 | 30,000 | 47,54 | 1 426,20 |
| 80 | K | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 14,881 | 4,16 | 61,94 |
| 81 | K | 998763294 | Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby | % | 14,881 | 2,27 | 33,72 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 1 679,58 |
| 82 | K | 764.110 | Krytina z pozinkovaného plechu z tabúľ v tvare škridle, vrátane všetkých doplnkov | m2 | 30,000 | 37,46 | 1 123,80 |
| 83 | K | 764311821 | Demont. zastrešenia, vrátane klampiarskych konštrukcií | m2 | 30,000 | 2,34 | 70,20 |
| 84 | K | 764331260 | Klamp. pl. lem. striech tvr. kryt. rš 660 | m | 10,000 | 13,88 | 138,80 |
| 85 | K | 764352203 | Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh. | m | 10,000 | 12,44 | 124,40 |
| 86 | K | 764359212 | Klamp. pl. žľaby kotlík konický | kus | 2,000 | 31,26 | 62,52 |
| 87 | K | 764454204 | Klamp. pl. rúry odpadové kruhové | m | 6,200 | 17,76 | 110,11 |
| 88 | K | 998764201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | % | 16,809 | 1,71 | 28,76 |
| 89 | K | 998764292 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr. | % | 16,809 | 1,25 | 20,99 |
| | D | 765 | Krytiny tvrdé | | | | 142,77 |
| 90 | K | 765901250 | Pokrytie striech fóliou paropriepustnou | m2 | 30,000 | 4,35 | 130,50 |
| 91 | K | 998765201 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | % | 1,426 | 5,18 | 7,39 |
| 92 | K | 998765292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m | % | 1,426 | 3,42 | 4,88 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 1 155,80 |
| 93 | K | 766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m | kus | 1,000 | 16,06 | 16,06 |
| *94* | *M* | *611601880* | *Dvere 80x197, vrátane kovania* | *kus* | *1,000* | *175,75* | *175,75* |
| 95 | K | 766666910 | Montáž + dodávka dverí s povrch. úpravou, kovaním 940/2175 ( replika ) | kus | 1,000 | 448,63 | 448,63 |
| 96 | K | 766666911-R | Montáž + dodávka dverí s povrch. úpravou 1025/1955 ( replika ) | kus | 1,000 | 504,13 | 504,13 |
| 97 | K | 998766201 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 11,565 | 0,51 | 5,88 |
| 98 | K | 998766292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske | % | 11,565 | 0,46 | 5,35 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | 7 176,43 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | K | 767631126 | Montáž + dodávka okien plastových 580/870 | kus | 3,000 | 116,55 | 349,65 |
| 100 | K | 767631127 | Montáž + dodávka okien plastových 1925/1645 | kus | 1,000 | 667,85 | 667,85 |
| 101 | K | 767631128 | Montáž + dodávka okien plastových 1470/2240 | kus | 2,000 | 726,13 | 1 452,26 |
| 102 | K | 767631129 | Montáž + dodávka okien plastových 1450/2240 | kus | 1,000 | 703,00 | 703,00 |
| 103 | K | 767631130 | Montáž + dodávka okien plastových 1460/2240 | kus | 1,000 | 707,63 | 707,63 |
| 104 | K | 767631136 | Montáž + dodávka okien plastových 1930/1635 | kus | 1,000 | 605,88 | 605,88 |
| 105 | K | 767631137 | Montáž + dodávka okien plastových 1050/2320 | kus | 1,000 | 541,13 | 541,13 |
| 106 | K | 767631138 | Montáž + dodávka okien plastových 1265/1200 | kus | 1,000 | 286,75 | 286,75 |
| 107 | K | 767631139 | Montáž + dodávka okien plastových 870/870 | kus | 1,000 | 174,83 | 174,83 |
| 108 | K | 767631140 | Montáž + dodávka okien plastových 865/870 | kus | 1,000 | 173,90 | 173,90 |
| 109 | K | 767641205 | Montáž + dodávka dverí plastových jednokrídlových 900/1970, vrátane kovania | kus | 1,000 | 786,25 | 786,25 |
| 110 | K | 767991915 | Montáž + dodávka zábradlia ( v. 0,9-0,75-0,3 m), vrátane spoj. materiálu, povrch. úpravou | m | 5,625 | 79,13 | 445,11 |
| 111 | K | 767996801 | Demontáž oceľ. konštrukcie | kg | 88,500 | 2,10 | 185,85 |
| 112 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | % | 71,832 | 0,83 | 59,80 |
| 113 | K | 998767292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr. | % | 71,832 | 0,51 | 36,54 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždíc keramických | | | | 755,81 |
| 114 | K | 771471011 | Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. | m | 7,050 | 6,46 | 45,54 |
| 115 | K | 771569795 | Prípl. za škárovanie | m2 | 14,160 | 1,13 | 16,00 |
| 116 | K | 771571101 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu | m2 | 13,100 | 30,48 | 399,29 |
| *117* | *M* | *597640000* | *Dlaž. keramická protišmyková* | *m2* | *14,900* | *15,83* | *235,87* |
| *118* | *M* | *597640878* | *Lepidlo* | *m2* | *14,160* | *1,95* | *27,61* |
| 119 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | % | 7,569 | 3,28 | 24,85 |
| 120 | K | 998771292 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc | % | 7,569 | 0,88 | 6,65 |
| | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 1 203,25 |
| 121 | K | 775413132 | Podlahové soklíky alebo lišty bukové 80/15mm prip. skrutkami | m | 23,860 | 6,39 | 152,47 |
| 122 | K | 775591311 | Príplatok k podlahám dreveným, základný lak | m2 | 41,330 | 3,97 | 164,08 |
| 123 | K | 775591319 | Príplatok k podlahám dreveným, celkové lakovanie | m2 | 41,330 | 15,62 | 645,57 |
| 124 | K | 775591900 | Opravy vlysových podláh, brúsenie základné | m | 41,330 | 1,91 | 78,94 |
| 125 | K | 775591905 | Oprava podlah drevených - tmelenie celoplošné vlysové, parketové podlahy | m2 | 41,330 | 3,52 | 145,48 |
| 126 | K | 998775201 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m | % | 12,045 | 0,97 | 11,70 |
| 127 | K | 998775293 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové | % | 12,045 | 0,42 | 5,01 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 681,82 |
| 128 | K | 783726300 | Nátery tesárskych konštr. syntetické - matný, dvojnásobný | | | | 33 |
| 129 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštr. proti škodcom | | | | 49 |
| | D | 784 | Maľby | | | | 45 |
| 130 | K | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | | | | 73 |
| 131 | K | 784452571 | Maľba akrylátová 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | | | | 72 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**04 - Odberné elektrické zariadenie**

JKSO:
Miesto: Bohúňovo

KS:
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:
Obec Bohúňovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

IČO: 36193976
IČ DPH: SK2021500492

Projektant:
Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **1 679,41** |
| DPH | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| | 1 679,41 | 23,00% | 386,26 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **2 065,67** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

**Objednávateľ** **Zhotov**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**04 - Odberné elektrické zariadenie**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **1 679,41** |
| M - Práce a dodávky M | 1 004,97 |
| 21-M - Elektromontáže | 895,76 |
| 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 109,21 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 474,44 |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 200,00 |



# ROZPOČET

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**04 - Odberné elektrické zariadenie**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **1 679,41** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 004,97 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 895,76 |
| 1 | K | 210010065.S | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6036, uložená pevne | m | 6,000 | 3,47 | 20,82 |
| *2* | *M* | *345710004400.S* | *Rúrka oceľová závitová 6036 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 47 mm* | *m* | *6,000* | *16,70* | *100,20* |
| 3 | K | 210010091.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne | m | 10,000 | 1,78 | 17,80 |
| *4* | *M* | *345710005700* | *Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09063 BA, D 63, KOPOS* | *m* | *10,000* | *1,09* | *10,90* |
| 5 | K | 210100014.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 8,000 | 3,47 | 27,76 |
| 6 | K | 210100631.S | Montáž teplom zmraštiteľnej rozdeľovacej hlavy HCZ4-4/35 | ks | 2,000 | 8,69 | 17,38 |
| *7* | *M* | *345850000100.S* | *Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava HCZ4-4/35* | *ks* | *2,000* | *3,36* | *6,72* |
| 8 | K | 210101262.S | NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 1,000 | 20,26 | 20,26 |
| *9* | *M* | *345820040526.S* | *Spojka SVCZ 25-35 univerzálna* | *bal* | *1,000* | *6,15* | *6,15* |
| 10 | K | 210101422.S | Teplom zmrštiteľné stredne hrubé trubice z polyolefinu | ks | 2,000 | 14,47 | 28,94 |
| *11* | *M* | *343430003100.S* | *Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM s lepidlom, 63/19-1000/S 21-57, dĺ. 1000 mm* | *ks* | *2,000* | *11,11* | *22,22* |
| 12 | K | 210120404.S | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,000 | 7,23 | 7,23 |
| *13* | *M* | *358220046600.S* | *Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly* | *ks* | *1,000* | *37,57* | *37,57* |
| 14 | K | 210193053.S | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1,000 | 24,81 | 24,81 |
| *15* | *M* | *357120019400E* | *Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič 50A, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO* | *ks* | *1,000* | *395,00* | *395,00* |
| 16 | K | 210902214.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce | m | 25,000 | 2,38 | 59,50 |
| *17* | *M* | *341110030500.S* | *Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2* | *m* | *25,000* | *3,70* | *92,50* |
| | D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | | | | 109,21 |
| 18 | K | 460200163.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5,000 | 7,53 | 37,65 |
| 19 | K | 460200643.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 1,000 | 11,97 | 11,97 |
| 20 | K | 460300006.S | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 2,000 | 0,30 | 0,60 |
| 21 | K | 460420001.S | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 5,000 | 2,04 | 10,20 |
| 22 | K | 460490012.S | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm | m | 5,000 | 0,68 | 3,40 |
| *23* | *M* | *283230008000* | *Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD* | *m* | *5,000* | *0,16* | *0,80* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K | 460560163.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5,000 | 2,83 | 14,15 |
| 25 | K | 460560643.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 1,000 | 5,44 | 5,44 |
| 26 | K | 460620013.S | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 10,000 | 2,50 | 25,00 |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | 474,44 |
| 27 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 17,53 | 140,24 |
| 28 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 27,40 | 219,20 |
| *29* | *M* | *999000000100.S* | *Ostatný materiál* | *eur* | *115,000* | *1,00* | *115,00* |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 200,00 |
| 30 | K | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 200,000 | 1,00 | 200,00 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**05 - Sklad rekvizít**

JKSO:
Miesto: Bohúňovo

KS:
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:
Obec Bohúňovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

IČO: 36193976
IČ DPH: SK2021500492

Projektant:
Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **17 589,24** |

| DPH | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| | 17 589,24 | 23,00% | 4 045,53 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v EUR** | **21 634,77** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dá a

**Objednávateľ** **Zh**

Dátum a podpis: Pečiatka Dá a

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**05 - Sklad rekvizít**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **17 589,24** |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV | 8 145,80 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 525,31 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 436,75 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 2 935,34 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 4 248,40 |
| D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV | 9 443,44 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 31,31 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 3 578,38 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 2 846,46 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 261,75 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 76,02 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 44,95 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 895,75 |
| 783 - Nátery | 1 564,75 |
| 784 - Maľby | 144,07 |



# ROZPOČET

Stavba:
Dom ľudových tradícií - BOHÚŇOVO
Objekt:
**05 - Sklad rekvizít**

Miesto: Bohúňovo
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Bohúňovo
Projektant: Ateliér-Ing.Darina Kohuláková

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **17 589,24** |
| | D | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | 8 145,80 |
| | D | 3 | ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | 525,31 |
| 1 | K | 311321314 | Oprava sokla, základu pribetónovaním, vrátane všetkých prác s tým súvisiacich | m2 | 10,270 | 51,15 | 525,31 |
| | D | 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | 436,75 |
| 2 | K | 417321414 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25 | m3 | 1,050 | 140,71 | 147,75 |
| 3 | K | 417351115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | m2 | 6,980 | 18,93 | 132,13 |
| 4 | K | 417351116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | m2 | 6,980 | 4,93 | 34,41 |
| 5 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) | t | 0,070 | 1 749,39 | 122,46 |
| | D | 6 | ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | 2 935,34 |
| 6 | K | 622401204 | Príprava podkladu pre vonkajšie, vnútorné nátery - penetrácia | m2 | 73,320 | 2,59 | 189,90 |
| 7 | K | 622401208 | Bezcementový prednástrek vonk. a vnút. stien | m2 | 73,320 | 1,99 | 145,91 |
| 8 | K | 622410155 | Náter fasádny akrylátový dvojnásobný, vrátane penetrácie | m2 | 36,660 | 10,64 | 390,06 |
| 9 | K | 622421143 | Omietka vonk., vnút. stien bezcementová jadrová vápenná, vrátane všetkých podkladov | m2 | 73,320 | 22,39 | 1 641,63 |
| 10 | K | 625981132 | Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami polystyrén hr. 40 mm | m2 | 3,490 | 24,57 | 85,75 |
| 11 | K | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 8-16 spevňujúceho | m3 | 7,340 | 65,68 | 482,09 |
| | D | 9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | 4 248,40 |
| 12 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 59,550 | 3,37 | 200,68 |
| 13 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | m2 | 119,100 | 1,73 | 206,04 |
| 14 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 59,550 | 2,27 | 135,18 |
| 15 | K | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | m2 | 18,340 | 5,36 | 98,30 |
| 16 | K | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | m2 | 18,340 | 5,55 | 101,79 |
| 17 | K | 965082923 | Odstránenie násypov, betónov pod podlahy - komplet | m3 | 6,420 | 51,38 | 329,86 |
| 18 | K | 978013191 | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % | m2 | 38,930 | 3,78 | 147,16 |
| 19 | K | 978015291 | Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % | m2 | 40,950 | 2,91 | 119,16 |
| 20 | K | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | t | 0,581 | 13,14 | 7,63 |
| 21 | K | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 13,776 | 15,51 | 213,67 |
| 22 | K | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | t | 137,760 | 0,46 | 63,37 |
| 23 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | t | 13,776 | 13,26 | 182,67 |
| 24 | K | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | t | 137,760 | 1,49 | 205,26 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | K | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 13,776 | 95,00 | 1 308,72 |
| 26 | K | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | t | 45,049 | 18,59 | 837,46 |
| 27 | K | 998991193 | Príplatok za zväčšený presun do 1000 m | t | 45,049 | 2,03 | 91,45 |
| D | D2 | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | 9 443,44 |
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | 31,31 |
| 28 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. | m2 | 4,500 | 4,63 | 20,84 |
| *29* | *M* | *628111500* | *Pás asfaltovaný* | *m2* | *5,200* | *1,84* | *9,57* |
| 30 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 0,308 | 2,41 | 0,74 |
| 31 | K | 998711292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m | % | 0,308 | 0,51 | 0,16 |
| D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | | 3 578,38 |
| 32 | K | 762331812 | Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2, vrátane krytiny | m | 41,500 | 2,72 | 112,88 |
| 33 | K | 762332120 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 | m | 121,000 | 9,00 | 1 089,00 |
| 34 | K | 762341210 | Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz | m2 | 55,000 | 6,09 | 334,95 |
| 35 | K | 762342204 | Montáž kontralatí | m2 | 27,500 | 1,49 | 40,98 |
| 36 | K | 762342213 | Montáž latovania do 60° | m2 | 55,000 | 2,71 | 149,05 |
| 37 | K | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | m3 | 3,147 | 101,75 | 320,21 |
| 38 | K | 762526110 | Položenie vankúšov pod podlahy, impregnované vankúše, vrátane dodávky, povrch. úpravy | m2 | 18,340 | 6,19 | 113,52 |
| *39* | *M* | *605120280* | *Rezivo* | *m3* | *3,460* | *296,00* | *1 024,16* |
| 40 | K | 762795048 | Príplatok za hobľovanie | m3 | 3,147 | 9,53 | 29,99 |
| 41 | K | 762812240 | Montáž + dodávka debnenia stien hobľovaných - štít, spoj. prostriedky, náter | m2 | 5,550 | 30,53 | 169,44 |
| 42 | K | 998762202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | % | 36,196 | 4,16 | 150,67 |
| 43 | K | 998762294 | Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr. | % | 36,196 | 1,20 | 43,53 |
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | | 2 846,46 |
| 44 | K | 764.110 | Krytina z pozinkovaného plechu z tabúľ v tvare škridle, vrátane všetkých doplnkov | m2 | 55,000 | 37,46 | 2 060,30 |
| 45 | K | 764331260 | Klamp. pl. lem. striech tvr. kryt. rš 660 | m | 25,940 | 13,88 | 360,05 |
| 46 | K | 764352203 | Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh. | m | 15,240 | 12,44 | 189,59 |
| 47 | K | 764359212 | Klamp. pl. žľaby kotlík konický | kus | 2,000 | 31,26 | 62,52 |
| 48 | K | 764454204 | Klamp. pl. rúry odpadové kruhové | m | 5,050 | 17,76 | 89,69 |
| 49 | K | 998764201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | % | 28,484 | 1,71 | 48,74 |
| 50 | K | 998764292 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr. | % | 28,484 | 1,25 | 35,57 |
| D | 765 | Krytiny tvrdé | | | | | 261,75 |
| 51 | K | 765901250 | Pokrytie striech fóliou paropriepustnou | m2 | 55,000 | 4,35 | 239,25 |
| 52 | K | 998765201 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | % | 2,615 | 5,18 | 13,55 |
| 53 | K | 998765292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m | % | 2,615 | 3,42 | 8,95 |
| D | 767 | Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | 76,02 |
| 54 | K | 767631126 | Montáž + dodávka mriežky plastovej so sieťkou proti hmyzu 480/235 | kus | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| 55 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | % | 0,758 | 0,83 | 0,63 |
| 56 | K | 998767292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr. | % | 0,758 | 0,51 | 0,39 |
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | 44,95 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | K | 771571101 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu | m2 | 0,840 | 30,48 | 25,60 |
| *58* | *M* | *597640000* | *Dlaž. keramická protišmyková, mrazuvzdorná* | *m2* | *1,000* | *15,83* | *15,83* |
| *59* | *M* | *597640878* | *Lepidlo* | *m2* | *0,840* | *1,95* | *1,64* |
| 60 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | % | 0,450 | 3,28 | 1,48 |
| 61 | K | 998771292 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc | % | 0,450 | 0,88 | 0,40 |
| | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 895,75 |
| 62 | K | 775413132 | Podlahové soklíky alebo lišty drevené, perforované | m | 17,430 | 6,39 | 111,38 |
| 63 | K | 775511260 | Podlahy drevené, vrátane spoj. materiálu, povrch. úpravy | m2 | 18,340 | 42,09 | 771,93 |
| 64 | K | 998775201 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m | % | 8,966 | 0,97 | 8,71 |
| 65 | K | 998775293 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové | % | 8,966 | 0,42 | 3,73 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 1 564,75 |
| 66 | K | 783726300 | Nátery tesárskych konštr. syntetické - matný, dvojnásobný | m2 | 184,740 | 4,26 | 786,99 |
| 67 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštr. proti škodcom | m2 | 184,740 | 4,21 | 777,76 |
| | D | 784 | Maľby | | | | 144,07 |
| 68 | K | 784452571 | Maľba akrylátová 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | m2 | 36,660 | 3,93 | 144,07 |
