

Súťažné podklady:
Zadávanie podlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“

ČASŤ 1 ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa: 504/5120/2025
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 72/2025/08441

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku podlimitnej zákazky na predmet obstarávania

„I/69 Sliač – rekonštrukcia mosta ev.č. 69-006“
(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

1. Objednávateľ

Sídlo: Slovenská správa ciest
Štatutárny orgán: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ
DIČ: 000 033 28
Bankové spojenie: 2021067785
IBAN:
Telefón:
e-mail:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Miloš Kreth
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Pisarcik
- vo veciach realizačných: Ing. Vladislav Štulajter
- kontroly kvality materiálov a prác: Ing. Pavol Oravec

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriad'ovacou listinou č. 5854/M 95 zo dňa 07.12.1995

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: COLAS Slovakia, a.s.
Štatutárny orgán: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslava Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., Pobočka zahraničnej banky
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava

Číslo účtu:

IČO: 31 651 402
IČ DPH: SK2020492111

Tel.:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ Divízie Západ
 - vo veciach technických: p. Matej Matyšek – vedúci strediska Banská Bystrica
 - vo veciach realizačných: p. Matej Matyšek – vedúci strediska Banská Bystrica
- Právna forma: akciová spoločnosť

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - (a) Zmluvné dojednania
(Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
 - (b) Ponukový list
(Zväzok 1)
 - (c) Príloha k ponuke
(Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
 - (d) Osobitné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
 - (e) Všeobecné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (f) Technické špecifikácie
(Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
(Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (h) Cenová časť
(Zväzok 4 súťažných podkladov)
 - (i) Ponuka Zhotoviteľa
(neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (j) Vzorové tlačivá
(Zväzok 2 Časť 4¹ až 14 súťažných podkladov)
 - (k) Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu²

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov uvedené na webovej stránke Objednávateľa <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/zakazky/15>. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „I/69 Sliač – rekonštrukcia mosta ev.č. 69-006“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.
8. Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH 684 432,92 EUR
DPH 23% 157 419,57 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH 841 852,49 EUR

¹ Vzorové tlačivá zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby budú nahradené po predložení originálov zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby.

1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.
2. Plná moc v zmysle bodu 10 Zmluvných dojednaní.
3. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy).

- (slovom Osemstoštyridsaťjedentisícosemstopäťdesiatdvaeur a štyridsaťdeväťeurocentov (EUR s DPH)
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Zmluvných podmienok.
10. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti na predmet zákazky „I/69 Sliač – rekonštrukcia mosta ev.č. 69-006“ („kľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Zmluvných podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.
13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
14. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá Objednávateľ ešte zabezpečené financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa zmluvné Strany na tejto odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť šesťdesiaty kalendárny deň potom, ako bude Zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie Objednávateľa (SSC) o tom, že Objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy. Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadiť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva.
15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - Príloha č. 2 Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác - tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa
 - časť 3.1 Vecný harmonogram
 - časť 3.2 Míľniky
 - časť 3.3 Fakturačný harmonogram
 - Príloha č. 4 Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok
16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č. 3 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa

podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.

17. Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č. 3 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 16 týchto Zmluvných dojednaní.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
 - a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej Únie,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej Únie.
20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, ak nie je v rozpore so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Trnave, dňa 14.04.2025

Zhotoviteľ:

V dňa

Objednávateľ:

7 Máj 2025

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Súťažné podklady:
Zadávanie podlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“

Príloha č. 1 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v členení:

- A/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok
B/ Menovaní Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 a podčlánku 5.1 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Podzhotoviteľov)
C/ Dodávatelia Zhotoviteľa

A/

p.č.	Podzhotoviteľa (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.	BRB výroba, s.r.o.; Bytčianska 497/126, 010 03 Žilina IČO: 50 928 295 Slovenská republika	Branislav Beliančin Rudina, 548, 02331 Rudina, Slovenská republika 24.09.1975	Zvodidlá	6,97 %	58 642,76
2.	Mizi s.r.o. Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica IČO: 52 137 520 Slovenská republika	Miroslav Židek Rozkvet 2055/115, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika 08.04.1988	Dopravné značenie	1,25 %	10 484,17
3.	HADE s.r.o. Jarabínková 8D 821 09 Bratislava IČO: 52 67 50 84 Slovenská republika	Ing. Jozef Antol Párikova 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 Slovenská republika 29.01.1989	Projekčné práce	3,43 %	28 843,50
4.	ALL GEO – Geodetická kancelária Š. Moyzesa 1135/18 960 01 Zvolen IČO: 36 64 89 06 Slovenská republika	Ing. Peter Fašang Uhliarska 477/4, 96233 Budča, Slovenská republika 04.05.1972	Geometrický plán; Spracovanie DSRS geodetická časť	0,37 %	3 100,00
			Súhrn podielu subdodávok	12,02 %	101 070,43

B/

p.č.	Menovaní Podzhotoviteľa (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.	ZYRY – Tem, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, Zvolen, 960 01	Štefan Ratkovský Zvolenská cesta 45/6, 96263	Preložka kábla Slovak Telekom		

	IČO: 35911727 Slovenská republika	Pliešovce, Slovenská republika 20.12.1962		3,34%	28 087,49
			Súhrn podielu subdodávok	3,34%	28 087,49

C/

p.č.	Dodávateľia Zhotoviteľ'a (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľ'a (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.					
			Súhrn podielu subdodávok	0,00%	0,00

V Tmave, dňa 14.04.2025

.....
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

.....
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Súťažné podklady:
Zadávanie podlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“

Príloha č. 2 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe

Funkcia	Meno a priezvisko
Hlavný stavbyvedúci	Ing. Marián Riegel
Zástupca Hlavného stavbyvedúceho	Ing. Dušan Šelemba
Zodpovedný geodet	Ing. Jozef Orság
Koordinátor BOZP	Pavel Krákora

V Trnave, dňa 14.04.2025

.....
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

.....
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Príloha č. 3 k Zmluvným dojednaniám - Harmonogram prác (tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)

- Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

časť 3.1 Vecný harmonogram

- tzv. Ganttov graf- grafická časť vypracovaná vo formáte *.pdf s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie.
- Vecný harmonogram zhotoviteľa musí spĺňať míľník časť 3.2.


časť 3.2 Míľniky

- Zhotoviteľ musí počas výstavby dodržať míľník:
1. Po uplynutí polovice doby výstavby od začatia stavebných prác požadujeme mať finančnú prestavanosť splnenú v min. objeme 40 %.

časť 3.3 Fakturačný harmonogram

- vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka).
- Fakturačný harmonogram zhotoviteľa musí spĺňať míľník časť 3.2.

Harmonogram stavby "Most 69-006 Most cez potok Trebuška"

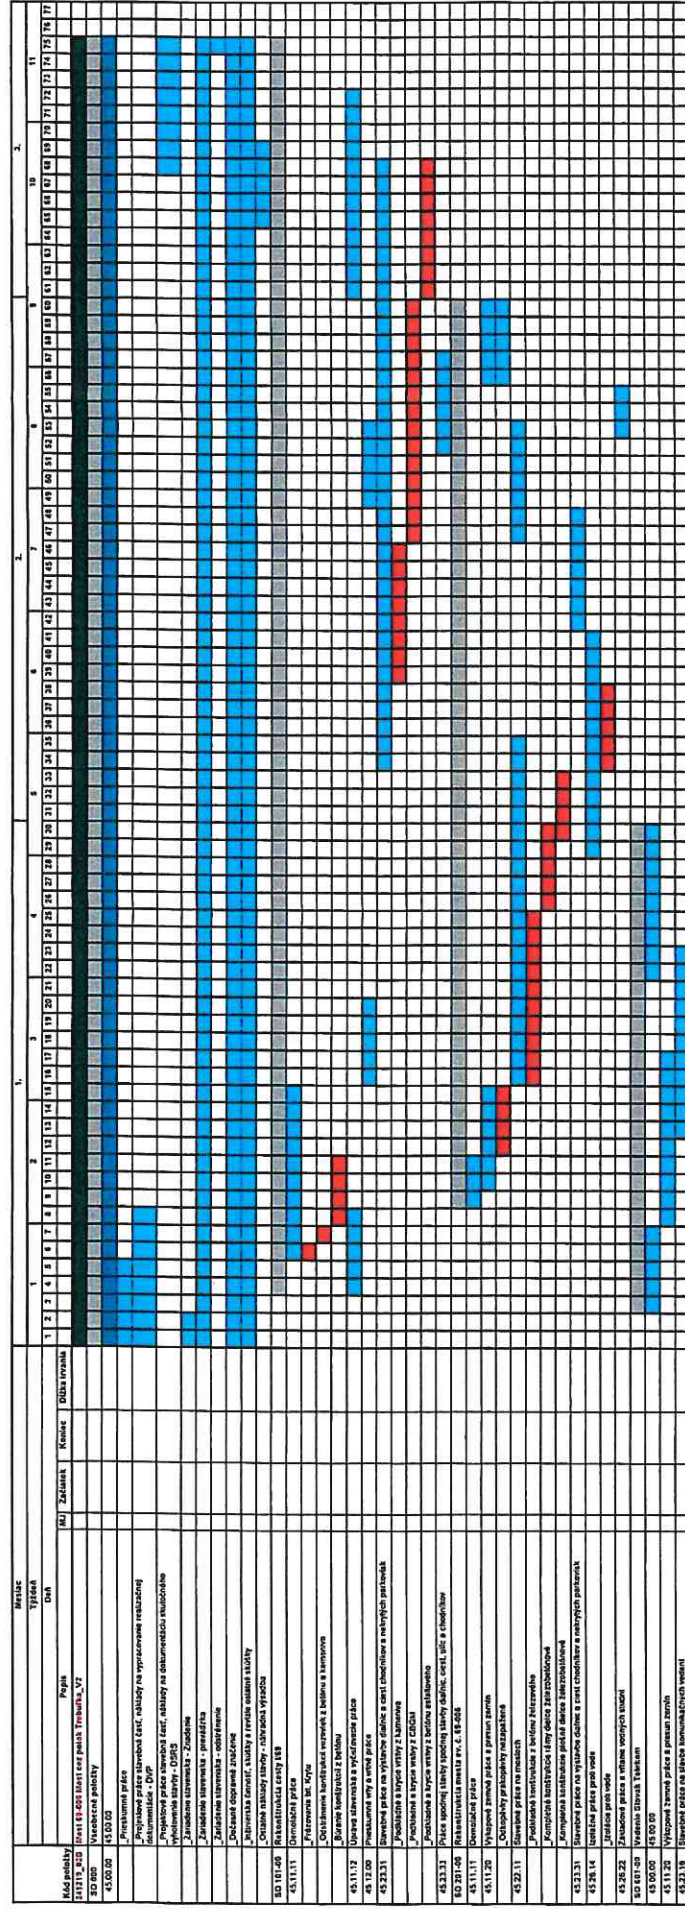

Podmienky BOZP na stavenisku

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Týmito podmienkami sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Objednávateľ.
2. Určuje povinnosti Zhotoviteľa stavby, resp. Podzhotoviteľov, Menovaných Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa (ďalej len "subdodávateľa"):
 - a) pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách Objednávateľa;
 - b) pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách Objednávateľa;

Povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách Objednávateľa sú zabezpečované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).

Čl. 2

Základné pojmy

Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie:

- a) fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke), ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a v plnom rozsahu zodpovednou za BOZP na predmetnom stavenisku Objednávateľa;
- b) fyzická osoba - zamestnanec Objednávateľa, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke);
- c) fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, avšak Objednávateľ s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke).

Základnými opatreniami na zaistenie BOZP na stavenisku sa rozumejú:

- a) bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- b) bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;
- c) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami

ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä práce uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., pri ktorých sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia.

Všeobecné zásady prevencie sú požiadavky na zaistenie BOZP uvedené v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

Čl. 3

Povinnosti stavebníka (Objednávateľ'a)

1. Stavebník je povinný :

- a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;
- b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závažnú stavbu, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národnohospodárske škody.

Čl. 4

Povinnosti Zhotoviteľ'a (realizátora)

1. Zhotoviteľ' je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o dielo a jej nedeliteľných súčasti a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ' zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany subdodávateľ'ov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o dielo.

Čl. 5

Organizačné zložky

Organizačná zložka Objednávateľ'a - Oddelenie investičnej výstavby IVSC Banská Bystrica

zabezpečuje spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátmi práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách;

koordinuje spôsob vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko;

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľ'a alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

SANKČNÝ PORIADOK

Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom)

1. NAPOMENUTIE (porušenie povinností zistené prvý krát):

- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinností udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce
- lešenie bez bezpečnostného štítka
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku
- neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarneho zariadenia a prostriedkov prvej pomoci
- nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov
- fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu
- nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu
- na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov
- manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

2. ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinností opakované (aspoň 2 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinností uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí vyššie, považuje sa takéto porušenie za závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 30,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakované
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinností udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie nevyhovujúceho rebríka
- nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakované
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka
- zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.
- vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia
- používanie nevhodného spôsobu viazania bremien
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa

- manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

3. OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinností opakované (aspoň 3 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinností uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí a v Závažnom porušení BOZP a OPP vyššie, považuje sa takéto porušenie za Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 500,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakované; alebo ak pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinností udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcu
- používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.
- vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu
- opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarum zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- práca s poškodeným ručným elektrickým náradím
- vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia
- používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu.

I/69 Sliach – rekonštrukcia mosta ev. č. 69 -006
 Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác realizovaná podľa §110 ZVO
 Súťažné podklady - Zväzok 1 – 1.5 Prílohy a formuláre

Príloha č. 3

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky

I/69 – rekonštrukcia mosta ev. č. 69 – 006

Uchádzač / skupina dodávateľov

COLAS SLOVAKIA, A.S.
 OREŠIANSKA 3168/7
 917 01 TRNAVA

Je uchádzač platiteľom DPH?¹

ÁNO

NIE

Kritérium	Návrh na plnenie kritéria	
Kritérium č. 1 Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v eurách $\pm$ DPH	cena celkom v EUR bez DPH	684 432,92
	DPH 23%	157 419,57
	cena celkom v EUR s DPH	841 852,49
Kritérium č. 2 Lehota výstavby vyjadrená v celých dňoch odo dňa začatia prác	počet dní	75

V Trnave, dňa 07.01.2025

.....
 Ing. Ľubomír Rác
 COLAS Slovakia, a.s. - na základe plnej moci

¹ Nehodiace sa preškrtnúť

**ČASŤ 3
ZMLUVA O DIELO**

PRÍLOHA K PONUKE

**PRE ZMLUVU O DIELO
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ**

Názov diela: Dielo „I/69 Sliač – rekonštrukcia mosta ev.č. 69-006“

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa		Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa		
Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru	1.1.2.4	Bude oznámený
Koordinátor bezpečnosti	1.1.2.12	Pavel Krákora
Bezpečnostný technik Objednávateľa	1.1.2.14	Bude oznámený
Záručná doba	1.1.3.10	trvanie: Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 24 mesiacov
Akceptovaná zmluvná hodnota	1.1.4.1	Cena bez DPH: 684 432,92 EUR DPH 23% : 157 419,57 EUR Cena s DPH: 841 852,49 EUR

		<i>(Výška Akceptovanej zmluvnej hodnoty je uvedená v bode 8. zmluvných dojednaní)</i>
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu; Bude sa viesť elektronický stavebný denník
Použité právne predpisy	1.1.6.5	Právne predpisy Slovenskej republiky, právo EÚ
Termín predloženia „Sprievodca stavby (manuál stavby)“	1.1.6.12	Do 30 dní od podpisu ZoD
Rozhodujúci jazyk	1.3	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.3	Slovenský
Sociálne hľadisko	1.17	Nevyžaduje sa
Environmentálny plán výstavby	4.1	Nevyžaduje sa
Povodňový plán zabezpečovacích prác	4.1 g)	Vyžaduje sa
Monitorovanie stavby	4.1 h)	Vyžaduje sa
Počet samostatne stojacich kamier	4.1. h)	2 ks
Archeologický výskum	4.1 j)	Nevyžaduje sa
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	Vo výške 10 200,00 EUR Výška Zábezpeky na vykonanie prác bude 1,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH. Zábezpeka na vykonanie prác bude zaokrúhlená nadol na celé stovky EUR (konkrétna výška bude vypočítaná v súlade s nižšie uvedeným a doplnená úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy).
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a	20 % z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa
Správy o postupe prác	4.21	Vyžaduje sa
Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	4.28	30 dní od Dátumu začatia prác

Vyššia trieda presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy	4.7	Nevyžaduje sa
Lehota výstavby v zmysle projektovej dokumentácie	8.2	180 dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1)
Lehota výstavby v zmysle ponuky Zhotoviteľa (v prípade ak jedným z hodnotiacich kritérií bola aj dĺžka lehoty výstavby)	8.2	75 dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1) – doplní Zhotoviteľ
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby v prípade, ak hodnotiacim kritériom je aj dĺžka lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu)	8.7 & 14.15 (b)	Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Odškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Míľniku)	8.7 & 14.15 (b)	0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie – nesplnenie Lehoty výstavby	8.7	50 % z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH
Geometrický plán	10.1 & 17.7	Vyžaduje sa
Zábezpeka na záručné opravy	11.13	3 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Tabuľka údajov o úpravách
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3 (c)	5 % zo zmluvnej ceny vrátane DPH
Limit zadržaných platieb	14.3 (c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehota na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) 14 dní od účinnosti Zmluvy b) 14 dní od účinnosti Zmluvy
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2 (d)	Neuplatňuje sa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	50 000 EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť
Sankcie:		
Dôverné podrobnosti – sankcia za porušenie povinnosti	1.12	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.12 Osobitných zmluvných podmienok

Spoločná a nerozdiedna zodpovednosť - sankcia za porušenie povinnosti	1.14	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.14 Osobitných zmluvných podmienok
Konflikt záujmov – sankcia za porušenie povinnosti	1.16	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.16 Osobitných zmluvných podmienok
Sociálne hľadisko – sankcia za porušenie povinnosti	1.17	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.17 Osobitných zmluvných podmienok
Pravidelné pracovné rokovania - sankcia za porušenie povinnosti	3.6	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 3.6 Osobitných zmluvných podmienok
Environmentálny plán výstavby - sankcia za porušenie povinnosti	4.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok
Evidencia strojov a zariadení – sankcia za porušenie povinnosti	4.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok
Regiter partnerov verejného sektora - sankcia za porušenie povinnosti	4.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok
Predloženie technologického postupu - sankcia za porušenie povinnosti	4.1 e)	250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Preloženie týždenného plánu prác - sankcia za porušenie povinnosti	4.1 f)	250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Predloženie povodňového plánu - sankcia za porušenie povinnosti	4.1 g)	250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Monitorovanie stavby - sankcia za nesplnenie povinnosti	4.1 h)	1000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Sankcia za nesprávadzkovanie kamier do 24 hodín od vzniku poruchy	4.1 i)	1000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Zábezpeka na vykonanie prác - sankcia za porušenie povinnosti (Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku)	4.2	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok
Zábezpeka na vykonanie prác - sankcia za porušenie povinnosti (Zhotoviteľ nepredloží platnosť Zábezpeky)	4.2	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok
Sankcia za porušenie podmienky podľa § 34 ods. 1. písmeno g) zákona o verejnom obstarávaní	4.3	20 000,- EUR za každé nesplnenie podmienky § 34 ods. 1. písmeno g) zákona o verejnom obstarávaní
Predstavitel' Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti	4.3	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.3 Osobitných zmluvných podmienok
Podzhotoviteľa, Menovaní Podzhotoviteľa a Dodávateľa Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti	4.4	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.4 Osobitných zmluvných podmienok
Zabezpečenie kvality - sankcia za porušenie povinnosti	4.9	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.9 Osobitných zmluvných podmienok
Ochrana životného prostredia - sankcia za porušenie povinnosti	4.18	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.18 Osobitných zmluvných podmienok
Pracovno – právne vzťahy - sankcia za porušenie povinnosti	6.4	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.4 Osobitných zmluvných podmienok
Pracovná doba - sankcia za porušenie povinnosti	6.5.	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.5 Osobitných zmluvných podmienok
Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7	500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
BOZP – sankcie za porušenie povinností	6.7	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.7 Osobitných zmluvných podmienok
Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti	6.10	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.10 Osobitných zmluvných podmienok
Spôsob vykonávania prác - sankcia za porušenie povinnosti	7.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 7.1 Osobitných zmluvných podmienok
Skúšky - sankcia za porušenie povinnosti	7.4	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 7.4 Osobitných zmluvných podmienok

Začatie prác - sankcia za porušenie povinnosti	8.1	0,05% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty za každý aj začatý deň omeškania so začatím prác
Harmonogram prác - sankcia za porušenie povinnosti	8.3	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok
Sankcia za Opustenie Diela	8.14	Zmluvná pokuta vo výške Zábezpeky na vykonanie prác
Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád – sankcia za porušenie	11.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 11.1 Osobitných zmluvných podmienok
Odstraňovanie vád po vydaní protokolu o vyhodnotení Diela / v Záručnej dobe - sankcia za porušenie povinnosti	11.12	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 11.12 Osobitných zmluvných podmienok
Oceňovanie - nedodanie požadovaných dokladov - sankcia za porušenie povinnosti	12.3	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 12.3 Osobitných zmluvných podmienok
Platba zádržného - sankcia za porušenie povinnosti	14.9	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 14.9 Osobitných zmluvných podmienok

V Trnave, dňa 14.04.2025

.....
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

.....
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
SO 000	2141	Všeobecné položky	86 958,62	20 000,48	106 959,10
SO 101-00	2111	Rekonštrukcia cesty I/69	415 312,09	95 521,78	510 833,87
SO 201-00	2141	Rekonštrukcia mosta ev. č. 69-006	155 556,45	35 777,98	191 334,43
SO 601-00	2224	Vedenie Slovak Telekom	26 605,76	6 119,33	32 725,09
Celkový súčet			684 432,92	157 419,57	841 852,49
