



00127662

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa : **ZM/2013/0053**
Číslo zhotoviteľa : Z1/2012/314/11

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi:

1. Objednávateľ:

Názov **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma akciová spoločnosť,
zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, vložka
č. 3518/B
Sídlo Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO 35 919 001
IČ DPH SK 2021937775
DIČ 2021937775
Štatutárny orgán Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

- o veciach technických

- o veciach cenových

Stavebný dozor:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: **Drieňová 27, 826 56 Bratislava**
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel : Sa, vložka č.518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Marián Ďurčo, riaditeľ závodu Prefa
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Tel./Fax:
Realizačný závod: Doprastav, a.s. Závod Prefa, Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Osoby oprávnené rokovať

- o veciach zmluvných:

- o veciach technických:

- o veciach cenových:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo **Ochrana portálových konštrukcií na D2 Bratislava – ŠH SR/ČR – križovatka Malacky** (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, touto zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v článku 4 zmluvy.
- 1.2 Bližšia špecifikácia diela je uvedená v časti B1 súťažných podkladov.

Článok 2. Miesto a čas plnenia

- 2.1 Miestom plnenia, resp. vykonávania diela je diaľnica D2 Bratislava – ŠH SR/ČR.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, a to nasledovne:
- začatie vykonávania diela: 02.04.2013
 - ukončenie vykonávania diela: **do 30.06.2013**
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi.
- 2.5 Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s článkom 8 bodom 8.5 tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 10 dní od písomného oznámenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 10 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo v súlade s harmonogramom prác podľa bodu 2.2 zmluvy, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.

Článok 3. Odovzdanie staveniska

- 3.1 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 3 pracovné dni pred terminom začatia vykonávania diela v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác podľa bodu 2.2 zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa.
- 3.2 Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.

Článok 4. Cena za dielo

- 4.1 Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou z elektronickej aukcie.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR: 252.709,37

DPH 20% EUR: 50.541,87

Cena spolu s DPH v EUR: 303.251,24

slovom: tristotritisíc dvestopäťdesiatjeden Eur dvadsaťštyri centov

- 4.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku. Jednotkové ceny z elektronickej aukcie sú pevné počas trvania zmluvy a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 4.3 Ak sa pri vykonávaní diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávatelom (stavebným dozorom) formou zápisu v stavebnom denníku. Následne sa zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upraví rozsah, prípadne cenu, platobné podmienky, termín plnenia.
- 4.4 Pri ocenení nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy, budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 5. časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny za vykonanie diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

Článok 5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.
- 5.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučene doručených do sídla objednávateľa, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac až po jeho uplynutí.
- 5.3 Podkladom pre fakturáciu bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac vyhotovený na základe geodetického zamerania a rekapitulácia súpisu skutočne vykonaných prác uvedených v stavebnom denníku. Súpis stavebný dozor potvrdí po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesi /preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok/, ktoré budú odsúhlasené povereným zamestnancom laboratória objednávateľa. Súpis potvrdený stavebným dozorom je zhotoviteľ povinný doložiť ako prílohu k faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
- 5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 5.5 Pri úhrade mesačnej faktúry zadrží objednávatel 10% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.
- 5.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
- 5.6.1 Objednávatel uvoľní zádržné po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa čl. 8 bod 8.5 tejto zmluvy, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH a za podmienky, že nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody alebo nenastala skutočnosť, ktorá oprávňuje objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávatel vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na vrátenie bankovej záruky.
- 5.6.2 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vad. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 5.6.1 tohto článku, zádržné objednávatel uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.2.
- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávatel povinný v zmysle bodu 5.6 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.8 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, Identifikáciu faktúry, číslo zmluvy, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, referenčné číslo u objednávateľa číslo stavby YTV 1711 podľa číselníka u objednávateľa, bankové spojenie v zmysle zmluvy, fakturovanú sumu priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na realizáciu stavebných objektov V1-1. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávatel je

oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Článok 6. Podmienky vykonávania diela

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na vykonanie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.2 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa, ak má na to závažné dôvody. Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 6.1 tohto článku.
- 6.3 Pred začiatkom vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto nedostatky existujú.
- 6.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania staveniska oznámiť objednávateľovi meno zodpovedného pracovníka (stavbyvedúceho), ktorý bude poverený riadením prác.
- 6.5 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez písomného odsúhlasenia technického dozoru objednávateľa. Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 6.7 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 6.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky diaľnice.
- 6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVaRR SR v zmysle §3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov.
- 6.13 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania diela nie je súčasťou predmetu zmluvy. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom) objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

Článok 7 Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 7.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho p. Daniela Vavrača, v jeho neprítomnosti zástupcu stavbyvedúceho Ing. Al Heraki Hidayata resp Ing. Erika Zdarileka – vedúceho strediska, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela a vystavení faktúr.
- 7.2 Objávateľ poveruje funkciou stavebného dozora Ing. Jányho, v jeho neprítomnosti Ing. Klačanovú, zastupujúcich objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, preberaní diela a kontrole vystavených faktúr.

7.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa zmeny.

Článok 8. **Preberanie diela**

- 8.1 Preberanie bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a s požiadavkami technicko - kvalitatívnych podmienok v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý je zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr 14 dní pred terminom začatia prác. Žiadna konštrukčná časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek konštrukčnú časť diela pred jej zakrytím. O prevzatí jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom stavebný dozor, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky.
- 8.2 Najneskôr 5 dní pred protokolárnym odovzdaním a prebratím diela podľa bodu 8.5 tohto článku je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) - stavebnú časť opečiatkovanú a podpísanú povereným zástupcom zhotoviteľa (stavbyvedúci), správu o hodnotení kvality stavebných prác odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa, stavebný denník s rekapituláciou výmer skutočného realizovania prác, geodetickú dokumentáciu - zameranie skutočného vyhotovenia 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme vo formáte PDF a 1x vo formáte DWG.
- 8.3 Objednávateľ pripraví k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu diela celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho odovzdávacieho konania.
- 8.4 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade so súťažnými podkladmi, kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a technickými normami.
- 8.5 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

Článok 9. **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 9.1 Záručná doba na dielo ako celok je 60 mesiacov.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a technickým normám uplatneným v zmluve a že nemá vady.
- 9.3 Záručná doba na dielo začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku 8 bod 8.5 tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 15 dní od doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.4 Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný v rovnakej lehote objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady.
- 9.5 Ak zhotoviteľ na základe reklamácie objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 9.6 Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 9.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.
- 9.8 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

Článok 10 **Zmluvné sankcie**

- 10.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením vykonávania diela a/alebo odovzdaním diela podľa článku 2 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania a zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.
- 10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nedodržaní hromohogramu postupu a trvania prác, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania.
- 10.4 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiaval kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia alebo inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 10.6 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.7 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 11. Ukončenie zmluvy

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.7, 3.2.6.1, 6.2 alebo 13.2,
 - c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.

Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.

Nepodstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je najmä :

- a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa tejto zmluvy súťažných podkladov a vady zistené objednávateľom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom
- b) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 5 dní

V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle predchádzajúcej vety je 10 dní.

- 11.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti

objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

- 11.6 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 11.7 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.6 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 4 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.

Článok 12. **Doručovanie**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 13. **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- 13.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 13.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- 13.4 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukončení zmluvy musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo.
- 13.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy :
1. Harmonogram prác
 2. Rozpočet
- 13.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Marián Durco
riaditeľ Závodu Prefa


Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

**Ochrana portálových konštrukcií na D2 Bratislava – štátna hranica
SR/ČR križovatka Malacky**

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC – príloha č.1 k ZoD

Príloha č.1 Harmonogram prác

Doprastav a. s. závod Prefa

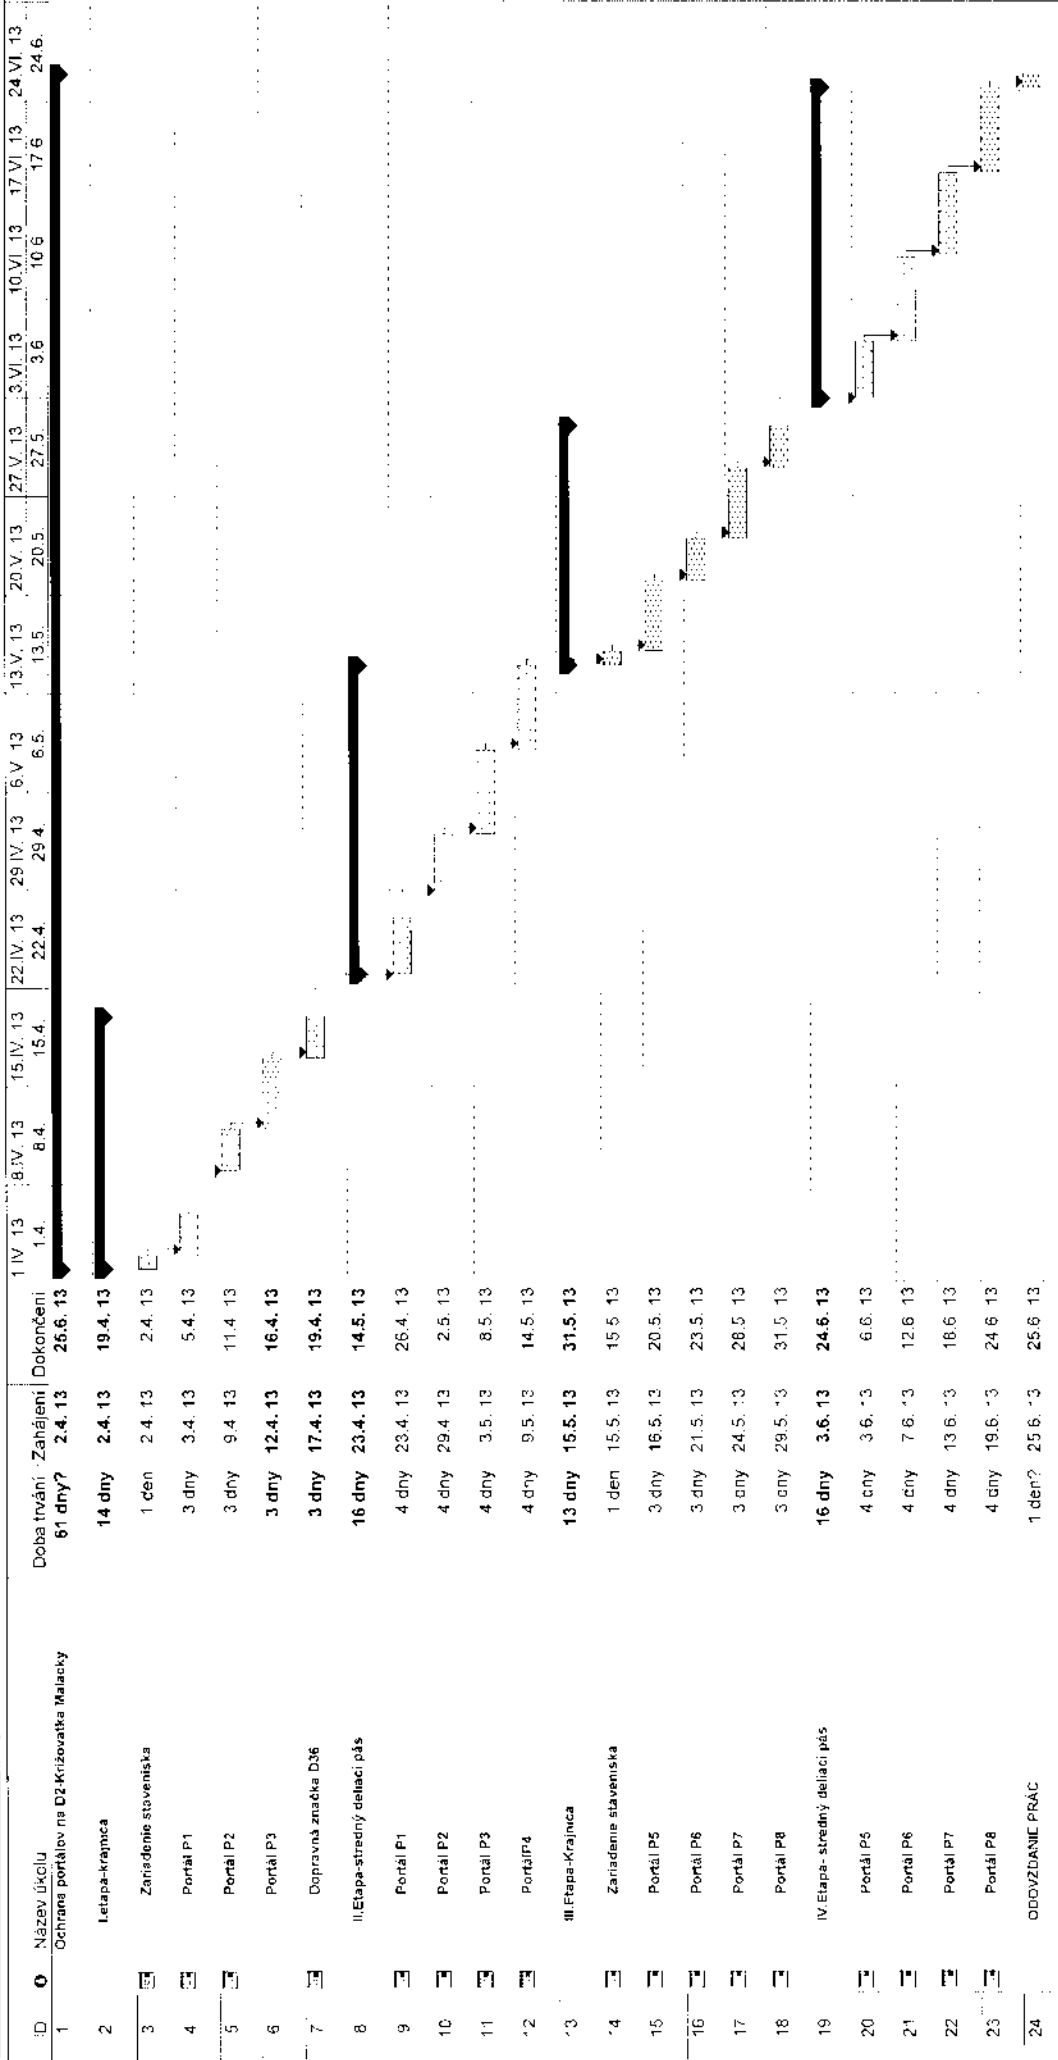

Krycí list k dokumentu

Zmluva o dielo

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa : Z1/2012/314/11

na zákazku „Ochrana portálových konštrukcií na D2 Bratislava – ŠH SR/ČR – križovatka Malacky“

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320

Realizačný závod: Závod Prefa, Drieňová 31, 821 01 Bratislava

1. Celý záznam označený ako "Rozpočet", ktorý je súčasťou Zmluvy o Dielo ako jej príloha číslo 2 zhotoviteľ v súlade s § 17a nasl. Obchodného zákonníka v zmysle svojho interného predpisu, ktorým je Smernica generálneho riaditeľa č. 14/2010 „Ochrana obchodného tajomstva“, ochraňuje ako **obchodné tajomstvo**.

2. Zhotoviteľ v súlade s § 11 Občianskeho zákonníka ochraňuje v ZoD tiež nasledovné údaje, ktoré sú **prejavom osobnej povahy**:

- osobné údaje týkajúce sa osoby konajúcej v mene štatutárneho orgánu uvedené v časti ZoD týkajúcej sa identifikačných údajov zmluvných strán – v odseku "2. Zhotoviteľ" a v podpisovej časti ZoD a podpis tejto osoby uvedený v podpisovej časti ZoD,
- podpis štatutárneho orgánu zhotoviteľa uvedený v podpisovej časti ZoD,
- osobné údaje týkajúce sa zástupcov zhotoviteľa vo veciach zmluvných, technických a cenových uvedené v odseku "2 Zhotoviteľ" v časti ZoD týkajúcej sa identifikačných údajov zmluvných strán.
- osobné údaje všetkých osôb uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy ako poverených zamestnancov zhotoviteľa.

Na uvedený účel osobnými údajmi sa rozumie titul, meno, priezvisko, funkcia, všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.

3. Zhotoviteľ **z dôvodu ochrany bankového spojenia a čísla účtu** chráni údaje uvedené v odseku "2 Zhotoviteľ" v identifikačných údajoch zmluvných strán.

4. Z dôvodov uvedených v bode 1 až 3 tohto Krycieho listu dokumentu a tiež z dôvodu, že ide o **informácie v ZoD, ktoré** sú výsledkom duševnej činnosti zhotoviteľa, nakoľko tieto **neboli** podľa § 10 ods. 2 písm. c) v spojení s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov **obstarané z verejných prostriedkov a zhotoviteľ, ktorý nie je povinnou osobou, so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí**, objednávateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na zabezpečenie vhodnej ochrany obchodného tajomstva, a to aj v prípade povinného zverejnenia ZoD v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a citovaného zákona č. 211/2000 Z. z.

5 Zhotoviteľ žiada objednávateľa, aby údaje nim označené v bodoch 1 až 3 tohto krycieho listu dokumentu vhodným spôsobom **anonymizoval**, t. j. prekryl alebo iným spôsobom znemožnil ich čitateľnosť.

Ing. Marián Durčo
riaditeľ Závodu Prefa

Ochrana portálových konštrukcií na D2 Bratislava – štátna hranica SR/ČR križovatka Malacky

R O Z P O Č E T – príloha č. 2 k ZoD.

POLOŽKA		VÝKAZ VYMER	M. J.	MNOŽSTVO	Jednotková cena (€)	Cena bez DPH (€)
KOD KP	KÓD KPP					
45.00.00		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb				
	00020803	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávanie dokumentácie (DVP a DSRS)	kpl	1,00		
	0002080301	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávanie dokumentácie, dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	kpl	1,00		
	0002080302	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávanie dokumentácie, dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	1,00		
45.11.11		Demolačné práce				
	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	192,00		
		Odstránenie dišt. plechov ocel. zvodidiel v SDP 8 (portály) * 2 (na oboch koncoch prerušenia zvodidiel) * (16 m (dĺžka) a 2 m) = 8 * 2 * 8		128,00		
		Odstránenie stĺpkov ocel. zvodidiel v SDP 8 (portály) * 2 (na oboch koncoch prerušenia zvodidiel) * (16 m (dĺžka) a 4 m) = 8 * 2 * 4		64,00		
				192,00		
	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	492,00		
		odstránenie jestvujúcich obojstranných zvodidiel v SDP v mieste budovania portálov DZ 8 (portály) * 52 m (dĺžka)		416,00		
		odstránenie jednostranných oceľových zvodidiel v mieste budovania portálov DZ na krajnici P2		44,00		
		P3		12,00		
		P8		20,00		
				76,00		
	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	48,00		
		smerové stĺpiky 8 (portály) * (SDP - 2 + 2 ks, okraje 1 + 1 ks) =		48,00		
	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	23,07		
	0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km		23,07		
		smerové stĺpiky (48*0.01)		0,48		
		ocel. zvodidlá (492*0.042)		20,67		
		stĺpiky oceľových zvodidiel (64*0.020)		1,28		
		dištančné plechy (128*0.005)		0,64		
				23,07		
45.11.24		Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	1 224,00		
	0102020007	Odkopávky s prekopávkou nezapažené tr. horniny 1-4	m3	1 224,00		
		(digitálne z priečných rezov, planimetrom) výkopy pre výmenu str. deliaceho pásu a nespovnenej krajnice z dôvodu ich neúnosnosti v SDP 8* (2,00 m2* 60 m) na krajnici 8* (0,75 m2 * 44)		960,00		
				264,00		
				1224,00		
	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 207,04		
	0104020202	Konštrukcie z hornín - nasypy so zhutnením zo zemín nesudržných	m3	1 207,04		
		dosypávka stredného deliaceho pásu v mieste osadenia betónových zvodidiel SD (32-63) 1,055 m2 * 60 m * 8 SD (0-4) 0,115 m2 * 60 m * 8 Zásyp SDP medzi prahcami (0,8*60-4,5)*8		506,40		
				55,20		
				348,00		
				909,60		

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER	M J	MNOŽSTVO	Jednotková cena (€)	Cena bez DPH (€)
KOD KP	KOD KPP						
45.23.12			dosypávka nespevnenej krajnice v mieste osadenia betónových zvodidiel				
			ŠD (32-63) 0,40 m ² * 44 m * 8		140,80		
			ŠD (0-4) 0,07 m ² * 44 m * 8		24,64		
			Zásyp nesp. krajnice medzi prážkami (0,4*44-1 1)*8		132,00		
					297,44		
	01060202		Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	480,00		
	0106020201		Premiestnenie výkopku resp. rúbariny vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4	m3	480,00		
			Odvoz výkopku na medziskládku a späť (348+132)		480,00		
	01060204		Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	744,00		
	0106020401		Premiestnenie výkopku resp. rúbariny vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	744,00		
			v SDP 960-348=		612,00		
			na krajnici 264-132=		132,00		
					744,00		
	01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	480,00		
	0106070001		Premiestnenie výkopku resp. rúbariny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	480,00		
			v SDP		348,00		
			v nespevnenej krajnici		132,00		
					480,00		
	01080402		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	1 080,00		
	0108040201		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch tr. horniny 1-4	m2	1 080,00		
			v mieste dosypávok krajnic (8*2,5*54)		1 080,00		
					1 080,00		
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk				
	22250356		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	1 248,00		
	2225035602		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s uzavretým zámkom	m	1 248,00		
			podľa situácie zvodidiel - výkresov č. 2.1 - 2.8 bet. jednostranné zvodidlá s voľným zámkom, úroveň zachytenia H2, umiestnenie v str. del. páse diaľnice D1 (pre 8 portálov v SDP)				
			bežný dielec 8*96		768,00		
			koncový dielec 8*8		64,00		
			prechodový dielec na NH4 8*8		64,00		
					896,00		
			podľa situácie zvodidiel - výkresov č. 2.1 - 2.8 bet. jednostranné zvodidlá s voľným zámkom, úroveň zachytenia N2, umiestnenie na nesp. krajnici diaľnice D1 (pre 4 portály a 1 ks D7 D36)				
			P1, P5, P6, P7, DZ 36				
			bežný dielec 5*36		180,00		
			koncový dielec 5*8		40,00		
					220,00		
			podľa situácie zvodidiel - výkresov č. 2.1 - 2.8 bet. jednostranné zvodidlá s voľným zámkom, úroveň zachytenia N2, umiestnenie na nesp. krajnici diaľnice D1 (pre 3 portály)				
			P2, P3, P8				
			bežný dielec 3*36		108,00		
			koncový dielec 3*4		12,00		
			prechodový dielec na NH4 3*4		12,00		
					132,00		
	22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	320,00		
	2225036201		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou	m	64,00		
			digitálne zo situácie úroveň zachytenia H1				
			nové nábehy v SDP pri osadzovaní portálov DZ 8 (portály) * 2 (nábehy) * 4 (metre - dĺžka nábehov) =		64,00		
	2225036205		Doplňujúce konštrukcie, doplnenie zvodidiel oceľových				

POLOŽKA		VÝKAZ VYMER	M. J.	MNOŽSTVO	Jednotková cena (€)	Cena bez DPH (€)
KÓD KP	KÓD KPP					
45.25.32	22250464	podľa schémy - výkres bet. zvodidiel č. 9 doplnenie stĺpkov a ostatného materiálu zvodidiel pred miestami osadenia portálov DZ v str. del. páse doplnenie na dĺžke 16 m na každej strane napojenia na bet. zvodidlá = 8 (portály) * 16 m * 2	256,00			
		nové stĺpiky 8 (portály v SDP) * 26 (ks) = 208 ks nové stĺpiky 3 (portály P2, P3, P8) * 13 (ks) = 39 ks				
		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	48,00		
	22251592	smerové stĺpiky a nádstavce na zvodidlá každých 50 m nádstavce v mieste portálov DZ 8 (portály) * (SDP - 2 + 2 ks okraje 1 + 1 ks) =	48,00			
		Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	5 200,00		
		vozovka (jestvujúce komunikácie počas výstavby) odhad	5 200,00			
11010101	1101010107	Ostatné betonárske práce				
		Základy, pásy z betónu prostého	m3	43,60		
		Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)	m3	43,60		
		betónové prahy pod betónové zvodidlá pre jeden portál v SDP: 0,20*0,25*1,5*58 = 4,35 m3 pre 8 portálov v SDP	34,80			
		pre jeden portál na krajnici: 0,25*0,25*1,0*22 = 1,1 m3 pre 8 portálov na krajnici	8,80			
			43,60			
CENA SPOLU BEZ DPH						252 709,37 €
DPH 20%						50 541,87 €
CENA SPOLU S DPH						303 251,24 €

POLOŽKA		VÝKAZ VÝMER	M. J.	MNOŽSTVO	Jednotková cena (€)	Cena bez DPH (€)
KÓD KP	KÓD KPP					
45.00.00		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb				
	00020803	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaní dokumentácie (DVP a DSRS)	kpl	1,00		
	0002080301	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaní dokumentácie, dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	kpl	1,00		
	0002080302	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaní dokumentácie, dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	1,00		
45.11.11		Demolačné práce				
	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	192,00		
		Odstránenie dišt. plechov oceľ. zvodičiel v SDP 8 (portály) * 2 (na oboch koncoch prerušenia zvodičiel) * (16 m (dĺžka) a 2 m) = 8 * 2 * 8		128,00		
		Odstránenie stĺpkov oceľ. zvodičiel v SDP 8 (portály) * 2 (na oboch koncoch prerušenia zvodičiel) * (16 m (dĺžka) a 4 m) = 8 * 2 * 4		64,00		
				192,00		
	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodičiel, zábradlia, stien kovových	m	492,00		
		odstránenie jestvujúcich obojstranných zvodičiel v SDP v mieste budovania portálov DZ 8 (portály) * 52 m (dĺžka)		416,00		
		odstránenie jednostranných oceľových zvodičiel v mieste budovania portálov DZ na krajnici P2 P3 P8		44,00 12,00 20,00		
				76,00		
	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	48,00		
		smerné stĺpiky 8 (portály) * (SDP - 2 + 2 ks, okraje 1 + 1 ks) =		48,00		
	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodrovnná	t	23,07		
	0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodrovnná nad 1 km		23,07		
		smerné stĺpiky (48*0.01)		0,48		
		oceľ. zvodičie (492*0.042)		20,67		
		stĺpiky oceľových zvodičiel (64*0.020)		1,28		
		dištančné plechy (128*0.005)		0,64		
				23,07		
45.11.24		Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	1 224,00		
	0102020007	Odkopávky s prekopávky nezapažené tr. horniny I 4	m3	1 224,00		
		(digitálne z priečnych rezov, planimetrovaním) výkopy pre výmenu str. deliaceho pásu a nespevnenej krajnice z dôvodu ich neúnosnosti v SDP 8* (2,00 m2* 60 m) na krajnici 8* (0,75 m2 * 44)		960,00 264,00		
				1224,00		
	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 207,04		
	0104020202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných	m3	1 207,04		
		dosypávka stredného deliaceho pásu v mieste osadenia betónových zvodičiel ŠD (32-53) 1,055 m2 * 60 m * 8 ŠD (0-4) 0,115 m2 * 60 m * 8 Zásyp SD medzi prahcami (0,8*60-4 5)*8		506,40 55,20 348,00		

45.23.12

			909,60		
		<i>dosypávka nespevnenej krajnice v mieste osadenia betónových zvodidiel</i>			
		<i>ŠD (32-63) 0,40 m² * 44 m * 8</i>	140,80		
		<i>ŠD (0-4) 0,07 m² * 44 m * 8</i>	24,64		
		<i>Zásyp nesp. krajnice medzi pražcami (0,4*44-1,1)*8</i>	132,00		
			297,44		
01060202		Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	480,00	
	0106020201	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné do 1 000 m tr. horniny 1-4	m3	480,00	
		<i>Odvoz výkopku na medziskladku a späť (348+132)</i>	480,00		
01060204		Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	744,00	
	0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m tr. horniny 1-4	m3	744,00	
		<i>v SDP 960-348=</i>	612,00		
		<i>na krajnici 264-132=</i>	132,00		
			744,00		
01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	480,00	
	0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	480,00	
		<i>v SDP</i>	348,00		
		<i>v nespevnenej krajnici</i>	132,00		
			480,00		
01080402		Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	1 080,00	
	0108040201	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch tr. horniny 1-4	m2	1 080,00	
		<i>v mieste dosypávok krajnic (8*2 5*54)</i>	1 080,00		
			1 080,00		
		Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk			
22250356		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	1 248,00	
	2225035602	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubom rámkom	m	1 248,00	
		<i>podľa situácie zvodidiel - výkresov č. 2.1 - 2.8</i>			
		<i>bet. jednostranné zvodidlá s voľným zámkom, úroveň</i>			
		<i>zachytenia H2, umiestnenie v str. del. páse diaľnice D1 (pre</i>			
		<i>8 portálov v SDP)</i>			
		<i>bežný dielc 8*36</i>	768,00		
		<i>koncový dielc 8*8</i>	64,00		
		<i>prechodový dielc na NH4 8*8</i>	64,00		
			896,00		
		<i>podľa situácie zvodidiel - výkresov č. 2.1 - 2.8</i>			
		<i>bet. jednostranné zvodidlá s voľným zámkom, úroveň</i>			
		<i>zachytenia N2, umiestnenie na nesp. krajnici diaľnice D1</i>			
		<i>(pre 4 portály a 1 ks D7 D36)</i>			
		<i>P1, P5, P6, P7, DZ 36</i>			
		<i>bežný dielc 5*36</i>	180,00		
		<i>koncový dielc 5*8</i>	40,00		
			220,00		
		<i>podľa situácie zvodidiel - výkresov č. 2.1 - 2.8</i>			
		<i>bet. jednostranné zvodidlá s voľným zámkom, úroveň</i>			
		<i>zachytenia N2, umiestnenie na nesp. krajnici diaľnice D1</i>			
		<i>(pre 3 portály)</i>			
		<i>P2, P3, P8</i>			
		<i>bežný dielc 3*36</i>	108,00		
		<i>koncový dielc 3*4</i>	12,00		
		<i>prechodový dielc na NH4 3*4</i>	12,00		
			132,00		
22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	320,00	
	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou	m	64,00	
		<i>digitálne zo situácie, úroveň zachytenia H1</i>			
		<i>nové nábehy v SDP pri osadzovaní portálov DZ</i>			

		8 (portály) * 2 (nábehy) * 4 (metre - dĺžka nábehov) =	64,00		
	2225036205	Doplňujúce konštrukcie, doplnenie zvodidiel oceľových	m	256,00	
		podľa schémy - výkres bet. zvodidiel č. 9			
		doplnenie stĺpkov a ostatného materiálu zvodidiel pred			
		miestami osadenia portálov DZ v str. del. páse			
		doplnenie na dĺžke 16 m na každej strane napojenia na bet.	256,00		
		zvodidlá = 8 (portály) * 16 m * 2			
		nové stĺpiky 8 (portály v SDP) * 26 (ks) = 208 ks			
		nové stĺpiky 3 (portály P2, P3, P8) * 13 (ks) = 39 ks			
22250454		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové	ks	48,00	
		stĺpiky, nádstavce na zvodidlá			
		smerové stĺpiky a nádstavce na zvodidlá každých 50 m			
		nádstavce v mieste portálov DZ			
		8 (portály) * (SDP - 2 + 2 ks. okraje 1 + 1 ks) =	48,00		
22251592		Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených	m2	5 200,00	
		plôch			
		vozovka (jestvujúce komunikácie počas výstavby) odhad	5 200,00		
45.25.32		Ostatné betonárske práce			
11010101		Základy, pásy z betónu prostého	m3	43,60	
	1101010107	Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)	m3	43,60	
		betónové prahy pod betónové zvodidlá			
		pre jeden portál v SDP: 0,20*0,25*1,5*58 = 4,35 m3			
		pre 8 portálov v SDP	34,80		
		pre jeden portál na krajnici: 0,20*0,25*1,0*22 = 1,1 m3			
		pre 8 portálov na krajnici	8,80		
			43,60		
CENA SPOLU BEZ DPH					252 709,37 €
DPH 20%					50 541,87 €
CENA SPOLU S DPH					303 251,24 €

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER	M. J.	MNOŽSTVO	Jedn.
KÓD KP	KÓD KPP					
45.00.00		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb				
	00020803	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaní dokumentácie (DVP a DSRS)	kpl		1,00	
	0002080301	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaní dokumentácie, dokumentácia na vykonanie prac (DVP)	kpl		1,00	
	0002080302	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaní dokumentácie, dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl		1,00	
45.11.11		Demolačné práce				
	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks		192,00	
		Odstránenie dišt. plechov ocel. zvodidiel v SDP 8 (portály) * 2 (na oboch koncoch prerušenia zvodidiel) * (16 m (dĺžka) a 2 m) = 8 * 2 * 8	128,00			
		Odstránenie stĺpkov ocel. zvodidiel v SDP 8 (portály) * 2 (na oboch koncoch prerušenia zvodidiel) * (16 m (dĺžka) a 4 m) = 8 * 2 * 4	64,00			
			192,00			
	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m		492,00	
		odstránenie jestvujúcich obojstranných zvodidiel v SDP v mieste budovania portálov DZ 8 (portály) * 52 m (dĺžka)	416,00			
		odstránenie jednostranných oceľových zvodidiel v mieste budovania portálov DZ na krajnici				
		P2	44,00			
		P3	12,00			
		P8	20,00			
			76,00			
	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks		48,00	
		smerové stĺpiky 8 (portály) * (SDP - 2 + 2 ks okraje 1 + 1 ks) =	48,00			
	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t		23,07	
	0508020003	Doprava vyburaných hmôt vodorovná, nad 1 km			23,07	
		smerové stĺpiky (48*0 01)	0,48			
		ocel. zvodidlá (492*0 042)	20,67			
		stĺpiky oceľových zvodidiel (64*0 020)	1,28			
		dištančné plechy (128*0 005)	0,64			
			23,07			
45.11.24		Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3		1 224,00	
	0102020007	Odkopávky s prekopávky nezapažené tr. horniny 1-4	m3		1 224,00	
		(digitálne z priečnych rezov, planimetrom) vykopy pre výmenu str. deliaceho pásu a nespevnenej krajnice z dôvodu ich neúnosnosti v SDP 8* (2,00 m2 * 60 m) na krajnici 8* (0,75 m2 * 44)	960,00			
			264,00			
			1224,00			
	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3		1 207,04	
	0104020202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných	m3		1 207,04	
		dosypávka stredného deliaceho pásu v mieste osadenia betónových zvodidiel				
		ŠD (32-63) 1 055 m * 60 m * 8	506,40			
		ŠD (0-4) 0,115 m2 * 60 m * 8	55,20			
		Zásyp SDP medzi prázdami (0,8*60-4,5)*8	348,00			

Doprastav

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka č. 581/B

Reg. značka:
V Bratislave dňa:

Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva,

ktorým sa v zmysle § 15 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a Smernice generálneho riaditeľa č. 9/2012
„Podpisový poriadok spoločnosti Doprastav, a. s.“ v znení Doplnku č. 1

preukazuje oprávnenie zamestnanca

Titul, meno, priezvisko: **Ing. Marián Ďurčo**
Narodený:
Trvalé bydlisko:
Funkcia:

konat' a podpisovať v mene spoločnosti Doprastav, a. s.

vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ním riadenej organizačnej jednotky Doprastav, a. s.
Závod Prefa, Drieňová 31, 821 01 Bratislava,

konkrétne:

1. samostatne, bez predchádzajúceho schválenia iným organizačným útvarom spoločnosti Doprastav, a.s. podpisovať záznamy na zabezpečenie správy majetku¹ spoločnosti Doprastav, a. s. zverného Závodu Prefa, práv a povinností týkajúcich sa zamestnancov Závodu Prefa a ostatných činností týkajúcich sa Závodu Prefa:

- 1.1. zmluvy na užívanie (nájom, výpožička, vecné bremená) vlastného dlhodobého majetku hnutelného,
- 1.2. zmluvy na predaj zásob do limitu 10 tis. € (vrátane) bez DPH,
- 1.3. zmluvy na obstaranie nestrategických stavebných materiálov a tovarov
- 1.4. zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky s podzhotoviteľmi (okrem zákaziek celofiremného významu),
- 1.5. zmluvy o dielo s podzhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu v SR a pre zákazky závodové do limitu 100 tis. € (vrátane) bez DPH,
- 1.6. zmluvy o dielo v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre závodové zákazky , ak je predpokladané hodnota zákazky do 500 tis. € (vrátane) bez DPH,

¹ v texte označený ako „vlastné nehnuteľnosti“ alebo „vlastný dlhodobý majetok hnutelný“

- 1.7. objednávky a zmluvy na nákup krátkodobého hmotného majetku (mimo hardvér) do 1700 € bez DPH,
- 1.8. zmluvy na predaj a montáž prefabrikátov na území Slovenskej republiky a do zahraničia,
- 1.9. zmluvy na predaj a montáž oceľových konštrukcií na území Slovenskej republiky a do zahraničia,
- 1.10. zmluvy na predaj a montáž predpínacích technológií na území Slovenskej republiky a do zahraničia,
- 1.11. zmluvy/ objednávky na nasledujúce služby:
 - na metrológiu (kalibrácia/overovanie meradiel),
 - v rámci realizácie stavebnej zákazky na odber elektrickej energie a plynu, na dodávku vôd a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou, na zabezpečenie zneškodnenia odpadov,
 - na činnosti preukazovania zhody stavebných výrobkov vyrábaných v spoločnosti Doprastav, a. s. ako sú zmluva o technickom osvedčovaní, zmluva o certifikácii výrobku, zmluva o certifikácii vnútropodnikovej kontroly, zmluva o počiatočnej skúške typu,
 - o poskytovaní služby ochrany majetku spoločnosti Doprastav, a. s.,
 - o poskytovaní služieb ako sú dodávka pitnej vody, odvádzanie zrážkových vôd, odvoz odpadov, odber tepla, dodávka plynu, dodávka elektriny,
 - servisné zmluvy, záručné a pozáručné servisy, revízie technických zariadení,
 - na činnosti v oblasti BOZP, OPP a OŽP.

2. samostatne, s predchádzajúcim schválením organizačného útvaru uvedeného v príslušnej časti týchto podpisových oprávnení:

- 2.1. zmluvy na predaj dlhodobého hmotného majetku hnutelného
po schválení generálnym riaditeľom
- 2.2. zmluvy na predaj zásob nad limit 10 tis. € bez DPH
po schválení výrobnotechnickým riaditeľom
- 2.3. zmluvy na užívanie (nájom, výpožička, vecné bremená) cudzích nehnuteľností
po schválení generálnym riaditeľom
- 2.4. zmluvy na užívanie (nájom, výpožička, vecné bremená) vlastných nehnuteľností na dobu určitú do 1 roka (vrátane) na organizačnej jednotke Závod Prefa
po schválení generálnym riaditeľom
- 2.5. zmluvy o dielo v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre závodové zákazky v SR, ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 500 tis. € bez DPH
po schválení obchodným riaditeľom

- 2.6. zmluvy o dielo s podzhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu v SR a pre zákazky závodové nad limit 100 tis. € bez DPH
po schválení výrobnou – technickým riaditeľom
 - 2.7. pracovné zmluvy, ich zmeny a skončenie, ak ide o zamestnancov ním riadenej organizačnej jednotky
po schválení námestníkom alebo vedúcim úseku nadriadeným zamestnancovi, ktorého sa právny úkon týka
 - 2.8. zmluvy o mzde, ak ide o zamestnancov ním riadenej organizačnej jednotky
po schválení námestníkom alebo vedúcim úseku nadriadeným zamestnancovi, ktorého sa právny úkon týka
 - 2.9. manažérske zmluvy vedúcich projektov OJ a vedúcich stredísk OJ, ak je zmluvná cena diela vyššia ako 800 tis. EUR bez DPH
po schválení generálnym riaditeľom
 - 2.10. dohody so zamestnancami (napr. dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o zrážke zo mzdy, dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, dohoda o pracovnej pohotovosti, dohoda o práci nadčas), ak ide o zamestnancov ním riadenej organizačnej jednotky
po schválení námestníkom alebo vedúcim úseku nadriadeným zamestnancovi, ktorého sa právny úkon týka
 - 2.11. dohody o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak ide o zamestnanca ním riadenej organizačnej jednotky
po schválení námestníkom alebo vedúcim úseku nadriadeným zamestnancovi, ktorého sa právny úkon týka
3. za účelom získania, koordinácie a riadenia realizácie stavebných zákaziek a stavebných projektov samostatne podpisovať záznamy na zabezpečenie, nasledujúcich práv a povinností týkajúcich sa zamestnancov Závodu Prefa, majetku v správe Závodu Prefa a ostatných činností Závodu Prefa, okrem záznamov uvedených v Prílohe číslo 1 Smernice GeR č. 9/2012 „Podpisový poriadok spoločnosti Doprastav, a. s.“, ktoré podpisujú dvaja členovia Predstavenstva:
- 3.1 styk s orgánmi štátnej správy, s orgánmi samosprávy, s orgánmi Policajného zboru SR,
 - 3.2 colno-deklaračné služby,
 - 3.3 prieskum trhu a spracovanie ponuky pre Závodové zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1 a 2 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.
 - 3.4 príprava a realizácia stavebnej zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1 a 2 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva
 - 3.6. uplatňovanie finančných nárokov na investorov a ostatných odberateľov

4. Ak nie je v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán spoločnosti Doprastav, a. s.
5. Na účely tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a. s. alebo ktorá bola spoločnosti Doprastav, a. s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania.
6. Toto Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť **dňom 1. december 2012** a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie riaditeľa Závodu Prefa, ako splnomocneného zamestnanca organizačnej jednotky spoločnosti Doprastav, a. s., pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo zrušené.

V Bratislave, dňa

Ing. Jura ~~Andri~~ ^{Andri}rovič
člen predstavenstva

Ing. Ján Zá ~~radnik~~ ^{radnik}
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa

Prevzal:

.....
Ing. Marián Ďurčo



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčením pravosť podpisu: **Ing. Juraj Andrevič**, dátum narodenia _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prídenný podpisu poradové číslo _____

Bratislava 2 dňa _____

.....
Nad'a ~~Flasch~~ ~~hackerová~~
pracovník poverený notárom
JUDr. Dagmar Ravlukovou
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčením pravosť podpisu: **Ing. Ján Záhradník**, dátum narodenia _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prídenný podpisu poradové číslo _____

Bratislava 2 dňa _____

.....
Nad'a ~~Flasch~~ ~~hackerová~~
pracovník poverený notárom
JUDr. Dagmar Ravlukovou
so sídlom v Bratislave



Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúca sa z ____ listov (hárkov).
Ide o opis úplný (čiastočný), boli na nej vykonané tieto
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky:

Na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Bratislave dňa

Vykonaním legalizácie alebo
vidimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny

Alica Kováčiková
pracovník poverený notárom
JUDr. Dagmar Kavlukovou
so sídlom v Bratislave

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúca sa z ____ listov (hárkov).
Ide o opis úplný (čiastočný), boli na nej vykonané tieto
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky:

Na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Bratislave dňa

Vykonaním legalizácie alebo
vidimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny

Alica Kováčiková
pracovník poverený notárom
JUDr. Dagmar Kavlukovou
so sídlom v Bratislave
