

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Sídlo: Duklianska 1, 080 04 Prešov
Štatutárny orgán: RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK24 8180 0000 0070 0051 3705

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy; 0907/973274; rusinkovahedviga@spspo.sk;

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy; 0907/973274; rusinkovahedviga@spspo.sk;

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: ZOYTEC s.r.o.
Sídlo: Okružná 3032/33, Prešov 080 01
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
Zapísaná v: ORSR oddiel sro, vložka č. 42354/P
IČO: 53789059
DIČ: 2121514241
IČ DPH: SK2121514241
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN, SWIFT: SK44 1100 0000 0029 4612 0475, TATRSKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): ... Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): ... Maroš Zelenák, MBA

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

- 2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov – stavebné práce“, zadávaním zákazky postupom s nízkou hodnotou, vyhlásenom vo Vestníku č. 19/2024 zo dňa 26. 01. 2024 pod značkou 2393-WNP. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 2.3 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných a iných zdrojov získaných na základe poskytnutia prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PPM“) ak budú v rámci príslušnej výzvy a schválenej žiadosti na daný účel zabezpečenia financovania predmetu zmluvy schválené a poskytnuté.

Článok 3

Predmet a doba trvania Zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie „Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov – stavebné práce“. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“), v súlade s ktorými bude realizovaný. Projektovú dokumentáciu spracoval **A – Club, s.r.o., Lažany 49, 082 32 PO**.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa v tejto Zmluve dohodnutých podmienok vrátane jej príloh v požadovanom množstve, kvalite, špecifikácií a cenách, a to najmä:
- podľa priestorovej a technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1;
 - podľa technickej špecifikácie, množstiev a cien uvedených v Prílohe č. 2;
 - podľa časového plnenia uvedeného v prílohe č. 3;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác;
 - priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela;
 - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela;
 - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.

Článok 4 **Kvalita predmetu Zmluvy**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré upravuje táto Zmluva a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách Zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 5 **Cena a platobné podmienky**

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami –

ocenení výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 101 010,10 EUR

Sadzba DPH: 10 %

DPH: 10 101,01 EUR

Celková cena Diela s DPH: 111 111,11 EUR

Celková cena Diela s DPH slovom: jedenstojedenašťtisistojedenašťeuroajedenáštcentov.

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

5.4 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
- dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyše, vrátane ich ocenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve; za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 2 – Rozpočet, ale ktorých potreba realizácie vyplýva z Prílohy č. 1 – Projektová dokumentácia a zároveň ich bolo možné pri obhliadke staveniska v rámci procesu verejného obstarávania identifikovať;
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela, pričom uplatnenie požiadavky Objednávateľa na práce menej je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa; všetky oprávnené vzniknuté a preukázateľné náklady Zhotoviteľa na materiál a práce, ktorých sa požiadavka Objednávateľa na zníženie rozsahu Diela týka, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyše prác, pričom spôsob určenia ceny navyše prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:

5.8.1 Zhotoviteľ ocení navyše práce nasledovne:

- položky navyše prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek uvedených v Prílohe č. 2;
- položky navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ nesmie vykonať v tomto programe zmeny alebo úpravy kalkulačného vzorca, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej jednotkovej ceny oproti základnému nastaveniu, môže však poskytnúť Objednávateľovi zľavu z tejto ceny. Zhotoviteľ je povinný v prípade požiadavky Objednávateľa priložiť ku každej položke navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy výpočet jednotlivých množstiev.

- 5.8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa jemu momentálne dostupných informácií v každom štádiu realizácie Diela včas identifikovať potrebu naviac prác a upozorniť na ich vznik Objednávateľa. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ocenenie Objednávateľom požadovaných naviac prác podľa popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priložiť dôvodovú správu a aktualizovaný harmonogram s ich zapracovaním. Výskyt potreby naviac prác neoprávňuje Zhotoviteľa k tomu, aby pozastavil práce ostatných častiach Diela, ktoré so vznikom týchto naviac prác nesúvisia.
- 5.8.3 Zhotoviteľ do desať (10) dní od žiadosti Objednávateľa na naviac práce predloží ocenený výkaz výmer naviac prác na odsúhlasenie ceny naviac prác Objednávateľovi.
- 5.8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným oceneným výkazom výmer, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre naviac práce uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje po odsúhlasení naviac prác Objednávateľom uzavrieť dodatok k Zmluve na tieto naviac práce. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac.
- 5.9 V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa jednotkových cien položiek týchto menej prác uvedených v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle Zmluvy.
- 5.10 Naviac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov k Zmluve, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, príslušnými podmienkami zmluvy o PPM a podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.12 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na vytýčenie parciel riešeného územia, podzemných vedení, zariadenia a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, stráženia staveniska ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, temperovanie objektu a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná, a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.

- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou jednej konečnej faktúry, vystavenej po ukončení celého Diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi podľa Článok 11. Ak materiál alebo iné výrobky sú rozpočtované oddelene v špecifikácii, možno ich zahrnúť do faktúry až po ich zabudovaní (montáži). Prílohou faktúry budú podrobné súpis vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.18 Konečná faktúra je splatná do šesťdesiat (60) dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.19 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
 - termín splatnosti faktúry;
 - forma úhrady;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude:

- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom Objednávateľa a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane potvrdený podpisom a pečiatkou Zmluvných strán a stavebného dozoru Objednávateľa;
- súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.20 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná odchylne od projektovej dokumentácie, dojednaných zmluvných podmienok a odsúhlasených navyše prác i menej prác bez písomného súhlasu Objednávateľa, Objednávateľ neuhradí. Na výzvu Objednávateľa tieto práce Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, môže tak urobiť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok 6

Výkonová záruka a garančná zábezpeka

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a

prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

- vinkulácie finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zloženia finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovej záruky vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dobu platnosti výkonovej záruky tak, aby pokrývala celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskončila skôr než jeden mesiac po dohodnutom termíne dokončenia Diela, a dobu platnosti garančnej zábezpeky tak, aby pokrývala celé obdobie záručnej doby. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomný doklad o zriadení výkonovej záruky a garančnej zábezpeky.
- 6.3 V prípade, ak Objednávateľ prevezme dokončené Dielo podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela, Zhotoviteľovi bude výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikla vynaložením nákladov zapríčinených konaním/nekonaním Zhotoviteľa, kompenzovať v plnej výške z výkonovej záruky na náklady Zhotoviteľa. V prípade započítania je Zhotoviteľ povinný výkonovú záruku do pätnásť (15) dní navýšiť na pôvodnú výšku. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa výkonová záruka prepadá v prospech Objednávateľa.
- 6.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ kompenzovať v plnej výške z garančnej zábezpeky vo výške 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH). V prípade započítania je Zhotoviteľ povinný garančnú zábezpeku do pätnásť (15) dní navýšiť na pôvodnú výšku. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí poslednej záručnej doby.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok 7

Lehota a čas plnenia Zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do 6 mesiacov od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej

výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.

- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko najneskôr po ukončení administratívnej finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania, v rámci ktorej vykonávateľ pomoci neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. V prípade, že vykonávateľ pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodujúci je dátum písomnej akceptácie návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Omeškanie zhotoviteľa s postupom prác podľa harmonogramu, z dôvodov na jeho strane, v trvaní viac ako sedem (7) dní bude považované za podstatné porušenie Zmluvy podľa bodu 17.4.6.
- 7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený a to v súvislosti od schopnosti Objednávateľa financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky. Objednávateľ môže určiť, že po odovzdaní a prevzatí staveniska budú realizované práce v hodnote zodpovedajúcej výške finančných zdrojov, ktoré má v danom čase Objednávateľ k dispozícii, a ďalšie práce začne vykonávať a realizovať Zhotoviteľ až na základe samostatnej výzvy Objednávateľa. Prerušenie prác a z vyššie uvedeného dôvodu, nedodržanie pôvodne odsúhlaseného harmonogramu a lehoty podľa bodu 7.1 sa nepovažuje za omeškanie Zhotoviteľa s plnením predmetu zákazky.
- 7.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci alebo dôvodov uvedených v bode 7.4, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak omeškanie Zhotoviteľa neohrozí plnenie záväzkov Objednávateľa voči ďalším zmluvným partnerom. Ak by omeškanie Zhotoviteľa ohrozilo plnenie záväzkov Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si sankcie a od Zmluvy odstúpiť.
- 7.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce ak nie je v omeškaní v prípade vyššej moci podľa bodu 16.10, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo vytvoriť prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil alebo predpokladal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy, z dôvodov na nie strane Zhotoviteľa. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 7.7 O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy pominuli dôvody prerušenia.
- 7.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa alebo

z dôvodu odoslaného odstúpenia od Zmluvy, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela, najmä z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku alebo z dôvodov uvedených v bode 7.4 tejto zmluvy. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. Objednávateľ môže zaplatiť Zhotoviteľovi aj objektívne preukázateľne vzniknuté náklady Zhotoviteľovi týmto prerušením, na ktoré Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa ihneď po prerušení prác v zmysle tohto bodu.

Článok 8

Miesto plnenia predmetu Zmluvy

- 8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
- SPŠ strojnícka Prešov, Duklianska 1, 080 04 Prešov;

Článok 9

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy a náhradu škody.
- 9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za štrnásť (14) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Plánované kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 9.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.2. tejto zmluvy.
- 9.1.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.1.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu z personálu Zhotoviteľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorá spôsobuje verejné pohoršenie, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Takto odvolaná osoba na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.

- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a udržiavať ju v platnosti po celú dobu vykonávania Diela na stavebno-montážne poistenie vrátane zodpovednosti za akúkoľvek škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo bez DPH. Platnosť poistnej zmluvy Zhotoviteľ preukáže odovzdaním jej overenej kópie Objednávateľovi najneskôr jeden (1) deň pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska. Platnosť poistnej zmluvy môže Zhotoviteľ preukázať aj predložením potvrdenia o poistení resp. poistného certifikátu, avšak musí z nich byť jasný rozsah poistenia.
- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo subdodávatelia a ich pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté, aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré budú zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je vopred povinný preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušnou dokumentáciou.
- 9.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 9.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 9.6.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- 9.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku škôd na majetku Objednávateľa, a aby bol Objednávateľ, prípadne ním zriadená organizácia obmedzovaná vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie dodávateľskú dokumentáciu, ktorá nie je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Objednávateľovi najmenej desať (10) pracovných dní pred začatím prác na časti Diela, ktorého sa uvedená dokumentácia týka. Vykonávanie prác bez odsúhlasenia dodávateľskej dokumentácie nezakladá nárok Zhotoviteľa na ich fakturáciu a preplatenie.
- 9.9 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 9.10 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 9.11 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 9.12 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú každú zmenu použitia materiálu špecifikovanom v prílohách Zmluvy za alternatívu stavebným dozorom Objednávateľa, aj v prípade ak bude v Prílohe č. 1 uvedené, že materiál je možné zameniť za alternatívu.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, kedy plánuje pristúpiť k realizácii stavebných objektov alebo ich častí, pri ktorých sa vyžaduje alebo je nevyhnutná súčinnosť tretích osôb (dodávateľov energií, správcov distribučných sietí a pod.), ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, a ktorých súčinnosť má zabezpečiť Objednávateľ. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, nezabezpečenie súčinnosti zo strany Objednávateľa sa nepovažuje za porušenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Článok 10

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 10.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru:
- Titul, meno, priezvisko: Michal Dzugas
Evidenčné číslo: 08390; Kategória: Pozemné stavby; Podkategória: 10
- 10.2 Stavebný dozor Objednávateľa je splnomocnený Objednávateľom na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej s Objednávateľom, a je oprávnený najmä osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, ich kvalitu, odsúhlasovať zápisy prác Zhotoviteľa, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a pravidelne vyberať kópie určené pre Objednávateľa, organizovať plánované kontroly, informovať Objednávateľa o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Maroš Zelenák, MBA osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 12010*10*
- 10.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. V prípade, že Zhotoviteľ vymení povereného stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinný o tom písomne informovať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak poverený stavbyvedúci nemôže byť na stavbe, Zhotoviteľ musí informovať Objednávateľa o jeho zastupovaní a určiť zodpovednú osobu minimálne jeden (1) pracovný deň vopred.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu povereného stavbyvedúceho, s udaním dôvodu, za iného stavbyvedúceho s osvedčením odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať a výmenu vykonať najneskôr do desiatich (10) pracovných dní.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a všetkých skutočnosti rozhodujúcich pre plnenie Zmluvy po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podľa pokynov stavebného dozoru Objednávateľa, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do piatich (5) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie okolností, ktoré nastali za dôležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 10.7 Zhotoviteľ prostredníctvom povereného stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela, stavy meračov energií pri prevzatí a odovzdaní staveniska a pri prevzatí a odovzdaní Diela.
- 10.8 Stavebný denník vedie Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Stavebný denník musí byť na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prístupný Objednávateľovi alebo stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník musí mať vypísaný základný list potvrdený stavebným dozorm Objednávateľa a očíslované všetky strany kde sa zapisujú záznamy. V prípade viacerých stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s uvedeným dátumom prvého a posledného zápisu. Zápisy v stavebnom denníku musia nasledovať chronologicky a medzi jednotlivými zápsmi nesmú byť medzery väčšie ako 2 prázdne riadky. Každý záznam Zhotoviteľa musí byť podpísaný povereným stavbyvedúcim. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Dielo/časť diela sa považuje za spôsobilé k odovzdaniu po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po zhotovení Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prílohami a

odsúhlasenými zmenami, pokiaľ sú práce na Diele ukončené v požadovanej kvalite, v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termíne a bez väd a nedorobkov.

- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí.
- 11.3 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na obhliadku stavby za účelom začatia preberacieho konania minimálne dvadsať (20) pracovných dní pred termínom Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela/časti Diela; termín konania obhliadky a termín Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela/časti Diela vo výzve navrhne Zhotoviteľ, avšak termín konania obhliadky musí byť minimálne pätnásť (15) dní pred termínom Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela/časti Diela; ak Objednávateľ s navrhnutými termínmi nesúhlasí, termíny si Zmluvné strany dohodnú. Obhliadky stavby za účelom začatia preberacieho konania sa zúčastnia poverení zástupcovia Zmluvných strán, stavebný dozor Objednávateľa a referent Oddelenia investícií Úradu PSK, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu, a v rámci tejto obhliadky vykonajú podrobnú prehliadku Diela/časti Diela, pri ktorej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác. Výstupom z tejto obhliadky bude Zápisnica zo začiatku preberacieho konania, v ktorej budú spísané všetky zistené vady a nedorobky na Diele/časti Diela, ktorú pripraví stavebný dozor Objednávateľa. Všetky zistené vady a nedorobky musia byť odstránené do Protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizácie diela uvedená v bode 7.1 Zmluvy znením tohto bodu nie je dotknutá.
- 11.4 Zhotoviteľ minimálne päť (5) pracovných dní pred dohodnutým termínom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela/časti Diela, podľa predchádzajúceho bodu, doručí Objednávateľovi dokumentáciu podľa bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.
- 11.5 Odovzdanie Diela/časti diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.6 Objednávateľ prevezme Dielo/časť Diela časť realizovanú v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor Objednávateľa.
 - 11.6.1 Objednávateľ prevezme Dielo/časť Diela len v prípade, že bude zhotovené bez väd a nedorobkov, podľa projektovej dokumentácie, odovzdaných podkladov, odsúhlasených zmien, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
 - 11.6.2 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä:
 - Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka;
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
 - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - Geodetické zameranie nových stavebných objektov a existujúcich stavebných objektov ak došlo počas realizácie ku zmene zastavanej plochy,
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela, 6 ks vyhotovení v tlačenej forme, 1 ks elektronicky vo formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie;
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.
 - 11.6.3 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo/časť diela za riadne

- prípravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odmietnuť prevziať Dielo/časť Diela.
- 11.6.4 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo/časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo/časť Diela neprevziať.
- 11.7 Za deň prevzatia Diela/časti Diela sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozorom Objednávateľa a referentom Oddelenia investícií Úradu PSK, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu. Najneskôr pri tomto preberaní budú odovzdané aj:
- stavebný denník resp. stavebné denníky;
 - iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela, najmä doklady nevyhnutné ku kolaudácii stavby a jej riadnemu užívaniu.
- 11.8 Objednávateľ si môže u Zhotoviteľa uplatniť aj odstránenie väd a nedorobkov Diela/časti Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednávateľom bezodkladne po protokolárnom prevzatí Diela/časti Diela Objednávateľom a Zhotoviteľ má povinnosť ich odstrániť.
- 11.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady Diela/časti Diela, podliehajúce záruke (Článok 12) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 11.10 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednávateľovi. Vlastníkom nehnuteľností v prípade jej rekonštrukcie je po celú dobu Objednávateľ.
- 11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k dielu/časti diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými normami vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác, materiálov, zariadení a výrobkov, na ktoré bola dodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. Na zabudované výrobky a príslušenstvo dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorého výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov.
- 12.3 Plnenie má vady a nedorobky ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
 - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 12.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení oznámením o vadách, najneskôr do päť (5) pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie pre počítanie dodržania lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 12.6 Zhotoviteľ, ak považuje za potrebné, po doručení oznámenia Objednávateľa o vadách vykoná obhliadku reklamovaných väd, z ktorej sa spíše Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ nevykoná obhliadku, reklamáciu nemôže odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľa o vadách, a navrhnúť termín odstránenia reklamovaných väd, s ktorým si Objednávateľ vyhradzuje právo nesúhlasiť, ak sa mu nezdá primeraný. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí k oznámeniu Objednávateľa o vadách do päť (5) pracovných dní platí, že reklamáciu uznáva a Objednávateľ mu určí termín odstránenia reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy, a to v termíne dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termíne, ktorý mu stanovil Objednávateľ, ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu Objednávateľa o vadách. V prípade ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu väd do päť (5) pracovných dní po uplynutí dohodnutej doby, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu; všetky takto vzniknuté náklady je Objednávateľ oprávnený si započítať z garančnej zábezpeky.
- 12.7 V prípade uplatnenia reklamácie oznámením Objednávateľa o vadách, v ktorom bude uvedené, že dané vady spôsobujú havarijný stav, je Zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním bezodkladne po doručení tohto oznámenia Objednávateľom emailom.
- 12.8 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni protokolárneho odovzdania a prevzatia kompletného Diela/časti Diela bez väd a nedorobkov podľa Článok 11 Zmluvy. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 12.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve s jej prílohami a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré zodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam.
- 12.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 12.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo použitím iného materiálu, ako je špecifikovaný v prílohách Zmluvy, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.13 Záručná doba na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania Protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 12.14 V poslednom mesiaci pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie prevádzky počas záručnej doby a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 12.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou alebo obsluhou.

- 12.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia napr. autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv.

Článok 13

Zodpovednosť za škodu

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na huteľnom/nehuteľnom majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 13.4 V prípade ak plnením predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodržaním termínu plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľom z dôvodov na jeho strane alebo odstúpením Zhotoviteľa od Zmluvy, vznikne Objednávateľovi škoda z titulu neposkytnutia nenávratného finančného príspevku poskytovateľom pomoci alebo udelenia korekcie znížením výšky nenávratného finančného príspevku alebo z neoprávnenia časti oprávnených výdavkov, Zhotoviteľ zodpovedá za túto škodu v jej plnej výške a je povinný ju Objednávateľovi nahradiť.

Článok 14

Zabezpečenie záväzkov

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- Za nezačatie/neukončenie realizácie stavebných prác v termíne podľa harmonogramu prác Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela/časti Diela Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd spísaných v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v záručnej dobe v dohodnutom termíne odstránenia resp. Objednávateľom určenom termíne odstránenia, v prípade ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby odstránenia väd.
 - Za nevyjadrenie sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách podľa bodu 12.5 Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH jednorazovo.
 - Za omeškanie s vypratáním zariadenia staveniska, zvyšného materiálu a pod. viac ako pätnásť (15) dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo

za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sankcia Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 1 000,00 EUR.
- Za porušenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť diela zhotoveného subdodávateľom.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2 a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa pododsekov bodu 17.4, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane.

14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú sankciu a na náhradu škody.

14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok 15

Osobitné ustanovenia

15.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú.

15.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj len ako "Skupina dodávateľov"), vzťahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen Skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena Skupiny dodávateľov.

15.3 Konflikt záujmov.

15.3.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

15.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho pracovníci a subdodávatelia

nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho pracovníka a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.

- 15.3.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez zbytočného odkladu.
- 15.3.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 15.4 Subdodávateľa.
 - 15.4.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 4 Zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ Zhotoviteľa spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“); bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne desať (10) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa; spolu s Návrhom na zmenu subdodávateľa poskytne Objednávateľovi všetky údaje v rozsahu podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy, dátum nástupu a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do desať (10) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávať v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sám.
- 15.5 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu.
 - 15.5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
 - 15.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
 - 15.5.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.
 - 15.5.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody

spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od Objednávateľa. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 15.5.1 až 15.5.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

15.6 Register partnerov verejného sektora.

15.6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že:

- bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
- nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaje zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
- nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
- po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.

15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie nevyplyva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

15.6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR. Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve nevyhoví, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako.

Článok 16 Ostatné ustanovenia

- 16.1 Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Ak bola písomnosť zasielaná poštou, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne považuje sa za doručenie dňom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď si ju adresát neprečítal.
- 16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmiernu a dohode, spory budú riešené príslušným súdom.
- 16.3 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku k Zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní. Znenie tohto bodu sa neuplatní pri zmene stavebného dozoru objednávateľa uvedeného v bode 10.1 Zmluvy, stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.3 Zmluvy, subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 Zmluvy a identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v Článok 1.
- 16.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objedávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj faktúry vyplývajúcej z tejto Zmluvy.
- 16.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela stripiť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 16.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú: a) Objedávateľ a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly, h) Osoby poverené na výkon kontroly

Objednávateľom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.

- 16.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.
- 16.10 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy.

Článok 17

Ukončenie zmluvného vzťahu

- 17.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastane splnením podmienok uvedených v bode 3.1 Zmluvy.
- 17.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 17.8 tohto článku Zmluvy.
- 17.3 Od Zmluvy môže ktorákkoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy aj v prípadoch nepodstatného porušenia podľa bodu 17.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od Zmluvy v prípade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v požadovanej výške vykonávateľom pomoci alebo v prípade neakceptovania návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania.
- 17.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- 17.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- 17.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- 17.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
- 17.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- 17.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- 17.4.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní, z dôvodov na jeho strane, voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dní;
- 17.4.7 neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.2 Zmluvy;
- 17.4.8 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.1;
- 17.4.9 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy, najmä porušenie bodu 9.2.3, 9.8, 15.4.1, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1, 16.7 a pod.
- 17.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného

porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 17.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 17.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 17.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
 - 17.8.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa;
 - 17.8.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy;
 - 17.8.3 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku 5 tejto Zmluvy.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2 Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
- 18.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
 - Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia;
 - Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer;
 - Príloha č. 3 – Časový harmonogram;
 - Príloha č. 4 – Subdodávateľia.
 - Príloha č. 5 – Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov.
- 18.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 18.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 18.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 18.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 18.9 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.
- 18.10 O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V, dňa

V Prešove, dňa: 20. 06. 2024

.....
RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy
riaditeľka školy

.....
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
konateľ ZOYTEC s.r.o.

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

DEBARIERIZÁCIA BUDOVY
SPŠ STROJNÍCKEJ,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV
OKR. PREŠOV, PARC. Č. 855/1,
855/2, K.Ú. PREŠOV

- A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
- B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
- C. SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
- D. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV
- E. ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY

OBJEDNÁVATEL : STREDNÁ PRIEMSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV, 080 04

MIESTO STAVBY : DUKLIANSKA 1, PREŠOV,
PARC. Č. 855/1, 855/2, K.Ú. PREŠOV

OKRES : PREŠOV

KRAJ : PREŠOVSKÝ

STUPEŇ : PROJEKT

DÁTUM : 07 / 2023

PROJEKTANT : A - Club, s.r.o.
LAŽANY 49, 082 32 PREŠOV
tel: 0903 855 641

DEBARIERIZÁCIA BUDOVY
SPŠ STROJNÍCKEJ,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV
OKR. PREŠOV, PARC. Č. 855/1,
855/2, K.Ú. PREŠOV

D. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

1 TECHNICKÁ SPRÁVA

- 2 LOKALITA A - EXISTUJÚCI STAV
- 3 LOKALITA B - EXISTUJÚCI STAV
- 4 LOKALITA C - EXISTUJÚCI STAV
- 5 LOKALITA D - EXISTUJÚCI STAV

- 6 LOKALITA A - NAVRHOVANÝ STAV
- 7 LOKALITA B - NAVRHOVANÝ STAV
- 8 LOKALITA C - NAVRHOVANÝ STAV
- 9 LOKALITA D - NAVRHOVANÝ STAV
- 10 VÝPIS DYERÍ - NAVRHOVANÝ STAV

OBJEDNÁVATEL : STREDNÁ PRIEMSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV, 080 04

MIESTO STAVBY : DUKLIANSKA 1, PREŠOV,
PARC. Č. 855/1, 855/2, K.Ú. PREŠOV

OKRES : PREŠOV


KRAJ : PREŠOVSKÝ

STUPEŇ : PROJEKT

DÁTUM : 07 / 2023

PROJEKTANT : A - Club, s.r.o.
LAŽANY 49, 082 32 PREŠOV
tel: 0903 855 641

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

AUTOR:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	A - Club, s.r.o. Lažany č.49, 082 32 Po Ateliér: Budovateľská 34 080 01 Prešov	
Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. V. Jačišin		
OKRES:	PREŠOV	MIESTO-OBEC: PREŠOV			
INVESTOR:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 080 04				
STAVBA:	Debarierizácia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov				
OBJEKT:	PARCELA ČÍSLO: 855/1, 855/2				
	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PREŠOV				
OBSAH VÝKRESU: SPRIEVODNÁ SPRÁVA				FORMÁT:	
				DÁTUM:	07 / 2023
				STUPEŇ PD:	PROJEKT
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	
				ČÍSLO KÓPIE:	
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	
				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
				A	

PROJEKT STAVBY

**Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1,
Prešov – projektová dokumentácia**

A – SPRIVODNÁ SPRÁVA

Obsah :

1. Identifikačné údaje
2. Základné údaje charakterizujúce prevádzku
3. Prehľad východiskových podkladov
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
7. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby
8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii
9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky
10. Celkové náklady stavby

1. Identifikačné údaje :

NÁZOV STAVBY : DEBARIERIZÁCIA SPŠ STROJNÍCKEJ,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV
– PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

OBJEDNÁVATEĽ : SPŠ STROJNÍCKA, DUKLIANSKA 1, PREŠOV

MIESTO STAVBY : BUDOVA SPŠ STROJNÍCKEJ,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV
KATASTER: PREŠOV
ČÍSLO PARCELY : KN C 855/1, 855/2

STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

DÁTUM: jún 2023

ZODP.PROJEKTANT :

Ing. Vojtech Jačišin,
reg. č.: 6004*A1
A-Club, s.r.o., Lažany 49
082 32 Prešov

Zoznam spracovateľov projektovej dokumentácie:**Zodpovedný projektant HIP :**

Ing. Vojtech Jačišin

Stavebné konštrukcie a architektúra:

Ing. Vojtech Jačišin

Ing. Peter Špak

Rozpočtové náklady stavby

Ing. Ľudmila Šariczká

2. Základné údaje charakterizujúcu stavbu a jej budúcu prevádzku

2.1 Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia

Územie

Dotknutý existujúci objekt pre navrhované úpravy spojené s debarierizáciou sa nachádza v meste Prešov na ulici Duklianska č. 1 v lokalite, ktorá je charakteristická blokovou uličnou zástavbou v katastrálnom území: Prešov, na parcele č. 855/1,855/2, . Dané územie môžeme charakterizovať ako rovinaté.

Parcela č. 855/1 je podľa druhu pozemku charakterizovaného v liste vlastníctva č. 12893 evidovaná ako Zastavaná plocha a nádvorie. Podľa spôsobu využitia je parcela č. 855/1 definovaná ako pozemok, na ktorom je postavená. nebytová. budova označená. súpisnom číslom.. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa tento pozemok nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti.

Parcela č. 855/2 je podľa druhu pozemku charakterizovaného v liste vlastníctva č. 12893 evidovaná ako Zastavaná plocha a nádvorie. Podľa spôsobu využitia je parcela č. 855/2 definovaná ako pozemok, na ktorom je postavená. nebytová. budova označená. súpisnom číslom. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa tento pozemok nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti.

Okolité pozemky sú zastavané resp. čiastočne zastavané . Zo severnej strany sa nachádza budova internátu a plocha zelene. Na východnej, južnej a západnej strane sú situované miestne spevnené cesty- ulice Duklianska, Levočská a Sabinovská .

Prístup k budove pre študentov je z južnej strany ul. Levočská. Objekt je existujúcimi prípojkami napojený na všetky inžinierske siete. A to plynovou prípojkou, NN elektrickou prípojkou , vodovodnou a kanalizačnou prípojkou .

Pri stavebných prácach je nutné dodržať podmienky stavované pre práce v ochranných pásmach jednotlivých sietí.

Predmetnou úpravu nedôjde k záberu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

Stavba

Architektonická a inžinierska príprava, ktorej výsledkom je spracovanie projektu pre realizáciu na stavbu:

„Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov – projektová dokumentácia
“ vyplynula z požiadavky objednávateľa.

Bezbariérové prostredie je jednou zo základných podmienok pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania.

Cieľom navrhovaných opatrení je maximálne možné priblíženie sa k takémuto stavu. Rozsah úprav bol zadefinovaný v základných požiadavkách zo strany objednávateľa. Jedná sa o osadenie šikmých schodiskových plosín a úpravu vstupných dverí do budovy .

Heslovité vymenovanie opatrení podľa lokalizácie polohy v objekte:

POLOHA A- NÁVRH DVOCH PRESKLENÝCH STENY V ZÁDVERÍ JEDNÉHO VSTUPU DO BUDOVY

POLOHA B- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.NP NA 4.NP

POLOHA C- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY NA VYROVNÁVACÍCH SCHODOCH NA 1.NP

POLOHA D- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.PP NA 3.NP

Opis existujúceho stavu budovy

Budova SPŠ má pavilóny s rôznym počtom podlaží a je čiastočne podpivničená, je prestrešená plochou strechou. V súčasnosti sú z južnej strany prevádzkovo riešené tri vstupy. Nami riešené opatrenia sú v budove školy v pavilóne s dvoma, so štyrmi nadzemnými a jedným podzemným podlažím a v časti s troma nadzemnými a jedným podzemným podlažím

Tri hlavné vstupy do budovy v priestore školy sú z južnej strany, z ulice Levočská. Cca 0,5 m výškový rozdiel medzi vonkajšou spevnenou plochou a podlahou 1.NP je prekonávaný vonkajšími schodiskovým stupňami a existujúcou vyrovnávacou rampou. Cez presklené steny zádveria s dvoma otváracími dvojkrídlovými dverami / rieši opatrenie v polohe č. "A"/ vstupujeme do priestoru- vestibulu, na ktorý nadväzuje riešené štvorpodlažné schodisko / vid' opatrenie v polohe č. "B"/. V budove školy na 1.NP je výškový rozdiel podláh riešený cez vnútorné vyrovnávacie schody / bezbariérovosť / rieši opatrenie v polohe č. "C"/. V pavilóne s laboratóriami s troma nadzemnými a jedným podzemným podlažím navrhujeme na vnútornom schodisku šikmú schodiskovú plošinu. / rieši opatrenie v polohe č. "D"/

Opis navrhovaných úprav

Ako bolo vyššie spomenuté bezbariérové prostredie je jednou zo základných podmienok pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania.

Cieľom navrhovaných opatrení je maximálne možné priblíženie sa k takémuto stavu. Rozsah úprav bol zadefinovaný v základných požiadavkách zo strany objednávateľa. Jedná sa o osadenie šikmých schodiskových plošín a úpravu vstupných dverí do budovy.

Heslovité vymenovanie opatrení podľa lokalizácie polohy v objekte:

POLOHA A- NÁVRH DVOCH PRESKLENÝCH STIEN V ZÁDVERÍ JEDNÉHO VSTUPU DO BUDOVY

Návrh vstupných dverí jedného zádveria si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Odstránenie existujúcich presklených stien (položka B1) a osadenie nových (položka D1 a D2) s jednými automatickými posuvnými teleskopickými dvojkrídlovými dverami

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný.

POLOHA B- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.NP NA 4.NP

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na prekonanie výškového rozdielu troch podlaží t.j. 1.NP-4.NP si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.
- Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný.

**POLOHA C- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY
NA VYROVNÁVACÍCH SCHODOCH NA 1.NP**

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na vyrovnávacích schodoch na 1.NP
na prekonanie 1,65 m výškového si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.
Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že
je v súčasnosti zrealizovaný.

POLOHA D- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.PP NA 3.NP

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na prekonanie výškového
rozdielu troch podlaží t.j. 1.PP-3.NP si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Skrátenie existujúceho schodiskového zábradlia (položka B2) podľa požiadavky
dodávateľa technického zariadenia.
- Demontáž a posunutie existujúcich vykurovacích telies na schodiskových
podestách podľa požiadavky dodávateľa technického zariadenia. (položka B3)
- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.
Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že
je v súčasnosti zrealizovaný.

2. Prehľad východiskových podkladov

- Kópia z katastrálnej mapy a listu vlastníctva
- Projektová dokumentácia – zameranie existujúceho stavu
- Komunikácia s objednávatelom+ rozsah prác stanovený v súťažných
podkladoch
- Príslušné normy STN, súvisiace predpisy
- Prospekty dodávateľov stavebných výrobkov

**4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty riešené v projektovej
dokumentácii pre realizáciu :**

Členenie stavby :

Skladba stavebných a inžinierskych objektov

SO Vlastný objekt

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície:

Nepredpokladáme vecné a časové väzby na okolitú zástavbu a súvisiace investície.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov:

SPŠ STROJNÍCKA, DUKLIANSKA 1, PREŠOV

7. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby:

Zahájenie realizácie stavby	určí objednávatel'
Ukončenie realizácie stavby	určí objednávatel'
Doba výstavby	určí objednávatel' a dodávateľ predbežne 3 mesiace

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii:

Stavbu nie je potrebné uvádzať do predčasného užívania a bude odovzdaná ako jeden celok. Vypratanie staveniska bude postupné, najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia stavby.

9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky:

Stavba bude uvedená do prevádzky ako jeden celok.

10. Celkové náklady stavby - predpokladané

Orientačné náklady celkom :
celkom : Budú určené na základe rozpočtu.

V Prešove, 07.2023

Vypracoval : Ing. Vojtech Jačišin

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

AUTOR:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	A - Club, s.r.o. Lažany č.49, 082 32 Po Ateliér: Budovateľská 34 080 01 Prešov		
Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. V. Jačišin			
OKRES:	PREŠOV	MIESTO-OBEC: PREŠOV		FORMÁT:		
INVESTOR:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 080 04			DÁTUM:	07 / 2023	
STAVBA:	Debarierizácia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov			STUPEŇ PD:	PROJEKT	
OBJEKT:				PARCELA ČÍSLO: 855/1, 855/2 KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PREŠOV	ČÍSLO ZÁKAZKY:	
OBSAH VÝKRESU:	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA			ČÍSLO KÓPIE:		
				ARCHÍVNE ČÍSLO:		
				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:	
				B		

PROJEKT STAVBY

**Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1,
Prešov – projektová dokumentácia**

B: SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

NÁZOV STAVBY : DEBARIERIZÁCIA SPŠ STROJNÍCKEJ,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV
– PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

OBJEDNÁVATEL: SPŠ STROJNÍCKA, DUKLIANSKA 1, PREŠOV

MIESTO STAVBY : BUDOVA SPŠ STROJNÍCKEJ,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV
KATASTER: PREŠOV
ČÍSLO PARCELY : KN C 855/1, 855/2

OKRES : PREŠOV

KRAJ : PREŠOVSKÝ

STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

**ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT :** Ing. Vojtech Jačišin, reg. č.: 6004*A1
A-Club, s.r.o.
Lažany 49
082 32 Prešov

VYPRACOVAL: Ing. Vojtech Jačišin

Zoznam spracovateľov projektovej dokumentácie:

Zodpovedný projektant HIP :	Ing. Vojtech Jačišin
Stavebné konštrukcie a architektúra:	Ing. Vojtech Jačišin
	Ing. Peter Špak
Rozpočtové náklady stavby	Ing. Ľudmila Šariczká

DÁTUM : 07 / 2023

Obsah:

- 1. Charakteristika územia stavby**
 - 1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska**
 - 1.2 Údaje o prieskumoch**
 - 1.3 Použité mapové a geodetické podklady**
 - 1.4 Príprava pre výstavbu**
- 2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie**
- 3. Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie**
- 4. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na poľnohospodársku pôdu**
- 5. Starostlivosť o bezpečnosť práce**
- 6. Požiadavky civilnej ochrany**
- 7. Koncepcia protikorozynej ochrany konštrukcií a vedení**
- 8. Organizácia výstavby**

1. Charakteristika územia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

1.1.1 Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia

Územie

Dotknutý existujúci objekt pre navrhované úpravy spojené s debarierizáciou sa nachádza v meste Prešov na ulici Duklianska č. 1 v lokalite, ktorá je charakteristická blokovou uličnou zástavbou v katastrálnom území: Prešov, na parcele č. 855/1,855/2, . Dané územie môžeme charakterizovať ako rovinaté.

Parcela č. 855/1 je podľa druhu pozemku charakterizovaného v liste vlastníctva č. 12893 evidovaná ako Zastavaná plocha a nádvorie. Podľa spôsobu využitia je parcela č. 855/1 definovaná ako pozemok, na ktorom je postavená, nebytová, budova označená, súpisnom číslom.. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa tento pozemok nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti.

Parcela č. 855/2 je podľa druhu pozemku charakterizovaného v liste vlastníctva č. 12893 evidovaná ako Zastavaná plocha a nádvorie. Podľa spôsobu využitia je parcela č. 855/2 definovaná ako pozemok, na ktorom je postavená, nebytová, budova označená, súpisnom číslom. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa tento pozemok nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti.

Okolité pozemky sú zastavané resp. čiastočne zastavané . Zo severnej strany sa nachádza budova internátu a plocha zelene. Na východnej, južnej a západnej strane sú situované miestne spevnené cesty- ulice Duklianska, Levočská a Sabinovská .

Prístup k budove pre študentov je z južnej strany ul. Levočská. Objekt je existujúcimi prípojkami napojený na všetky inžinierske siete. A to plynovou prípojkou, NN elektrickou prípojkou , vodovodnou a kanalizačnou prípojkou .

Pri stavebných prácach je nutné dodržať podmienky stavované pre práce v ochranných pásmach jednotlivých sietí.

Predmetnou úpravu nedôjde k záberu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

1.1.2 Zdôvodnenie stavby na danom území a jeho využitie

Architektonická a inžinierska príprava, ktorej výsledkom je spracovanie projektu pre realizáciu na stavbu:

„Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov – projektová dokumentácia

“ vyplynula z požiadavky objednávateľa.

Bezbariérové prostredie je jednou zo základných podmienok pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania. Cieľom navrhovaných opatrení je maximálne možné priblíženie sa k takémuto stavu. Rozsah úprav bol zadefinovaný v základných požiadavkách zo strany objednávateľa. Jedná sa o osadenie šikmých schodiskových plošín a úpravu vstupných dverí do budovy .

Heslovité vymenovanie opatrení podľa lokalizácie polohy v objekte:

POLOHA A- NÁVRH DVOCH PRESKLENÝCH STENY V ZÁDVERÍ JEDNÉHO VSTUPU DO BUDOVY

POLOHA B- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.NP NA 4.NP

POLOHA C- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY NA VYROVNÁVACÍCH SCHODOCH NA 1.NP

POLOHA D- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.PP NA 3.NP

Pred zahájením prác je nutné previesť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí a káblov ich vlastníkmí, aby sa predišlo ich možnému poškodeniu pri realizácii. Dodržiavať odstupové vzdialenosti v zmysle ochranných pásem!

1.2 Údaje o prieskumoch

Bola vykonaná obhliadka objektu a je možné konštatovať, že návrh bude možné realizovať podľa požiadaviek investora a užívateľa.

Inžiniersko-geologický prieskum nebol zrealizovaný.

1.3 Použité mapové a geodetické podklady

- Kópia z katastrálnej mapy a listu vlastníctva
- Projektová dokumentácia – zameranie existujúceho stavu
- Komunikácia s objednávateľom+ rozsah prác stanovený v súťažných podkladoch
- Príslušné normy STN, súvisiace predpisy
- Prospekty dodávateľov stavebných výrobkov

1.4 Príprava pre výstavbu

Bude predstavovať zabratie záujmových priestorov alebo ich časti pre dodávateľa – skládky materiálu (predpokladá sa priestor vo vyhradených priestoroch objektu, resp. na okolitých zelených resp. spevnených plochách), určenie odberných miest vody a el. energie pre stavebné účely. Pre zariadenie

staveniska a prípravu pre realizáciu budúceho staveniska je čiastočne nutné stavenisko oplotiť dočasným plotom / vstup do školskej časti budovy/.

2. Urbanistické , architektonické a stavebno-technické riešenie

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01 – VLASTNÝ OBJEKT

STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT

Jestvujúci stav

Budova SPŠ má pavilóny s rôznym počtom podlaží a je čiastočne podpivničená, je prestrešená plochou strechou. V súčasnosti sú z južnej strany prevádzkovo riešené tri vstupy . Nami riešené opatrenia sú v budove školy v pavilóne s dvoma, so štyrmi nadzemnými a jedným podzemným podlažím a v časti s troma nadzemnými a jedným podzemným podlažím

Tri hlavné vstupy do budovy v priestore školy sú z južnej strany, z ulice Levočská. Cca 0,5 m výškový rozdiel medzi vonkajšou spevnenou plochou a podlahou 1.NP je prekonávaný vonkajšími schodiskovým stupňami a existujúcou vyrovnávacou rampou. Cez presklené steny zádveria s dvoma otváracími dvojkrídlovými dverami / rieši opatrenie v polohe č. "A"/ vstupujeme do priestoru vestibulu , na ktorý nadväzuje riešené štvorpodlažné schodisko / vid' opatrenie v polohe č. "B"/. V budove školy na 1.NP je výškový rozdiel podláh riešený cez vnútorné vyrovnávacie schody / bezbariérovosť rieši opatrenie v polohe č."C"/ V pavilóne s laboratóriami s troma nadzemnými a jedným podzemným podlažím navrhujeme na vnútornom schodisku šikmú schodiskovú plošinu. / rieši opatrenie v polohe č."D"/

Plošné bilancie a kapacitné údaje jestvujúcej stavby, v ktorej sa riešia navrhované opatrenia :

Počet podlaží:

Vstupná časť (lokalita A)	2 nadzemné
Budova školy (lokalita B,C)	4 nadzemné +1 podzemné
Budova školy (lokalita D)	3 nadzemné +1 podzemné

Navrhovane opatrenia , búracie práce

Ako bolo vyššie spomenuté bezbariérové prostredie je jednou zo základných podmienok pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania.

Cieľom navrhovaných opatrení je maximálne možné priblíženie sa k takémuto stavu. Rozsah úprav bol zadefinovaný v základných požiadavkách zo strany objednávateľa. . Jedná sa o osadenie šikmých schodiskových plošín a úpravu vstupných dverí do budovy .

Heslovité vymenovanie opatrení podľa lokalizácie polohy v objekte:

POLOHA A- NÁVRH DVOCH PRESKLENÝCH STIEN V ZÁDVERÍ JEDNÉHO VSTUPU DO BUDOVY

Návrh vstupných dverí jedného zádveria si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Odstránenie existujúcich presklených stien (položka B1) a osadenie nových (položka D1 a D2) s jednými automatickými posuvnými teleskopickými dvojkrídlovými dverami
- Vo výkrese č.1 – Technická správa- príloha č. 1 – Technické zariadenia
Položka č. D1 a D2 je špecifikácia dverí

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný.

POLOHA B- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.NP NA 4.NP

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na prekonanie výškového rozdielu troch podlaží t.j. 1.NP-4.NP si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.
- Vo výkrese č.1 – Technická správa- príloha č. 1 – Technické zariadenia
Položka č. D je špecifikácia šikmej schodiskovej plošiny

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný.

POLOHA C- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY NA VYROVNÁVACÍCH SCHODOCH NA 1.NP

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na vyrovnávacích schodoch na 1.NP na prekonanie 1,65 m výškového si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.
- Vo výkrese č.1 – Technická správa- príloha č. 1 – Technické zariadenia
Položka č. B je špecifikácia šikmej schodiskovej plošiny

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný.

POLOHA D- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.PP NA 3.NP

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na prekonanie výškového rozdielu troch podlaží t.j. 1.PP-3.NP si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Skrátanie existujúceho schodiskového zábradlia (položka B2) podľa požiadavky dodávateľa technického zariadenia.
- Demontáž a posunutie existujúcich vykurovacích telies na schodiskových podestách podľa požiadavky dodávateľa technického zariadenia. (položka B3)
- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.

- Vo výkrese č.1 – Technická správa- príloha č. 1 – Technické zariadenia
Položka č. E je špecifikácia šikmej schodiskovej plošiny

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný,
keď že je v súčasnosti zrealizovaný

PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ NA STAVBE JE NUTNÉ REALIZOVAŤ OVEROVACIE SONDY NA STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV VYBRANÝCH KONŠTRUKCIÍ A BÚRANÉ KONŠTRUKCIE ODSÚHLASIŤ AUTORIZOVANÝM PROJEKTANTOM STATIKY V RÁMCI ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA!

Počas realizácie týchto prác je nutné dodržiavať určité pravidlá, a to:

- pred začatím búracích prác je potrebné rozvodné siete (elektrické, vodné, tepelné) inštalované v riešenej časti odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať.
 - na odber el. prúdu pre potreby búracích prác sa musí zriadiť samostatné vedenie.
 - na zníženie prašnosti búracích prác sa zabezpečí zdroj vody,
 - na základe obhliadky sa búranie nosných konštrukcií nepredpokladá
 - stavebný materiál získaný odstraňovaním stavby sa odstráni na skládku určenú úradom
- Pri realizácii dbať na dodržiavanie BOZP pri práci a ochranu majetku na susedných pozemkoch.

UPOZORNENIE:

- * PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V PODROBNOSTI PROJEKT STAVBY
- * GEOMETRIA JESTVÚJÚCEHO OBJEKTU BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE JEDNODUCHÉHO ZAMERANIA LASEROVÝM MERAČOM.
- * PRED REALIZÁCIOU A ZÁVÄZNOU OBJEDNÁVKOU AKÝCHKOLIEK KONŠTRUKCIÍ A VÝROBKOV JE NUTNÉ ROZMERY PREVERIŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!
- * JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE ALEBO VÝROBKY, S KTORÝMI SA UVAŽUJE O ZABUDOVANÍ DO STAVBY, JE PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ NA STAVBE NUTNÉ ROZLOŽIŤ, SKONTROLOVAŤ TECHNICKÝ STAV A GEOMETRIU. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE PRISPÔSOBIŤ NA MIERU!
- * PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ NA STAVBE JE NUTNÉ REALIZOVAŤ OVEROVACIE SONDY NA STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV VYBRANÝCH KONŠTRUKCIÍ A BÚRANÉ KONŠTRUKCIE ODSÚHLASIŤ AUTORIZOVANÝM PROJEKTANTOM STATIKY V RÁMCI ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA!
- * AKÉKOLIEK ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- * JESTVUJÚCE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ IBA PREDPOKLADANÉ, PRED REALIZÁCIOU NAVRHOVANÝCH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZHOTOVÍŤ SONDY A NAVRHOVANÉ ZÁKLADY PRISPÔSOBIŤ EXISTUJÚCIM PODMIENKAM NA STAVBE.
- * NEDOVOĽUJE SA ZÁSAH DO JESTVUJÚCICH ZÁKLADOV ANI ICH PODKOPANIE!
- * VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA

TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽÍŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH, FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV

*** PRED VÝROBOU ZARIADENÍ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERANÍM. PRI ZISTENÝCH ROZDIELOCH S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU O TOM INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.**

Zemné práce

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme so zemnými prácami.

Základové konštrukcie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme s návrhom základových konštrukcií .

Zvislé konštrukcie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme s návrhom zvislých konštrukcií

Vodorovné nosné konštrukcie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme zásah do existujúcich vodorovných nosných konštrukcií, ktorý bude ovplyvňovať ich nosnosť. Nové vodorovné nosné konštrukcie nenavrhujeme.

Strešná konštrukcia

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme zásah do existujúcich strešných konštrukcií. Nové strešné konštrukcie nenavrhujeme.

Výťah a schodisko

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nový výťah nenavrhujeme.

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové schodisko nenavrhujeme.

Hydroizolácie, parozábrany a parobrzdy

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové hydroizolácie, parozábrany a parobrzdy neriešime.

Tepelné izolácie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové tepelné izolácie neriešime.

Povrchové úpravy stien a stropov

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové povrchové úpravy stien a stropov neriešime.

Pri osadení nových presklených stien so vstupnými dverami (položka D1 a D2) bude nutné vyspraviť ostenia a nadpražia stien a stropov.

Podlahy

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové podlahy neriešime.

Pri osadení nových presklených stien so vstupnými dverami (položka D1 a D2) bude nutné vyspraviť nášľapnú vrstvu existujúcich podláh.

Výplne otvorov

Po vybúraní presklených stien existujúcich vstupov / poloha „A“/ navrhujeme nové presklene steny v AL prevedení.

Presklená stena D1 – navrhujeme presklenú stenu s jednými dvojkrídlovými automatickými teleskopickými posuvnými dverami. Vzhľadom na to, že zo strany objednávateľa nebol predložený platný projekt PBS, priechodnosť- šírka dverí bola zachovaná podľa pôvodného stavu, šírky 1700 mm (tri únikové pruhy). Automatické posuvné dvere budú opatrené záložným zdrojom energie a v prípade potreby bude možné ich manuálne otvoriť.

Presklená stena D2 – navrhujeme presklenú stenu s jednými dvojkrídlovými automatickými teleskopickými posuvnými dverami. Vzhľadom na to, že zo strany objednávateľa nebol predložený platný projekt PBS, priechodnosť- šírka dverí bola zachovaná podľa pôvodného stavu, šírky 1700 mm (tri únikové pruhy). Automatické posuvné dvere budú opatrené záložným zdrojom energie a v prípade potreby bude možné ich manuálne otvoriť.

viď výkres č. 10 – VÝPIS DVERÍ- NAVRHOVANÝ STAV

Doplňkové konštrukcie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové doplnkové konštrukcie neriešime.

V polohe „D“ kvôli osadeniu nosnej dráhy šikmej schodiskovej plošiny navrhujeme existujúce schodiskové zábradlie skrátiť cca o 150 mm (položka B2) a zábradlie upraviť.

Zásobovanie vodou

VNÚTORNÝ VODOVOD – zdravotníctvo

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové rozvody vody neriešime.

Kanalizácia

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA – zdravotníctvo

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové rozvody kanalizácie neriešime.

Rozvod elektrickej energie

V súčasnosti v priestoroch školy prebiehajú rekonštrukčné práce na rozvodoch vnútornej elektroinštalácií a požiadavky pre nami navrhované technické zariadenia sú zohľadnené, táto PD časť ELI nerieši.

3. Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z. a v zmysle Zákona č. 79/2015 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce počas realizácie navrhovaných objektov, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, zatriedené:

Nekontaminované (O - ostatné) stavebné odpady.

Číslo skupiny podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadov
15	Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované	
15 01	Obaly	
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií	
17 01	Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly, tvárnice	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02	Drevo, sklo, plasty	
17 02 01	Drevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 04	Kovy	
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05	Zemina, kamenivo	
17 05 06	Výkopové zeminy iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 06	Izolačné materiály	
17 06 04	Iné izolačné materiály (penový polystyrén, minerál. vlákna)	O

Likvidácia odpadov

Dodávateľ stavebných prác respektíve stavebník uzatvorí zmluvu pred začatím stavby s firmou ktorá ma oprávnenie na odber, odvoz a likvidáciu odpadov. Výkopová zemina sa použije pri úprave nivelety terénu.

Ochrana životného prostredia

Navrhované stavebné úpravy budovy budú mať určitý, avšak iba dočasný dopad na životné prostredie priestoru. Tento vplyv súvisí :

- s nutnosťou dotácie zriadeného staveniska stavebným materiálom
- nutnosťou realizácie stavby
- nutnosťou dočasného skladu odpadu

Samotné, v predmetnej časti projektovej dokumentácie predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru t.j. nad mieru povolenú vydaným stavebným povolením.

Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby :

Vzhľadom na rozsah a postup plánovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné základné podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie lokality.

a) Z hľadiska ochrany ovzdušia :

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, napr. zemné práce, práce na fasáde, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zriadené stavenisko je nutné oplotiť nepriehľadným oplotením, zemné práce je nutné kropiť, výkopové práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami).
- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach navrhovaného staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách

b) Z hľadiska ochrany pred hlukom :

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku a v riešenom území neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy, stanovenú príslušnou legislatívou
- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového poriadku t.j. rešpektovali napr. nočný klud po 22 hod.
- zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané v dňoch pracovného pokoja t. j. v So a Ne resp. aby boli vykonávané iba nehučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti zabezpečujúce dodržanie predpísaných technologických postupov resp. činnosti, ktoré svojím prerušením znehodnocujú už zrealizované dielo)
- Zdrojom hluku sú všetky strojné zariadenia. Zariadenia dosahujú vyšší štandard, sú na podobných stavbách inštalované. V prírodných aj odvodných vetvách centrálne vzduchotechniky sú inštalované potrebné tlmiče hluku. Zariadenia sú inštalované na protiotrasových izolátoroch.

c) Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel :

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd dotknutej lokality
- zabezpečiť, aby navrhované dočasné, sociálne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete

d) Z hľadiska ochrany zelene :

- zabezpečiť, aby s jestvujúcou zeleňou riešeného územia nakladala zo zákona oprávnená (odborne spôsobilá) organizácia a prípadné odstraňovanie zelene bolo uskutočnené v termíne vegetačného kludu (03-11), na základe záverov prezentovaných v projektovom riešení a povolenia príslušného orgánu štátnej správy
- zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca prípadným odstraňovaním zelene bola realizovaná odvozom, pálenie a drvenie je nepripustné
- zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne resp. malou mechanizáciou)
- zabezpečiť, aby ostatná vzrástla zeleň počas výstavby bola rešpektovaná v plnom rozsahu

4. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na poľnohosp. pôdu

Stavebník nemusí zabezpečiť vyňatie pôdy pre stavebné účely, keď že parcely sú vedené ako zastavané plochy a nádvoría. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce.

5. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle zákona č. 374/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Vstupovať na stavbu môžu len osoby, ktoré sú na to oprávnené, a boli poučené o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pri všetkých prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc. Všetky osoby pohybujúce sa na stavbe sú povinné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a používať ochranné prostriedky. Na dodržiavanie týchto ustanovení priamo vplýva stavebník alebo staviteľ po dohode so stavebníkom. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem. Vozidlá nákladné a osobné, ktoré budú vchádzať a vychádzať zo staveniska, treba upozorniť príslušnými dopravnými značkami. Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a malá zdravotná kapsa.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce:

- zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 - zo zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších doplnkov
 - zo zákona NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov práci
 - z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 - z nariadenia vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 - nariadenia vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 - z nariadenia vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko NV SR 281/ 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 - z nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- zo zákona č. 125/2006 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005

6. Požiadavky civilnej ochrany

Bez požiadavky.

7. Koncepcia protikorózneho ochrany konštrukcií a vedení

Exteriérové kovové konštrukcie budú opatrené príslušným náterom, plechové výrobky budú povrchovo upravené.

8. Organizácia výstavby

Prístup k budove pre zásobovanie je z ulice Duklianska cez existujúce dopravné napojenie.

Navrhované úpravy spojené s debarierizáciou objektu neovplyvňujú požiadavku na potrebné odstupové vzdialenosti od spoločných hraníc so susednými parcelami.

Okolité pozemky sú zastavané resp. čiastočne zastavané. Zo severnej strany sa nachádza budova internátu a plocha zelene. Na východnej, južnej a západnej strane sú situované miestne spevnené cesty - ulice Duklianska, Levočská a Sabinovská. Z hľadiska koncepcie postupu výstavby sa na začiatku výstavby prevedie príprava plôch a vybuduje zariadenie staveniska.

Voda ako aj elektrická energia pre stavebné účely bude zo zdrojov :

Voda..... z existujúcej vodovodnej prípojky

Elektrická energia..... z existujúcej elektrickej prípojky

Preprava stavebných konštrukcií, hmôt a materiálov bude po štátnych cestách a mestských komunikáciách, ktoré vyhovujú preprave za každého počasia. Prepravnú trasu je potrebné odsúhlasiť s dopravným inšpektorátom a s miestnym úradom.

Z hľadiska sociálneho zabezpečenia pracovníkov sa na stavenisku zriadi zariadenie staveniska.

Z hľadiska ochrany životného prostredia stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Lehota výstavby bola objektivizovaná na dobu 3 mesiace.

Zahájenie realizácie stavby

Ukončenie realizácie stavby

Doba výstavby

určí objednávatel'

určí objednávatel'

určí objednávatel' a dodávateľ

predbežne 3 mesiace

Zariadenie staveniska bude zlikvidované postupne, najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia výstavby.

Stavenisko prevezme späť investor vyčistené a vypratané.




A - Club, s.r.o.
Ing. Vojtech Jačišin
Architektúra a pozemné stavby

SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZTAHOV

AUTOR:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	A - Club, s.r.o. Lažany č.49, 082 32 Po Ateliér: Budovateľská 34 080 01 Prešov		
Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Peter Špak			
OKRES:	PREŠOV	MIESTO-OBEC: PREŠOV				
INVESTOR:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 080 04			FORMÁT:		
STAVBA:	Debarierizácia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov			DÁTUM:	07 / 2023	
OBJEKT:				STUPEŇ PD:	PROJEKT	
				ČÍSLO ZÁKAZKY:		
				ČÍSLO KÓPIE:		
PARCELA ČÍSLO: 855/1, 855/2 KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PREŠOV			ARCHÍVNE ČÍSLO:			
OBSAH VÝKRESU:				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:	
SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZTAHOV				C		

Parcela registra C, 855/1, 855/2

Prešovský > Prešov > Prešov > k.ú. Prešov

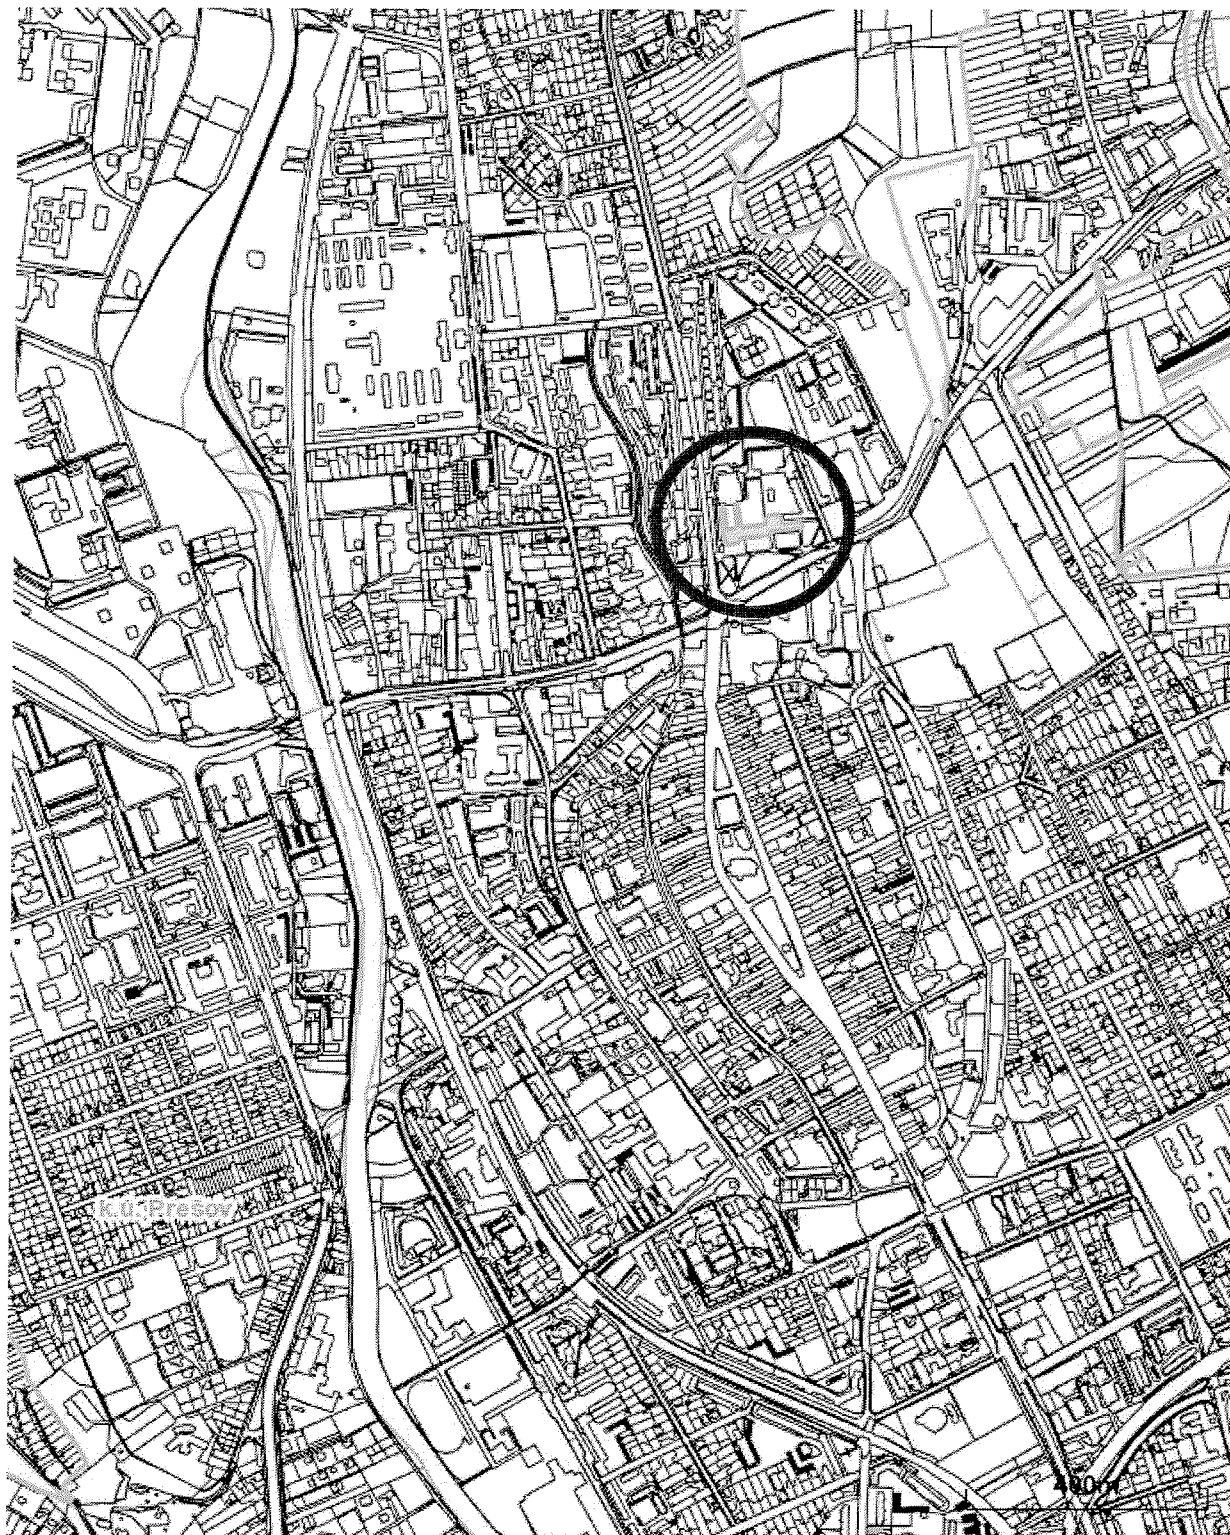

Číslo listu vlastníctva

12893

Výmera parcely v m²

3094

Katastrálne územie

Prešov

Obec

Prešov

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie

Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

Druh právneho vzťahu

Neevidovaný

Údaje platné k dátumu

06. 07. 2023

Druh chránenej nehnuteľnosti (0)

Neexistuje záznam

Stavby (1)

Súpisné číslo: 6022 (LV 12893)

Vlastník (1)

1. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, PSČ 080 01, SR (Podiel: 1/1)



UPOZORNENIE:

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI PROJEKT
- VŠETKY TECHNICKÉ A STATICKÉ DETAILS JE NUTNÉ DOPRACOVAŤ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII
- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN

TECHNICKÁ SPRÁVA

±0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP V LOKALITE

SADA ČÍSLO:

AUTOR:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	A - Club, s.r.o. Lažany č.49, 082 32 Po Ateliér: Budovateľská 34 080 01 Prešov	
Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. V. Jačišin		
OKRES:	PREŠOV	MIESTO-OBEC: PREŠOV			
INVESTOR:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 080 04				
STAVBA:	Debarierizácia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov				
OBJEKT:	SO 01 - VLASTNÝ OBJEKT	PARCELA ČÍSLO:	855/1, 855/2		
		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PREŠOV			
OBSAH VÝKRESU:				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
TECHNICKÁ SPRÁVA					1

PROJEKT STAVBY

**Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1,
Prešov – projektová dokumentácia**

1: TECHNICKÁ SPRÁVA

SO-01 Vlastný objekt

NÁZOV STAVBY : DEBARIERIZÁCIA SPŠ STROJNÍCKEJ,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV
– PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

OBJEDNÁVATEL: SPŠ STROJNÍCKA, DUKLIANSKA 1, PREŠOV

MIESTO STAVBY : BUDOVA SPŠ STROJNÍCKEJ,
DUKLIANSKA 1, PREŠOV
KATASTER: PREŠOV
ČÍSLO PARCELY : KN C 855/1, 855/2

OKRES : PREŠOV

KRAJ : PREŠOVSKÝ

STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

**ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT :** Ing. Vojtech Jačišin, reg. č.: 6004*A1
A-Club, s.r.o.
Lažany 49
082 32 Prešov

VYPRACOVAL: Ing. Vojtech Jačišin

Zoznam spracovateľov projektovej dokumentácie:

Zodpovedný projektant HIP :	Ing. Vojtech Jačišin
Stavebné konštrukcie a architektúra:	Ing. Vojtech Jačišin
	Ing. Peter Špak
Rozpočtové náklady stavby	Ing. Ľudmila Šariczká

DÁTUM : 07 / 2023

Obsah:

1. Charakteristika územia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

1.2 Údaje o prieskumoch

1.3 Použité mapové a geodetické podklady

1.4 Príprava pre výstavbu

2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie

3. Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie

1. Charakteristika územia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Dotknutý existujúci objekt pre navrhované úpravy spojené s debarierizáciou sa nachádza v meste Prešov na ulici Duklianska č. 1 v lokalite, ktorá je charakteristická blokovou uličnou zástavbou v katastrálnom území: Prešov, na parcele č. 855/1,855/2, . Dané územie môžeme charakterizovať ako rovinaté.

Parcela č. 855/1 je podľa druhu pozemku charakterizovaného v liste vlastníctva č. 12893 evidovaná ako Zastavaná plocha a nádvorie. Podľa spôsobu využitia je parcela č. 855/1 definovaná ako pozemok, na ktorom je postavená. nebytová. budova označená. súpisnom číslom.. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa tento pozemok nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti.

Parcela č. 855/2 je podľa druhu pozemku charakterizovaného v liste vlastníctva č. 12893 evidovaná ako Zastavaná plocha a nádvorie. Podľa spôsobu využitia je parcela č. 855/2 definovaná ako pozemok, na ktorom je postavená. nebytová. budova označená. súpisnom číslom. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa tento pozemok nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti.

Okolité pozemky sú zastavané resp. čiastočne zastavané . Zo severnej strany sa nachádza budova internátu a plocha zelene. Na východnej, južnej a západnej strane sú situované miestne spevnené cesty- ulice Duklianska, Levočská a Sabinovská .

Prístup k budove pre študentov je z južnej strany ul. Levočská. Objekt je existujúcimi prípojkami napojený na všetky inžinierske siete. A to plynovou prípojkou, NN elektrickou prípojkou , vodovodnou a kanalizačnou prípojkou .

Pri stavebných prácach je nutné dodržať podmienky stavované pre práce v ochranných pásmach jednotlivých sietí.

Predmetnou úpravu nedôjde k záberu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

Pred zahájením výkopových prác je nutné previesť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí a káblov ich vlastníckmi, aby sa predišlo ich možnému poškodeniu pri realizácii. Dodržiavať odstupové vzdialenosti v zmysle ochranných pásem!

1.2 Údaje o prieskumoch

Bola vykonaná obhliadka objektu a je možné konštatovať, že návrh bude možné realizovať podľa požiadaviek investora a užívateľa.

Inžiniersko-geologický prieskum nebol zrealizovaný.

1.3 Použité mapové a geodetické podklady

- Kópia z katastrálnej mapy a listu vlastníctva
- Projektová dokumentácia – zameranie existujúceho stavu
- Komunikácia s objednávatel'om+ rozsah prác stanovený v súťažných podkladoch
- Príslušné normy STN, súvisiace predpisy
- Prospekty dodávateľov stavebných výrobkov

1.4 Príprava pre výstavbu

Bude predstavovať zabratie záujmových priestorov alebo ich časti pre dodávateľa – skládky materiálu (predpokladá sa priestor vo vyhradených priestoroch objektu, resp. na okolitých zelených resp. spevnených plochách), určenie odberných miest vody a el. energie pre stavebné účely. Pre zariadenie staveniska a prípravu pre realizáciu budúceho staveniska je čiastočne nutné stavenisko oplotiť dočasným plotom / vstup do školskej časti budovy/.

2. Urbanistické , architektonické a stavebno-technické riešenie

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO-01 Vlastný objekt

STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT

Jestvujúci stav

Budova SPŠ má pavilóny s rôznym počtom podlaží a je čiastočne podpivničená, je prestrešená plochou strechou. V súčasnosti sú z južnej strany prevádzkovo riešené tri vstupy . Nami riešené opatrenia sú v budove školy v pavilóne s dvoma, so štyrmi nadzemnými a jedným podzemným podlažím a v časti s troma nadzemnými a jedným podzemným podlažím

Tri hlavné vstupy do budovy v priestore školy sú z južnej strany, z ulice Levočská.

Cca 0,5 m výškový rozdiel medzi vonkajšou spevnenou plochou a podlahou 1.NP je prekonávaný vonkajšími schodiskovým stupňami a existujúcou vyrovnávacou rampou. Cez presklené steny zádveria s dvoma otváracími dvojkrídlovými dverami / rieši opatrenie v polohe č. "A"/ vstupujeme do priestoru-vestibulu , na ktorý nadväzuje riešené štvorpodlažné schodisko / vid' opatrenie v polohe č. "B"/.

V budove školy na 1.NP je výškový rozdiel podláh riešený cez vnútorné vyrovnávacie schody / bezbariérovosť rieši opatrenie v polohe č."C"/

V pavilóne s laboratóriami s troma nadzemnými a jedným podzemným podlažím navrhujeme na vnútornom schodisku šikmú schodiskovú plošinu. / rieši opatrenie v polohe č."D"/

Plošné bilancie a kapacitné údaje jestvujúcej stavby, v ktorej sa riešia navrhované opatrenia :

Počet podlaží:

Vstupná časť (lokalita A)	2 nadzemné
Budova školy (lokalita B,C)	4 nadzemné +1 podzemné
Budova školy (lokalita D)	3 nadzemné +1 podzemné

Navrhovane opatrenia , búracie práce

Ako bolo vyššie spomenuté bezbariérové prostredie je jednou zo základných podmienok pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania.

Cieľom navrhovaných opatrení je maximálne možné priblíženie sa k takémuto stavu. Rozsah úprav bol zadefinovaný v základných požiadavkách zo strany objednávateľa. . Jedná sa o osadenie šikmých schodiskových plošín a úpravu vstupných dverí do budovy .

Heslovité vymenovanie opatrení podľa lokalizácie polohy v objekte:

POLOHA A- NÁVRH DVOCH PRESKLENÝCH STIEN V ZÁDVERÍ JEDNÉHO VSTUPU DO BUDOVY

Návrh vstupných dverí jedného zádveria si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Odstránenie existujúcich presklených stien (položka B1) a osadenie nových (položka D1 a D2) s jednými automatickými posuvnými teleskopickými dvojkřídlovými dverami
- Vo výkrese č.1 – Technická správa- príloha č. 1 – Technické zariadenia
Položka č. D1 a D2 je špecifikácia dverí

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný.

POLOHA B- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.NP NA 4.NP

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na prekonanie výškového rozdielu troch podlaží t.j. 1.NP-4.NP si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.
- Vo výkrese č.1 – Technická správa- príloha č. 1 – Technické zariadenia
Položka č. D je špecifikácia šikmej schodiskovej plošiny

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný.

POLOHA C- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY NA VYROVNÁVACÍCH SCHODOCH NA 1.NP

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na vyrovnávacích schodoch na 1.NP na prekonanie 1,65 m výškového si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.
- Vo výkrese č.1 – Technická správa- príloha č. 1 – Technické zariadenia
Položka č. B je špecifikácia šikmej schodiskovej plošiny

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný.

POLOHA D- NÁVRH VNÚTORNEJ ŠIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z 1.PP NA 3.NP

Návrh šikmej schodiskovej plošiny na prekonanie výškového rozdielu troch podlaží t.j. 1.PP-3.NP si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Skrátenie existujúceho schodiskového zábradlia (položka B2) podľa požiadavky dodávateľa technického zariadenia.
- Demontáž a posunutie existujúcich vykurovacích telies na schodiskových podestách podľa požiadavky dodávateľa technického zariadenia. (položka B3)
- Osadenie šikmej schodiskovej plošiny podľa špecifikácie.
- Vo výkrese č.1 – Technická správa- príloha č. 1 – Technické zariadenia
Položka č. E je špecifikácia šikmej schodiskovej plošiny

Poznámka : Stavebná pripravenosť- prívod elektroinštalácie nie je nutný, keď že je v súčasnosti zrealizovaný

PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ NA STAVBE JE NUTNÉ REALIZOVAŤ OVEROVACIE SONDY NA STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV VYBRANÝCH KONŠTRUKCIÍ A BÚRANÉ KONŠTRUKCIE ODSÚHLASIŤ AUTORIZOVANÝM PROJEKTANTOM STATIKY V RÁMCI ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA!

Počas realizácie týchto prác je nutné dodržiavať určité pravidlá, a to:

- pred začatím búracích prác je potrebné rozvodné siete (elektrické, vodné, tepelné) inštalované v riešenej časti odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať.
 - na odber el. prúdu pre potreby búracích prác sa musí zriadiť samostatné vedenie.
 - na zníženie prašnosti búracích prác sa zabezpečí zdroj vody,
 - na základe obhliadky sa búranie nosných konštrukcií nepredpokladá
 - stavebný materiál získaný odstraňovaním stavby sa odstráni na skládku určenú úradom
- Pri realizácii dbať na dodržiavanie BOZP pri práci a ochranu majetku na susedných pozemkoch.

UPOZORNENIE:

- * PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V PODROBNOSTI PROJEKT STAVBY
- * GEOMETRIA JESTVUJÚCEHO OBJEKTU BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE JEDNODUCHÉHO ZAMERANIA LASEROVÝM MERAČOM.
- * PRED REALIZÁCIOU A ZÁVÄZNOU OBJEDNÁVKOU AKÝCHKOLIEK KONŠTRUKCIÍ A VÝROBKOV JE NUTNÉ ROZMERY PREVERIŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!
- * JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE ALEBO VÝROBKÝ, S KTORÝMI SA UVAŽUJE O ZABUDOVANÍ DO STAVBY, JE PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ NA STAVBE NUTNÉ ROZLOŽIŤ, SKONTROLOVAŤ TECHNICKÝ STAV A GEOMETRIU. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE PRISPÔSOBIŤ NA MIERU!
- * PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ NA STAVBE JE NUTNÉ REALIZOVAŤ OVEROVACIE SONDY NA STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV VYBRANÝCH KONŠTRUKCIÍ A BÚRANÉ

KONŠTRUKCIE ODSÚHLASIŤ AUTORIZOVANÝM PROJEKTANTOM STATIKY V RÁMCI ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA!

*** AKÉKOLIEK ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.**

*** JESTVUJÚCE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ IBA PREDPOKLADANÉ, PRED REALIZÁCIOU NAVRHOVANÝCH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZHOTOVÍŤ SONDY A NAVRHOVANÉ ZÁKLADY PRISPÔSOBIŤ EXISTUJÚCIM PODMIENKAM NA STAVBE.**

*** NEDOVOLEJUJE SA ZÁSAH DO JESTVUJÚCICH ZÁKLADOV ANI ICH PODKOPANIE!**

*** VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH, FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV**

*** PRED VÝROBOU ZARIADENÍ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERANÍM. PRI ZISTENÝCH ROZDIELOCH S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU O TOM INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.**

Zemné práce

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme so zemnými prácami.

Základové konštrukcie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme s návrhom základových konštrukcií .

Zvislé konštrukcie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme s návrhom zvislých konštrukcií.

Vodorovné nosné konštrukcie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme zásah do existujúcich vodorovných nosných konštrukcií, ktorý bude ovplyvňovať ich nosnosť. Nové vodorovné nosné konštrukcie nenavrhujeme.

Strešná konštrukcia

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nepredpokladáme a neuvažujeme zásah do existujúcich strešných konštrukcií. Nové strešné konštrukcie nenavrhujeme.

Výťah a schodisko

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nový výťah nenavrhujeme.

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové schodisko nenavrhujeme.

Hydroizolácie, parozábrany a parobrzdy

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové hydroizolácie, parozábrany a parobrzdy neriešime.

Tepelné izolácie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové tepelné izolácie neriešime.

Povrchové úpravy stien a stropov

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové povrchové úpravy stien a stropov neriešime.

Pri osadení nových presklených stien so vstupnými dverami (položka D1 a D2) bude nutné vyspraviť ostenia a nadpražia stien a stropov.

Podlahy

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové podlahy neriešime.

Pri osadení nových presklených stien so vstupnými dverami (položka D1 a D2) bude nutné vyspraviť nášľapnú vrstvu existujúcich podláh.

Výplne otvorov

Po vybúraní presklených stien existujúcich vstupov / poloha „A“/ navrhujeme nové presklene steny v AL prevedení.

Presklená stena D1 – navrhujeme presklenú stenu s jednými dvojkrídlými automatickými teleskopickými posuvnými dverami. Vzhľadom na to, že zo strany objednávateľa nebol predložený platný projekt PBS, priechodnosť- šírka dverí bola zachovaná podľa pôvodného stavu, šírky 1700 mm (tri únikové pruhy). Automatické posuvné dvere budú opatrené záložným zdrojom energie a v prípade potreby bude možné ich manuálne otvoriť.

Presklená stena D2 – navrhujeme presklenú stenu s jednými dvojkrídlými automatickými teleskopickými posuvnými dverami. Vzhľadom na to, že zo strany objednávateľa nebol predložený platný projekt PBS, priechodnosť- šírka dverí bola zachovaná podľa pôvodného stavu, šírky 1700 mm (tri únikové pruhy). Automatické posuvné dvere budú opatrené záložným zdrojom energie a v prípade potreby bude možné ich manuálne otvoriť.

viď výkres č. 10 – VÝPIS DVERÍ- NAVRHOVANÝ STAV

Doplňkové konštrukcie

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové doplnkové konštrukcie neriešime.

V polohe „D“ kvôli osadeniu nosnej dráhy šikmej schodiskovej plošiny navrhujeme existujúce schodiskové zábradlie skrátiť cca o 150 mm (položka B2) a zábradlie upraviť.

Zásobovanie vodou

VNÚTORNÝ VODOVOD – zdravotníctvo

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové rozvody vody neriešime.

Kanalizácia

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA – zdravotníctvo

V rámci navrhovaných opatrení debarierizácie nové rozvody kanalizácie neriešime.

Rozvod elektrickej energie

V súčasnosti v priestoroch školy prebiehajú rekonštrukčné práce na rozvodoch vnútornej elektroinštalácií a požiadavky pre nami navrhované technické zariadenia sú zohľadnené, táto PD časť ELI nerieši.

Vykurovanie

Poloha D: návrh šikmej schodiskovej plošiny na prekonanie výškového rozdielu troch podlaží t.j. 1.PP-3.NP si vyžaduje určité stavebné úpravy. t.j. :

- Demontáž a posunutie existujúcich vykurovacích telies na schodiskových podestách podľa požiadavky dodávateľa technického zariadenia. (položka B3)

3. Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z. a v zmysle Zákona č. 79/2015 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce počas realizácie navrhovaných objektov, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, zatriedené:

Nekontaminované (O - ostatné) stavebné odpady.

Číslo skupiny podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadov
15	Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované	
15 01	Obaly	
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií	
17 01	Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly, tvárnice	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02	Drevo, sklo, plasty	
17 02 01	Drevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 04	Kovy	
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05	Zemina, kamenivo	
17 05 06	Výkopové zeminy iné ako uvedená v 17 05 05	O
17 06	Izolačné materiály	
17 06 04	Iné izolačné materiály (penový polystyrén, minerál. vlákna)	O

Likvidácia odpadov

Dodávateľ stavebných prác respektíve stavebník uzatvorí zmluvu pred začatím stavby s firmou ktorá ma oprávnenie na odber, odvoz a likvidáciu odpadov. Výkopová zemina sa použije pri úprave nivelety terénu.

Ochrana životného prostredia

Navrhované stavebné úpravy budovy budú mať určitý, avšak iba dočasný dopad na životné prostredie priestoru. Tento vplyv súvisí :

- s nutnosťou dotácie zriadeného staveniska stavebným materiálom
- nutnosťou realizácie stavby
- nutnosťou dočasného skladu odpadu

Samotné, v predmetnej časti projektovej dokumentácie predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru t.j. nad mieru povolenú vydaným stavebným povolením.

Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby :

Vzhľadom na rozsah a postup plánovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné základné podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie lokality.

a) Z hľadiska ochrany ovzdušia :

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, napr. zemné práce, práce na fasáde, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zriadené stavenisko je nutné oplotiť nepriehľadným oplotením, zemné práce je nutné kropiť, výkopové práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami).
- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach navrhovaného staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách

b) Z hľadiska ochrany pred hlukom :

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku a v riešenom území neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy, stanovenú príslušnou legislatívou
- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového poriadku t.j. rešpektovali napr. nočný klud po 22 hod.
- zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané v dňoch pracovného pokoja t. j. v So a Ne resp. aby boli vykonávané iba nehučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti zabezpečujúce dodržanie predpísaných technologických postupov resp. činnosti, ktoré svojím prerušením znehodnocujú už zrealizované dielo)
- Zdrojom hluku sú všetky strojné zariadenia. Zariadenia dosahujú vyšší štandard, sú na podobných stavbách inštalované. V prírodných aj odvodných vetvách centrálne vzduchotechniky sú inštalované potrubné tlmiče hluku. Zariadenia sú inštalované na protiotrasových izolátoroch.

c) Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel :

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd dotknutej lokality

- zabezpečiť, aby navrhované dočasné, sociálne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete

d) Z hľadiska ochrany zelene :

- zabezpečiť, aby s jestvujúcou zeleňou riešeného územia nakladala zo zákona oprávnená (odborne spôsobilá) organizácia a prípadné odstraňovanie zelene bolo uskutočnené v termíne vegetačného klúdu (03-11), na základe záverov prezentovaných v projektovom riešení a povolenia príslušného orgánu štátnej správy
- zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca prípadným odstraňovaním zelene bola realizovaná odvozom, pálenie a drvenie je neprípustné
- zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne resp. malou mechanizáciou)
- zabezpečiť, aby ostatná vzrástla zeleň počas výstavby bola rešpektovaná v plnom rozsahu


V Prešove 07/2023

Ing. Vojtech Jačišin

Príloha č.1 Technické zariadenia - špecifikácia

Strana 1 z 8

D Šikmá schodisková univerzálna plošina v polohe „B“ Prevedenie indoor

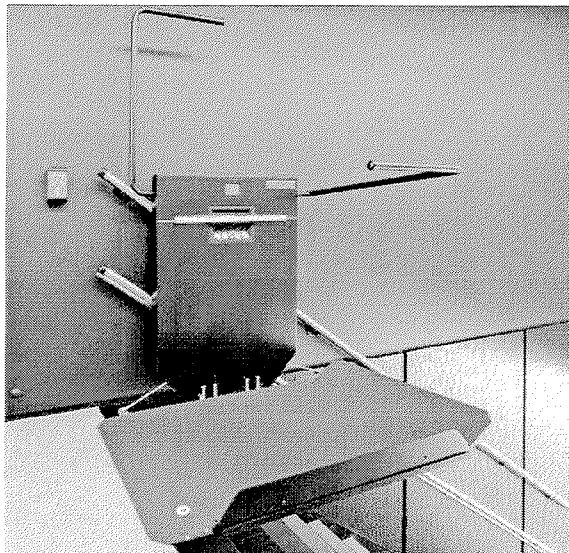

Poznámky:

- VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH, FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV
- PRED VÝROBOU ZARIADENÍ JE DODÁVATEL POVINNÝ OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERANÍM. PRI ZISTENÝCH ROZDIELOCH S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU O TOM INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.

Príloha č.1 Technické zariadenia - špecifikácia

Strana 2 z 8


D- Technická charakteristika zariadenia:

Zariadenie je vyrobené v súlade s 2006/42/ES, aplikovaná norma STN EN 81-40:2011-04 (27 4003).

Typ	Šikmá schodisková plošina GTL30	Vybavenie	bezpečnostné dno bezpečnostné nájazdové rampy min. 4ks batérií (bezúdržbové) sklopné ochranné madlá
Zatriedenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Bi Schodiskový výtah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu	Nosnosť	300kg
		Rozmer podlahy	850 x 1250 mm
Hrúbka zaklopenej plošiny	500 mm od steny na stĺpikoch 430 mm od steny do steny	Doplňky	Sklápacia sedačka na plošine Diaľkové ovládanie na kábli Zvuková signalizácia Svetelná signalizácia
Menovitá rýchlosť	0,15 m/s plynulý rozbeh a spomalenie v koncových polohách	Kotvenie	Dráha kotvená do schodiska – chemické alebo natíkové kotvy
Pohon	elektrický	Príkon	0,6 kW, 230V, 50 Hz
Sklápanie podlahy	elektrické	Prívod: zabezpečí zákazník, stačí zásuvkový	230V/ 50Hz, kábel CYKY 3C x 2,5, 1 fázový istič 16A dvojpólové vypínanie, prúdový chránič jednofázový. Stačí zásuvka do 5 m v blízkosti dráhy. Zemniaci vodič (zeleno-žltý) 6mm (vnútri) a 16 mm (vonku).
Ovládanie	Tlačidlové na plošine, Bezdrôtové nástenné ovládače	Max. uhol stúpania	0°-50° pri zachovaní pôvodnej nosnosti
Počet staníc	4	Strana inštalácie	ľavá
Vodorovný úsek	Áno, 4x		
Dĺžka dráhy	34 m		
Zdvih	10,800 m		
Zákruty	6x 180°		
Prevedenie plošiny	interiér, farba RAL 7040 (štandard) alebo podľa vlastného výberu	Stavebné úpravy zabezpečí zákazník	ak budú vyžadované, budú upresnené pri zameraní, vo výkrese stavebných úprav
Prevedenie dráhy	Nerezové matné trubky s priemerom 50mm, nerezovými hrebeňmi na každej trubke a konzolami na upevnenie dráhy		
Prevedenie pomocnej konštrukcie kotvenia dráhy	45 ks stĺpikov		

Zabezpečujeme pravidelné periodické prehliadky, záručný aj pozáručný servis.

B Šikmá schodisková univerzálna plošina v polohe „C“
Prevedenie indoor

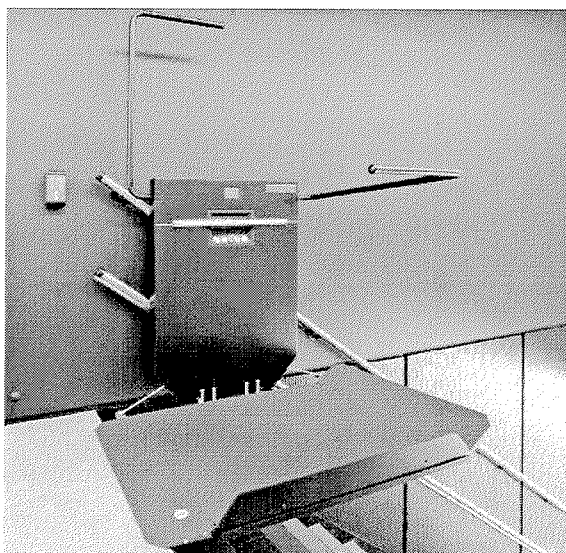

Poznámky:

- VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH, FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV
- PRED VÝROBOU ZARIADENÍ JE DODÁVATEL POVINNÝ OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERANÍM. PRI ZISTENÝCH ROZDIELOCH S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU O TOM INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.

Príloha č.1 Technické zariadenia - špecifikácia

Strana 4 z 8

Zariadenie je vyrobené v súlade s 2006/42/ES, aplikovaná norma STN EN 81-40:2011-04 (27 4003).


Typ	Šikmá schodisková plošina GTL30	Vybavenie	bezpečnostné dno bezpečnostné nájazdové rampy min. 4ks batérií (bezúdržbové) sklopné ochranné madlá
Zatriedenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Bi Schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu	Nosnosť	300kg
		Rozmer podlahy	850 x 1250 mm
Hrúbka zaklopenej plošiny	500 mm od steny na stĺpikoch 430 mm od steny do steny	Doplňky	Sklápacia sedačka na plošine Diaľkové ovládanie na kábli
Menovitá rýchlosť	0,15 m/s plynulý rozbeh a spomalenie v koncových polohách		
Pohon	elektrický	Kotvenie	Dráha kotvené do schodiska – chemické alebo natíkové kotvy
Sklápanie podlahy	elektrické		
Ovládanie	Tlačidlové na plošine, Bezdrôtové nástenné ovládače	Príkon	0,6 kW, 230V, 50 Hz
Počet staníc	2	Prívod: zabezpečí zákazník, stačí zásuvkový	230V/ 50Hz, kábel CYKY 3C x 2,5, 1 fázový istič 16A dvojpólové vypínanie, prúdový chránič jednofázový. Stačí zásuvka do 5 m v blízkosti dráhy. Zemniaci vodič (zeleno-žltý) 6mm (vnútri) a 16 mm (vonku).
Vodorovný úsek	áno		
Dĺžka dráhy	7 m		
Zdvih	1,650 m		
Zákruty	Parkovacia, 1x180°	Max. uhol stúpania	0°-50° pri zachovaní pôvodnej nosnosti
		Strana inštalácie	ľavá
Prevedenie plošiny	interiér, farba RAL 7040 (štandard) alebo podľa vlastného výberu		
Prevedenie dráhy	Nerezové matné trubky s priemerom 50mm, nerezovými hrebeňmi na každej trubke a konzolami na upevnenie dráhy		
Prevedenie pomocnej konštrukcie kotvenia dráhy	8 ks stĺpikov	Stavebné úpravy zabezpečí zákazník	ak budú vyžadované, budú upresnené pri zameraní, vo výkrese stavebných úprav

Zabezpečujeme pravidelné periodické prehliadky, záručný aj pozáručný servis.

Príloha č.1 Technické zariadenia - špecifikácia

Strana 5 z 8

E Šikmá schodisková univerzálna plošina v polohe „D“ Prevedenie indoor

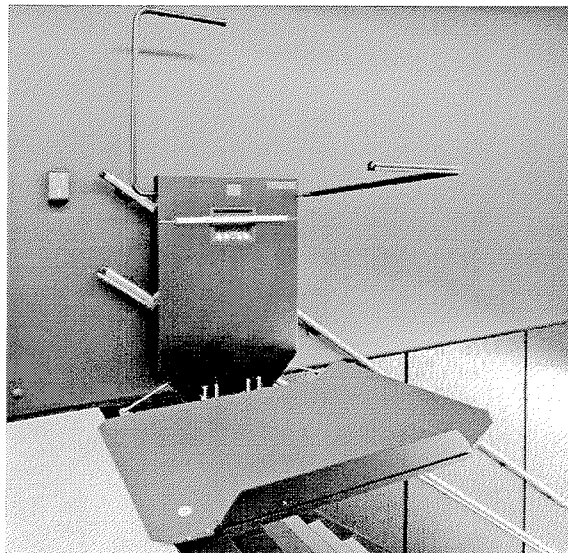

Poznámky:

- VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKIVALENTNÝCH, FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV
- PRED VÝROBOU ZARIADENÍ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERANÍM. PRI ZISTENÝCH ROZDIELOCH S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU O TOM INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.

Príloha č.1 Technické zariadenia - špecifikácia

Strana 6 z 8

Zariadenie spĺňa normu STN EN 81-40.

Typ	Šikmá schodisková univerzálna plošina GTLE	Vybavenie plošiny	4ks batérií (bez údržbové - počet kusov podľa dĺžky dráhy) Ovládanie pomocou tlačidiel „hold to run“, PLC riadenie vrátane informačného dotykového displeja.
Zatriedenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Bi Schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu	Rozmer podlahy (v milimetroch)	900x1250mm
Nosnosť	300 kg		
Hrúbka zbalenej plošiny	240 mm od steny po plošinu 300 mm keď je dráha na stĺpikoch		
Rozsah sklonu dráhy	Od 20° do 50°		
Menovitá rýchlosť	0,15 m/s plynulý rozbeh a spomalenie v koncových polohách		
Pohon	Elektrický (0,8 kW motor)		
Sklápanie podlahy	Motorické (aktivovanie na ovládači)		
Sklápanie madiel	Motorické		
Príkon	0,8 kW, 230V, 50 Hz	Doplňky	Sklopná sedačka a káblový ovládač pre doprovod Akustická signalizácia (iba počas jazdy) Vizuálna signalizácia (iba počas jazdy)
Ovládanie	Tlačidlové na plošine 4x bezdrôtové nástenné ovládače		
Strana inštalácie	pravá (pri pohľade z dolného nástupiska)		
Počet staníc	4		
Vodorovný úsek	Nie		
Dĺžka dráhy	Cca 30 m		
Zdvih	10 540 mm		
Zákruty	6x zákruta 180°		
Prevedenie dráhy	Nerezová oceľ matná, brúsená	Prívod: zásuvka 230V zabezpečí zákazník	230V/ 50Hz, kábel CYKY 3C x 2,5, 1 fázový istič 16A dvojpólové vypínanie, prúdový chránič jednofázový. Zásuvka 230V do 5 m v blízkosti dráhy. Uzemňovací vodič (zeleno-žltý) 6mm ² (pre interiér) a 16 mm ² (exteriér).
Prevedenie plošiny	interiér Farba plošiny RAL9006 / RAL7016		
Prevedenie pomocnej konštrukcie	Oceľové stĺpiky, (38 ks), lakované (RAL9006) Výplň dráhy – nie je	Kotvenie dráhy	Dráha kotvená na stĺpiky
		Stĺpiky dráhy	38 ks, kotvené do schodiska
		Stav. úpravy zabezpečí zákazník	Elektrický prívod 230V

Zabezpečujeme pravidelné periodické prehliadky, záručný aj pozáručný servis

Príloha č.1 Technické zariadenia - špecifikácia

Strana 7 z 8

Špecifikácia presklených stien D1 a D2

D1 Poloha na stavbe „A,, počet kusov: 1 ks

Typ Automatické dvere posuvné teleskopické

Prechodová šírka 1700 mm

Prechodová výška 2000 mm

Výška konštrukcie 2400 mm

Farba 9016 - biela; Matná

Prevedenie dverí

Dvojkridlové teleskopické; Zo strany pohonu odsun vľavo

Pohon

Pohon SP805T teleskopický dvojkridlový: 2735 mm; Kryt pohonu: 3100 mm; Bočné kryty pohonu; Elektrozámok; Núdzové odistenie v kryte; Tlačítko otvorení v krytu; Núdzový zdroj; Digitálny programový prepínač s kľúčom; Programový prepínač v kryte; EPS kontakt
Otvorené

Bezpečnostné prvky a zdroje impulzu

Zdroj impulzov a zaistenie proti stlačeniu z vnútra: 1 ks; Zdroj impulzov a zaistenie proti stlačeniu z vonku: 1 ks; Zaistenie bezpečnosti zadnej hrany krídla elektronicky: 1 ks

Krídla

Krídla z rámových hliníkových profilov; Bezpečnostné izolačné dvojsklo; Dorazový stĺpik; Podlahový zámok jednostranný: 1 ks; Vložka FAB: 1 ks; Polep pre šeroslepých

Stena

Exteriérový AL portál 3100X2354 mm, RAL 9016, 6/16/4/16/4 Stratobel 33.2/Low-e/Low-e
U_g=0,6

D2 Poloha na stavbe „A“ počet kusov: 1 ks

Typ Automatické dvere posuvné teleskopické

Prechodová šírka 1700 mm

Prechodová výška 2000 mm

Výška konštrukcie 2400 mm

Farba 9016 - biela; Matná

Prevedenie dverí

Dvojkridlové teleskopické; Zo strany pohonu odsun vľavo

Pohon

Pohon SP805T teleskopický dvojkridlový: 2735 mm; Kryt pohonu: 3100 mm; Bočné kryty pohonu; Elektrozámok; Núdzové odistenie v kryte; Tlačítko otvorení v krytu; Núdzový zdroj; Digitálny programový prepínač s kľúčom; Programový prepínač v kryte; EPS kontakt
Otvorené

Bezpečnostné prvky a zdroje impulzu

Zdroj impulzov a zaistenie proti stlačeniu z vnútra: 1 ks; Zdroj impulzov a zaistenie proti stlačeniu z vonku: 1 ks; Zaistenie bezpečnosti zadnej hrany krídla elektronicky: 1 ks

Príloha č.1 Technické zariadenia - špecifikácia

Strana 8 z 8

Krídla

Krídla teleskopické z profilov SPEDOS; Bezpečnostné izolačné dvojsklo; Dorazový stĺpik;
Polep pre šeroslepých

Stena

Interiérový AL portál 3100X2354mm, RAL 9016, 6/16/4 Stratobel 33.2/Low-e, Ug=1,1


Poznámky:

- VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH, FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV
- PRED VÝROBOU ZARIADENÍ JE DODÁVATEL POVINNÝ OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERANÍM. PRI ZISTENÝCH ROZDIELOCH S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU O TOM INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.

N 1:50




M 1:50



	JESTVOLODE KONSTRUKCIE
	BORANE KONSTRUKCIE
	BORANE KONSTRUKCIE ZOBRAZENÉ V POHĽADU
	DEMONTÁŽ JESTVOLODECH KONSTRUKCII

(B1) - DEMONTÁŽ JEZTELÚDCEHO VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OTVOROV
(B2) - SKRATENIE JEZTELÚDCEHO OČISTNÉHO ZABUDIA O CIA 60 MM, RESP. PODA POTREBY
A POŽIADAVIEK DODÁVATEA SÍŤEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY PO PREŠNOM ZAMERANÍ
(B3) - DEMONTÁŽ JEZTELÚDCEHO VYNORUPOVACIEHO TELESÁ, PODA POŽIADAVIEK DODÁVATEA
SÍŤEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY PO PREŠNOM ZAMERANÍ

[illegible]


- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI PROJEKT
- VŠETKY TECHNICKÉ A STATICKÉ DETAILY JE NUTNÉ DOPRACOVAŤ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII
- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NEPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN

±0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP V LOKALITE


STUP:	ZODPOVEDNÝ PRÍJEMKOVÝ:	VYPRACOVANÝ:	KRESIL:	A - Club, s.r.o. Lažany 549, 082 32 Po Ateliér: Budovatelská 34 080 01 Prešov	
Ing. Vojtech Jasidin	Ing. Vojtech Jasidin	Ing. Vojtech Jasidin	Ing. Peter Špak		
PREŠOV	MIESTO-OBEC: PREŠOV				
PRÍJEMKOVÝ:	Stredná priemyselná škola strojníckaj, Duklianska 1, Prešov, 089 04		FORMÁT:		
NAJBA:	Debarierizácia budovy SPS strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov		DATUM: 07 / 2024 STUPEŇ PO: PROJEKT		
OBJEKT:	SO 01 - VLASTNÝ OBJEKT	PARCELA ČÍSLO: 855/1, 855/2	ČÍSLO ZAKÁZKY:		
		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PREŠOV	ČÍSLO KÓPIE:		
SAH VÝKRESU:			ARCHIVNÉ ČÍSLO:		
LOKALITA A-EXISTUJÚCI STAV			MIERKA: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 2		

PÔDORYS 1.NP-NAVRHOVANÝ STAV
M 1:50

A - Club
Ing. Vojtech Jaschin
Architektúra a pozemné stavby

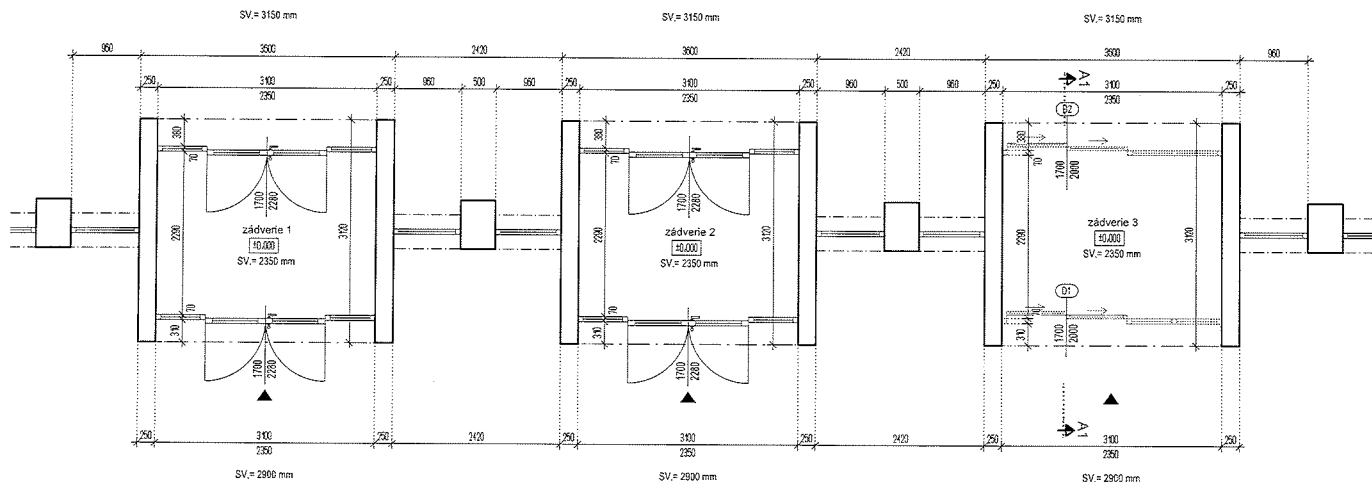

REZ A1-NAVRHOVANÝ STAV
M 1:50

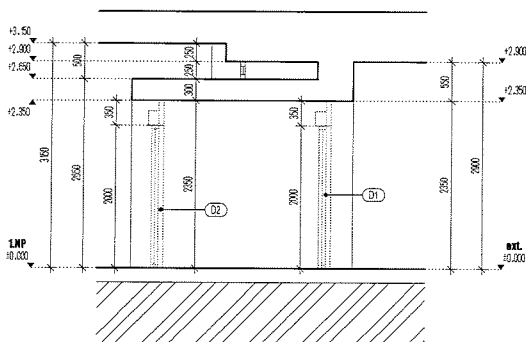

LEGENDA MATERIÁLOV

- JESTVODNÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE, VÍD. POPIS, RESP. SKLADBY KONŠTRUKCIÍ
- ZEMIA, PODLAHA, EXISTUJÚCI NÁSTP

POPIS KONŠTRUKCIÍ

- (A1) MONTÁŽ JESTVODNÝCH KONŠTRUKCIÍ, TELESÁ A ÚPRAVA ROZVOJOVÝCH OSTRÉHO VYKUROVANIA PRE NÍŽU PLOCHU VÝKUR. TELESÁ
- (D) NAVRHOVANÉ VÝKURNÉ KONŠTRUKCIE, OTVORY, VÍD. VÝPIS DIER

ĎALŠIE STAVEBNÉ ÚPRAVY:


- VYKURANIE, OCHRANU A VYKURANIE OSTRÉHO VYKUROVANIA PRE NÍŽU PLOCHU VÝKUR. TELESÁ
- VYKURANIE VÝKURNÝCH KONŠTRUKCIÍ, OTVORY
- VYKURANIE PLOCHY PO VYKURANÍ VÝKURNÝCH KONŠTRUKCIÍ, OTVORY
- ÚPRAVA ROZVOJOVÝCH VÝKURANÍ A ROZVOJ NÁSTUPU PRE ZREALIZOVANIE NAVRHOVANÝCH ÚPRAV

POPIS ZARIADENÍ:

- (A) BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE V STANCI, OVLÁDAČ PÉNE UCHYTENÝ NA STENU, AKTIVÁCIA PANEJA KŮČOM
- (B) INTERIÉROVÁ ŠIROKÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA, ZDVÍH: 1,65 M, VYBAVENIE SEĎAČKA, VZDIALENÉ OVLÁDANIE NA KÁBLI VÝKURNOST 300KG, ROZMERY PODLAHY 300x250MM, PODROBNÉ VÍD. TECHNICKÁ SPRÁVA, ELEKTRICKÝ PRÍVOD: ZÁSUPOKA ZDVÍH (230V/50Hz, KÁBLI, CYKLY 3C x 2,5, 1 FÁZOVÝ ISTIČ, 16A DVOPÓLOVÉ VYPÍNAČE, PRÍVODY CHRANÍCIE JEDNOTLIVÝCH ZÁSUPOK ZDVÍH DO SM V BLÍZKOSTI DRÁHY, UZEMŇOVACÍ VODÍC (ŽLT-ZELEŇ) 6MM² (PRE INTERIÉR) A 16 MM² (EXTERIÉR), - KOORDINOVAT S PROJEKTOM ELI
- (C) DRÁHA SCHODISKOVÉ PLOŠINY, PŘEVÝŠENIE NEREZOVÉ TRUBKY Ø60x4MM DRÁHA KOTVENÁ NA STĚNĚ
- (D) INTERIÉROVÁ ŠIROKÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA, ZDVÍH: 1,65 M, VYBAVENIE SEĎAČKA, VZDIALENÉ OVLÁDANIE NA KÁBLI VÝKURNOST 300KG, ROZMERY PODLAHY 300x250MM, PODROBNÉ VÍD. TECHNICKÁ SPRÁVA, ELEKTRICKÝ PRÍVOD: ZÁSUPOKA ZDVÍH (230V/50Hz, KÁBLI, CYKLY 3C x 2,5, 1 FÁZOVÝ ISTIČ, 16A DVOPÓLOVÉ VYPÍNAČE, PRÍVODY CHRANÍCIE JEDNOTLIVÝCH ZÁSUPOK ZDVÍH DO SM V BLÍZKOSTI DRÁHY, UZEMŇOVACÍ VODÍC (ŽLT-ZELEŇ) 6MM² (PRE INTERIÉR) A 16 MM² (EXTERIÉR), - KOORDINOVAT S PROJEKTOM ELI
- (E) INTERIÉROVÁ ŠIROKÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA, ZDVÍH: 1,65 M, VYBAVENIE SEĎAČKA, VZDIALENÉ OVLÁDANIE NA KÁBLI VÝKURNOST 300KG, ROZMERY PODLAHY 300x250MM, PODROBNÉ VÍD. TECHNICKÁ SPRÁVA, ELEKTRICKÝ PRÍVOD: ZÁSUPOKA ZDVÍH (230V/50Hz, KÁBLI, CYKLY 3C x 2,5, 1 FÁZOVÝ ISTIČ, 16A DVOPÓLOVÉ VYPÍNAČE, PRÍVODY CHRANÍCIE JEDNOTLIVÝCH ZÁSUPOK ZDVÍH DO SM V BLÍZKOSTI DRÁHY, UZEMŇOVACÍ VODÍC (ŽLT-ZELEŇ) 6MM² (PRE INTERIÉR) A 16 MM² (EXTERIÉR), - KOORDINOVAT S PROJEKTOM ELI

POZNÁMKY

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ NA ZÁKLADĚ JEJEDNOTLIVÝCH ZÁMERANÍ JESTVODNÝCH KONŠTRUKCIÍ, VÝKURNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRED REALIZÁCIU A ZÁVÄZNOU OCEŇOVANÍ VÝKURNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NÚTNE ROZPRÁVAT PŘIMO NA STAVBE A PŘIPADNÉ NEVÝKURNOSTI OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIU PŘEKONKULTIVAT S PROJEKTANTOM !!!
- PŘED ZÁČATKOM PRÁČ NA STAVBE JE NÚTNE REALIZOVAT OVRHŮVÁNÍ SONNY NA STAVENO-TECHNICKÝ STAV VÝKURNÝCH KONŠTRUKCIÍ A BŮVNE KONŠTRUKCIE, OCEŇOVANÍ, AUTORIZOVANÝ PROJEKTANTOM STATIKY !!!
- PŘI REALIZÁCI DODRŽÍVAT TECHNICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY UDÁVANÉ VÝKURNÝMI STAVENÝMI ZMĚSÍ A VÝKURNÝMI
- PŘED VÝROBOU ČI ZÁVÄZNOU OBJEDNÁVKOU VÝKURNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NÚTNE ICH ZAMERAT PŘIMO NA STAVBE, ŠÍŘKU DVERÍ, MATERIÁL A VYBAVENIE DVERÍ KOORDINOVAT S PLATNÝM PROJEKTEM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY STAVBY A POTVRDIT INVESTOROM !



UPOZORNENIE:

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI PROJEKT
- VŠETKY TECHNICKÉ A STATICKÉ DETAILY JE NÚTNE DOPRACOVAT V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIU
- DODÁVATEL STAVBY JE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ PŮVINNÝ PREŠŤUDOVAT PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PŘIPADĚ ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA
- PŮČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIŤVAT PLATNÉ VÝHLÁŠKY A STN

LOKALITA A-NAVARHOVANÝ STAV

±0,000 = ÚROVEN EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP V LOKALITE

SADA ČÍSLO:

AUTOR:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVANÝ:	KREŠIL:	A - Club, s.r.o. Lažany č. 49, 082 32 Po Atelier: Budovateľská 34 080 01 Prešov
Ing. Vojtech Jaschin	Ing. Vojtech Jaschin	Ing. Vojtech Jaschin	Ing. Peter Sopek	
OKRES:	PREŠOV	MESTO-OBEC:	PREŠOV	
INVESTOR:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 080 04	FORMÁT:		
STAVBA:	Debanerizácia budovy SPS strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov	DÁTUM:	07/2023	
OBJEKT:	SO 01 - VLASTNÝ OBJEKT	PARCELA ČÍSLO:	855/1, 855/2	
		KATASTRÁLNE OZEMIE:	PREŠOV	
OBŠAH VÝKRESU:	LOKALITA A-NAVARHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU:	1:50	6

[illegible]

M 1:50



- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | JESTLIČKOVÉ KONSTRUKCE |
|  | BOŘANÉ KONSTRUKCE |
|  | BOŘANÉ KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ V POHLEDU |
|  | DEMONTÁŽ JESTLIČKOVÝCH KONSTRUKCÍ |




POPIS BÚRACÍCH PRÁC

- B1 - DEMONTÁŽ DESTYLUJÍCICH VÝPLŇOVÝCH KONSTRUKCIÍ OTVOROV
B2 - SKRÁTENIE DESTYLUJÚCEHO OČIŠŤOVÉHO ZÁBRADLIA O CCA 150 MM, RESP. PODLA POTREBY
A POŽIADAVIEK ODODÁVATEĽA SÚMNEJ SCHODISKOVIEJ PLOŠINY PO PRESNOM ZAMERANÍ
B3 - DEMONTÁŽ DESTYLUJÚCEHO VÝKUROVÁKOVÉHO TELESIA, PODLA POŽIADAVIEK ODODÁVATEĽA
SÚMNEJ SCHODISKOVIEJ PLOŠINY PO PRESNOM ZAMERANÍ

POZNÁMKY

- dokumentácia je spracovaná na základe technického znenia, zameraná na potreby používateľov (user requirements !!!)
- pred realizáciou a zvláštnou úlohou vývojárov je vývojový proces realizovať priamo na stavbe a prípadne nevyhnutnosti opustiť projektovú dokumentáciu predkonštrukciou s produktom!!!!
- pred začatím prác na stavbe je nutné realizovať overovaciu snímku na stavisku – technický stav priberania stavebníkov konštrukcií a dodanie konštrukcie osobne autorizovaným projektantom stavby !!!
- pred začatím prác musí byť posúdené požiadavky: existujúce, nové, určené odstavčami v zoznamu opísaných prác, aby sa nedali používať na overenie existujúceho produktu pre potreby spracovania prác sa majú zohľadniť samostatne uvedené
- dodanie konštrukcií sa bude vykonávať postupom odzberu zobra zobra
- dodanie konštrukcií doplnívala technická predpráca a postupne odzberovanie stavieb stavebných častí a vývojárov a projektantov

N 1.50

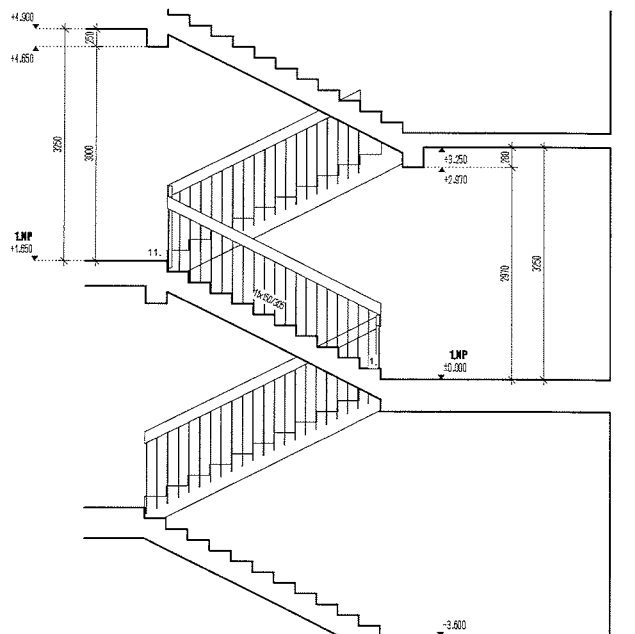

UPOZORNENIE:

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI PROJEKT
- VŠETKY TECHNICKÉ A STATICKE DETAILY JE NUTNÉ DOPRACOVAŤ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII
- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVÁŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNÍ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN

LOKALITA C-EXISTUJÚCI STAV

±0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP V LOKALITE

SADA ČÍSLO:

AUTOR:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VÝPRAVČOVIA:	KRESIL:	A - Club, s.r.o. Lazány č.43, 082 32 Po Ateliér: Budovateľská 34 080 D1 Prešov	
Ing. Vojtech Jačien	Ing. Vojtech Jačien	Ing. Vojtech Jačien	Ing. Peter Špak		
OKRES:	PREŠOV	MIESTO-OBEC:	PREŠOV		
ZÁMEST:	Stredná priemyselná škola stropnícka, Duklanska 1, Prešov, 080 04				FORMÁT:
STAVBA:	Dobanarizácia budovy SPŠ stropníckej, Duklanska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov				DATUM: 07/2020 STUPEŇ PO: PROJEKT
OBJEKT:	SO 01 - VLASTNÝ OBJEKT	PARCELA ČÍSLO:	855/1, 855/2	ČÍSLO ZÁKAZKY:	
		KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	PREŠOV	ČÍSLO KÓPIE:	
OBŠAH VÝKRESU:					ARCHIVNÉ ČÍSLO:
				MIERA:	ČÍSLO VÝKRESU
LOKALITA C-EXISTUJÚCI STAV				1:50	4

M 1:50



-  JESTLIČKOVÉ KONSTRUKCE
 NÁVRHOVÉ KONSTRUKCE, VÍD. POPIS, RESP. SLOŽBY KONSTRUKCÍ
 ZEMLA PŮVODNÁ, EXISTUJÍCÍ NÁSP

POPIS KONŠTRUKCIÍ

- A1 MONTÁŽ DESTRUČNÉHO VYKUROVACIEHO TELESA A ÚPRAVA ROZVODOV OSTRÉHO VYKUROVANIA PRE NOVÚ POLOHU VYKUR. TELESA
D... NAVRHOVANÉ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCIE OTVOROV, VÍD, VÝPIS DVERÍ

ĎALŠIE STAVEBNÉ ÚPRAVY:

- VYSPRAVENIE VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH OSTENÍ A NADPRAŽÍ OTVOROV PO OSADENÍ NASTROJENÝCH VPLNÍ OTVOROV, RESP. VYBORANÍ VPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OTVOROV
- VYSPRAVENIE PODŔAŽ PO VYBORANÍ VPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OTVOROV
- OPRÁVA ROZVODOV VYKUROVANIA V ROZSAHOM NUTNOM PRE REALIZOVANIE NASTROJENÝCH OPRAV



POPIS ZARIADENÍ:

- | | |
|---|---|
| A | BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE V STANICI, OVLÁDAČ PLYNE, UCHYTENÝ NA STERU, AKTIVÁCIA PANELU KÚPEĽNE |
| B | INTERIÉROVÁ ŠIRÁKA SCHODISKOVÁ PLOŠINA, ZVÝŠN. 16,8 M, VYBAVENIE SEDÁČKA, VZDELÁVACIE OVLÁDANIE NA KÁBU, MONTÁŽ SPODK, ROZMÄR PLOŠINY 500x1500MM, PODPOROVNÉ VÝŠ. TECHNICKÁ SPRÁVA, ELEKTRICKÝ PRÁD: ZÁSLUHA ZVÝŠN. 230V, 50Hz, KÁBEL CNY 3x2 + 3, 1. FÁZOVÝ STUP 16A, DVOFÁZOVÉ VYPÍNAČE, PRÍPOJCHY CHRÁNENÉ JEDNOFÁZOVÝ. ZÁSLUHA ZVÝŠN. 230V DO 30 M V ZLOŽITÝ DRAH, UZEMŇOVACÍ VODIEČ (ČIATO-ZELENÝ) 6x12V PŘE INTERIÉROU A 16 MM2 (EXTERIÉR). - KOORDINOVANÝ S PROJEKTOVÝM ESI |
| C | DRAHÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINY, PRUVEDENIE NEREZOVÝE MAŤNE TRUKY 800 MM ŠIRÁKA KOTVENIA NA STUPLY. |
| D | INTERIÉROVÁ ŠIRÁKA SCHODISKOVÁ PLOŠINA, ZVÝŠN. 10,8 M, VYBAVENIE SEDÁČKA, VZDELÁVACIE OVLÁDANIE NA KÁBU, MONTÁŽ SPODK, ROZMÄR PLOŠINY 500x1500MM, PODPOROVNÉ VÝŠ. TECHNICKÁ SPRÁVA, ELEKTRICKÝ PRÁD: ZÁSLUHA ZVÝŠN. 230V, 50Hz, KÁBEL CNY 3x2 + 3, 1. FÁZOVÝ STUP 16A, DVOFÁZOVÉ VYPÍNAČE, PRÍPOJCHY CHRÁNENÉ JEDNOFÁZOVÝ. ZÁSLUHA ZVÝŠN. 230V DO 30 M V ZLOŽITÝ DRAH, UZEMŇOVACÍ VODIEČ (ČIATO-ZELENÝ) 6x12V PŘE INTERIÉROU A 16 MM2 (EXTERIÉR). - KOORDINOVANÝ S PROJEKTOVÝM ESI |
| E | INTERIÉROVÁ ŠIRÁKA SCHODISKOVÁ PLOŠINA, ZVÝŠN. 10,54 M, VYBAVENIE SEDÁČKA, VZDELÁVACIE OVLÁDANIE NA KÁBU, MONTÁŽ SPODK, ROZMÄR PLOŠINY 500x1500MM, PODPOROVNÉ VÝŠ. TECHNICKÁ SPRÁVA, ELEKTRICKÝ PRÁD: ZÁSLUHA ZVÝŠN. 230V, 50Hz, KÁBEL CNY 3x2 + 3, 1. FÁZOVÝ STUP 16A, DVOFÁZOVÉ VYPÍNAČE, PRÍPOJCHY CHRÁNENÉ JEDNOFÁZOVÝ. ZÁSLUHA ZVÝŠN. 230V DO 30 M V ZLOŽITÝ DRAH, UZEMŇOVACÍ VODIEČ (ČIATO-ZELENÝ) 6x12V PŘE INTERIÉROU A 16 MM2 (EXTERIÉR). - KOORDINOVANÝ S PROJEKTOVÝM ESI |

POZNÁMKY

- ZODPovednosť za spracovanie na ťaženie, technologické zaparovanie, zariadenie, dodanie objektu laserovým meraním
- Pred realizáciou a zariadením objektom výrobných je nutné zabezpečiť prevádzku na stavbe a príslušné bezpečnostní
- Spôsob poskytnutia informácií poskytovateľom a poskytovateľom
- Pred začatím prác na stavbe je nutné realizovať overenie súrody na stavbe, rozhodnutie stavu výrobných stavieb
- Konštrukcií a súrodne konštrukcie odoslať autorizovaným projektantom stavby
- Pri realizácii konštrukcie technologické predpisy a postupy vypracované stavbou stavieb, štandardných štátov a výrobných
- Pred výrobou či závažnou objednávkou vyplvňovných konštrukcií je nutné ich zamerať priamo na stavbe, šírku dverí, materiál a vybarvenie
- Dverí koordinovať s platným projektom protipožiarnej ochrany
- Stavby a potvrdiť investorom

N 1:50

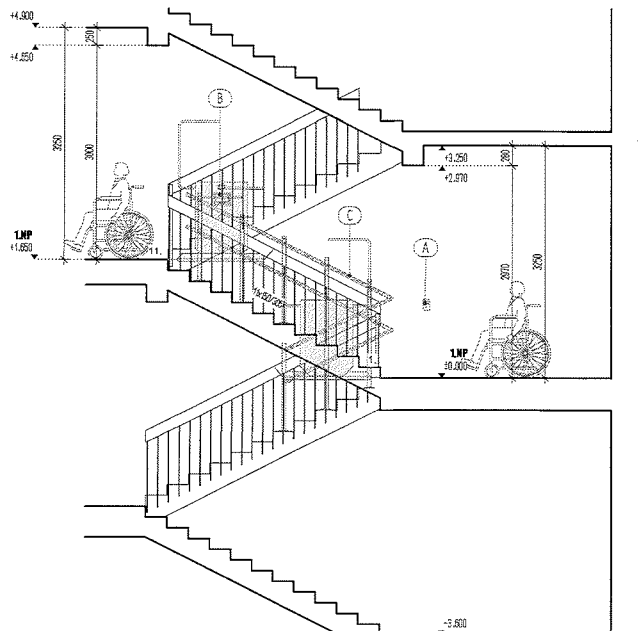

UPOZORNENIE:

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI PROJEKT
- VŠETKY TECHNICKÉ A STATICKÉ DETAILY JE NUTNÉ DOPRACOVAŤ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII
- DODÁVATEL STAVBY JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNÍ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DOORZIAVAŤ PLATNÉ VÝHLÁŠKY A STN

LOKALITA C-NAVRHOVANÝ STAV

±0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÍCÍ PODLAHY 1.NP V LOKALITĚ

SADA ČÍSLO:

AUTOR:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VÝPRAVČOVÁ:	AKRESIL:	A - Club, s.r.o. Lažany 549, 082 32 Po Atelier: Budovatelská 34 080 01 Prešov
Ing. Vojtech Jasák	Ing. Vojtech Jasák	Ing. Vojtech Jasák	Ing. Peter Spáček	
OKRES:	Miesto-Obec: PREŠOV			
MESTO:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 080 04		FORMÁT:	
STAVBA:	Debarierizácia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov		DATUM: 07 / 2008	
OBJEKT:	SO MI - VLASTNÝ OBJEKT	PARCELA ČÍSLO: 855/1, 855/2 KATASTRÁLNE OZEMIE PREŠOV	STUPEŇ PO: PROJEKT	
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
			ČÍSLO KÓPIE:	
			ARCHIVNE ČÍSLO	
DEŠIŤ VÝKRESU:	MIERKA:			ČÍSLO VÝKRESU:
LOKALITA C-NAVRHOVANÝ STAV				1:50



A - Club
Ing. Vojtech Jačišin
Architektúra a pozemné stavby

UPOZORNENIE:

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI PROJEKT
- VŠETKY TECHNICKÉ A STATICKÉ DETAILS JE NUTNÉ DOPRACOVAŤ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII
- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN

VÝPIS DVERÍ-NAVRHOVANÝ STAV

±0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP V LOKALITE

SADA ČÍSLO:


AUTOR:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	A - Club, s.r.o. Lažany č.49, 082 32 Po Ateliér: Budovateľská 34 080 01 Prešov	
Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Vojtech Jačišin	Ing. Peter Špak		
OKRES:	PREŠOV	MIESTO-OBEC: PREŠOV			
INVESTOR:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 080 04			FORMÁT:	
STAVBA:	Debarierizácia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr. Prešov, parc. č. 855/1, 855/2, k.ú. Prešov			DÁTUM:	07 / 2023
OBJEKT:	SO 01 - VLASTNÝ OBJEKT	PARCELA ČÍSLO:	855/1, 855/2	STUPEŇ PD:	PROJEKT
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	
				ČÍSLO KÓPIE:	
		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PREŠOV		ARCHÍVNE ČÍSLO:	
OBSAH VÝKRESU:				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS DVERÍ-NAVRHOVANÝ STAV					10

Výkaz dverí


Projekt: Debarierizácia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov
 Vypracoval: Ing. Peter Špak
 Datum / Čas: 07 / 2023
 Poznámka:

Podlaží	Označení	Počet	Šírka [m]	Výška [m]	Plocha [m²]	Celková plocha [m²]
1NP						
	D1 /lokalita A/	1	3,100	2,350	7,285	7,285

PÔDORYS

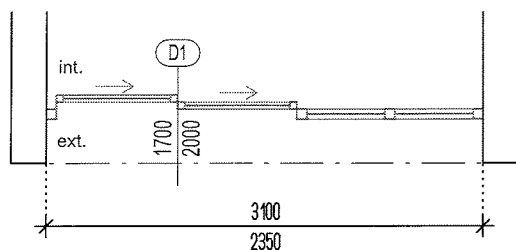

POHĽAD Z EXTERIÉRU

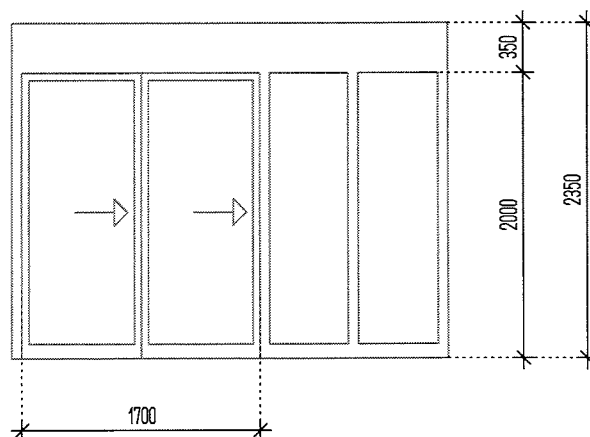

POPIS:

exteriérová presklená stena s posuvnými dvojkrídlovými teleskopickými dverami s automatickým otváraním

ŠPECIFIKÁCIA:

rám: hliníkový profil, povrchová úprava lakovaním, farba biela

prah: bez prahu

zasklenie: pevné časti steny zasklené čírym tepelnoizolačným trojsklom

krídlo: hliníkový profil, povrchová úprava lakovaním, farba biela,
 zasklenie bezpečnostným izolačným dvojsklom, posuvné dvere dvojkrídlové,
 teleskopické, svetlý otvor 1700/2000 mm, zo strany pohonu odsun vľavo

zámok: vložka FAB

pohon: automatické otváranie so senzorom pohybu, pohon teleskopický dvojkrídlový,
 zo strany pohonu odsun vľavo

poznámky: - zasklenie označiť farebne kontrastnými grafickými značkami
 v dvoch výškach: 900-1000 mm a 1500-1600 mm

* podrobnejšie viď. Technická správa

UPOZORNENIE:

* pred výrobou či záväznou objednávkou výplňových konštrukcií je nutné ich zamerať priamo na stavbe, šírku dverí, materiál a vybavenie dverí koordinovať s platným projektom protipožiarnej ochrany stavby a potvrdiť investorom!


* zmeny oproti projektovej dokumentácii nutné konzultovať so zodpovedným projektantom !

Výkaz dverí


Projekt: Debarierizácia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov
 Vypracoval: Ing. Peter Špak
 Datum / Čas: 07 / 2023
 Poznámka:

Podlaží	Označení	Počet	Šírka [m]	Výška [m]	Plocha [m²]	Celková plocha [m²]
1. Nadzemní podlaží						
	D2 /lokalita A/	1	3,100	2,350	7,285	7,285

PÔDORYS



POHĽAD ZO ZÁDVERIA

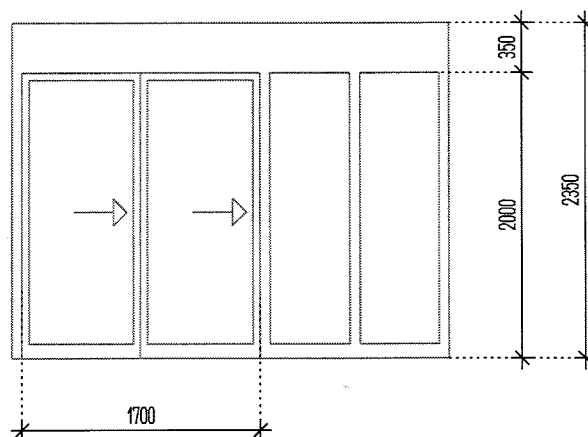

POPIS:

interiérová presklená stena s posuvnými dvojkrídlovými teleskopickými dverami s automatickým otváraním

ŠPECIFIKÁCIA:

rám: hliníkový profil, povrchová úprava lakovaním, farba biela

prah: bez prahu

zasklenie: pevné časti steny zasklené čírym tepelnoizolačným dvojsklom

krídlo: hliníkový profil, povrchová úprava lakovaním, farba biela,
 zasklenie bezpečnostným izolačným dvojsklom, posuvné dvere dvojkrídlové,
 teleskopické, svetlý otvor 1700/2000 mm, zo strany pohonu odsun vľavo

zámok: vložka FAB

pohon: automatické otváranie so senzorom pohybu, pohon teleskopický dvojkrídlový,
 zo strany pohonu odsun vľavo

poznámky: - zasklenie označiť farebne kontrastnými grafickými značkami
 v dvoch výškach: 900-1000 mm a 1500-1600 mm

* podrobnejšie viď. Technická správa

UPOZORNENIE:

* pred výrobou či záväznou objednávkou výplňových konštrukcií je nutné ich zamerať priamo na stavbe, šírku dverí, materiál a vybavenie dverí koordinovať s platným projektom protipožiarnej ochrany stavby a potvrdiť investorm!

* zmeny oproti projektovej dokumentácii nutné konzultovať so zodpovedným projektantom !

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:1668

Stavba:Debarierizácia budovy SPŠ Strojnickej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č. 855/1,855/2, k.ú. Prešov

JKSO:

Miesto:Duklianska 1, Prešov

Objednávateľ:

SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

Zhotoviteľ:

ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

Poznámka:

KS:

Dátum:20.6.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:53789059

IČ DPH:SK2121514241

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		101 010,10	
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	10,00%	101 010,10	10 101,01
Cena s DPH		111 111,11	
v		EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	1668		
Stavba:	Debarierizácia budovy SPŠ Strojnickej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č. 855/1,855/2, k.ú. Prešov		
Miesto:	Duklianska 1, Prešov	Dátum:	20.06.2024
Objednávateľ:	SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov	Projektant:	A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov
Zhotoviteľ:	ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01	Spracovateľ:	ing. Ľ. Šáriczká

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		101 010,10	111 111,11
A	Lokalita A	14 455,31	15 900,84
B	Lokalita B	39 303,87	43 234,26
C	Lokalita C	17 591,78	19 350,96
D	Lokalita D	29 659,14	32 625,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č.
855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

JKSO:

Miesto: Duklianska 1, Prešov

KS:

Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ:

SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

IČO:

53789059

IČ DPH:

SK2121514241

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 455,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 455,31	10,00%	1 445,53

Cena s DPH

v EUR

15 900,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



IBAN: SK44 1900 0000 0000 0000 0000

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č.
855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

Miesto: Duklianska 1, Prešov

Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ: SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

A - Club s.r.o.,
Projektant: Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 455,31

HSV - Práce a dodávky HSV

317,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

152,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

164,90

PSV - Práce a dodávky PSV

14 137,69

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 137,69

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č. 855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt: A - Lokalita A

Miesto: Duklianska 1, Prešov Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ: SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 455,31
D HSV			Práce a dodávky HSV				317,62
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				152,72
1	K	612425931.S1	Omietka vápenná vnútorného a vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	7,800	19,58	152,72
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				164,90
2	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t - ozn. B1	m	21,800	6,14	133,85
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,262	12,09	3,17
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,262	14,80	3,88
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,978	0,45	2,24
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,262	12,21	3,20
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,262	70,83	18,56
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 137,69
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				14 137,69
8	K	767640010.S1	Montáž posuvných hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	21,800	24,28	529,30
9	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	22,890	2,13	48,76
10	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	22,890	0,81	18,54
11	M	D1	Exteriérové automatické dvere posuvné teleskopické, hliníkové, 3100x2350 mm, bezpečnostné izolačné dvojsklo, elektrozámok	ks	1,000	6 702,13	6 702,13
12	M	D2	Interiérové automatické dvere posuvné teleskopické, hliníkové, 3100x2350 mm, bezpečnostné izolačné dvojsklo, elektrozámok	ks	1,000	6 702,13	6 702,13
13	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	171,730	0,80	136,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č.
855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt:

B - Lokalita B

JKSO:

Miesto: Duklianska 1, Prešov

KS:

Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ:

SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

IČO:

53789059

IČ DPH:

SK2121514241

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 303,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 303,87	10,00%	3 930,39

Cena s DPH

v EUR

43 234,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č. 855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Miesto: Duklianska 1, Prešov

Objednávateľ: SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Dátum: 20.06.2024

Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	39 303,87
M - Práce a dodávky M	39 303,87
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	39 303,87

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č. 855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Miesto: Duklianska 1, Prešov

Objednávateľ: SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Dátum: 20.06.2024

Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 303,87

D

M

Práce a dodávky M

39 303,87

D

33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

39 303,87

1	K	1003	Montáž a dodávka - Šikmá schodisková univerzálna plošina GTL30, nosnosť 300 kg, rozmer podlahy 850x1250 mm, Dráha kotvená do schodiska, elektricky ovládané, zdvih 10,8 m - presný popis viď PD	súbor	1,000	39 303,87	39 303,87
---	---	------	---	-------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č.
855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt:

C - Lokalita C

JKSO:

Miesto: Duklianska 1, Prešov

KS:

Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ:

SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

IČO:

53789059

IČ DPH:

SK2121514241

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 591,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 591,78	10,00%	1 759,18

Cena s DPH

v EUR

19 350,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č. 855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt: C - Lokalita C

Miesto:	Duklianska 1, Prešov	Dátum:	20.06.2024
Objednávateľ:	SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov	Projektant:	A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov
Zhotoviteľ:	ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01	Spracovateľ:	ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	17 591,78
M - Práce a dodávky M	17 591,78
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	17 591,78

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č. 855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt: C - Lokalita C

Miesto: Duklianska 1, Prešov Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ: SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 17 591,78

D M Práce a dodávky M 17 591,78

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 17 591,78

1	K	1003	Montáž a dodávka - Šikmá schodisková univerzálna plošina GTL30, nosnosť 300 kg, rozmer podlahy 850x1250 mm, Dráha kotvená do schodiska, elektricky ovládané, zdvih 1,65 m - presný popis vid' PD	súbor	1,000	17 591,78	17 591,78
---	---	------	--	-------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č.
855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt:

D - Lokalita D

JKSO:

Miesto: Duklianska 1, Prešov

KS:

Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ:

SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

IČO:

53789059

IČ DPH:

SK2121514241

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 659,14

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	29 659,14	10,00%	2 965,91

Cena s DPH

v EUR

32 625,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



IBAN: SK44 1100 0000 0000 0000 0000

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č.
855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt:

D - Lokalita D

Miesto: Duklianska 1, Prešov

Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ: SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 659,14

PSV - Práce a dodávky PSV

2 532,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 150,92

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 381,08

M - Práce a dodávky M

27 127,14

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

27 127,14

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SPŠ Strojníckej, Duklianska 1, Prešov, okr.Prešov, parc.č. 855/1,855/2, k.ú. Prešov

Objekt: D - Lokalita D

Miesto: Duklianska 1, Prešov Dátum: 20.06.2024

Objednávateľ: SPŠ Strojnícka, Duklianska 1, Prešov Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 29 659,14

D PSV Práce a dodávky PSV 2 532,00

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 150,92

1	K	7351000	Demontáž panelového radiátora pre spätnú montáž - ozn. B3	ks	4,000	66,40	265,60
2	K	7351005	Spätná montáž panelového radiátora a jeho presun - ozn. A1	ks	4,000	221,33	885,32

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 381,08

3	K	767100	Skrátenie zábradlia vrátane jeho úpravy	ks	6,000	230,18	1 381,08
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------

D M Práce a dodávky M 27 127,14

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 27 127,14

4	K	1003	Montáž a dodávka - Šikmá schodisková univerzálna plošina GTL30, nosnosť 300 kg, rozmer podlahy 850x1250 mm, Dráha kotvená do schodiska, elektricky ovládané, zdvih 10,54 m - presný popis viď PD	súbor	1,000	27 127,14	27 127,14
---	---	------	--	-------	-------	-----------	-----------

Časový harmonogram realizácie diela

f:ZOYTEC s.r.o.

Predmet zákazky : Debarierizácia SPŠ Strojnícka , Duklianska 1, Prešov

Názov objektu/Práce a dodávky	RN v € bez DPH	Harmonogram vystavby po dekádoch 30 dní					
		1	2	3	4	5	6
Debarierizácia GYMNAZIUM JAR – PRESOV							
Lokalita A	14455,31						
HSV – práce a dodávky HSV	317,62						
PSV - práce a dodávky PSV	14137,69						
Lokalita B	39303,87						
M - práce a dodávky M	39303,87						
Lokalita C	17591,78						
M - práce a dodávky M	17591,78						
Lokalita D	29659,14						
PSV - práce a dodávky PSV	2532						
M - práce a dodávky M	27127,14						
CELKOM NÁKLAD V EUR BEZ DPH	101010,10						

V Prešove, dňa

475

IE

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Typ zákazky:	zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	§ 7, ods. 1, písm. d) ZVO
Predmet zákazky:	Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov – stavebné práce

Subdodávateľ

Názov, sídlo, IČO: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

Predmet subdodávky: stavebné práce

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: 5% (t. j. 5 555,56 EUR s DPH, 4 629,63 EUR bez DPH).

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): Mgr. Milan Ščerba, Havranec 5, 090 02 Kružľová,

V Prešove dňa: 20. 06. 2024



IBAN: SK

.....
Podpis podľa bodu IV.1.2 výzvy na predkladanie ponúk

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Typ zákazky:	zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	§ 7, ods. 1, písm. d) ZVO
Predmet zákazky:	Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov – stavebné práce

Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov

P. č.	Titul, meno priezvisko	Pozícia	Email Telefonický kontakt
1.	Maroš Zelenák, MBA	stavbyvedúci	

- Hore uvedený stavbyvedúci je dlhodobým zamestnancom našej spoločnosti na TPP.

V Prešove dňa: 20. 06. 2024



.....
Podpis podľa bodu IV.1.2 výzvy na predkladanie ponúk
